



東日本大震災からの復興・再生に向けた 環境省の取組

2022年2月9日



目次

1. 環境再生の取組について	3
(1) 除染について	9
(2) 中間貯蔵施設事業について	15
(3) 再生利用・最終処分について	34
(4) 指定廃棄物等について	43
(5) ALPS処理水に係る海域モニタリングについて	55
2. 放射線リスクコミュニケーションの取組について	58
3. 鳥獣害対策の取組について	60
4. 未来志向の取組について	62

1. 環境再生の取組について



東京電力福島第一原子力発電所事故の発生

- 2011年3月11日、大地震・大津波により、広範かつ甚大な被害が発生。東京電力福島第一原子力発電所の事故により、大量の放射性物質が環境中に放出。
- 同日、政府が原子力災害対策本部を設置し、原子力緊急事態宣言を発出。避難指示により、被災した多くの方々が長期の避難生活を余儀なくされた。
- 放出された放射性物質は風等で運ばれ、ちりや雨に付着し、地表等へ降下。汚染された土壌や廃棄物など、広範囲の環境汚染が発生。生活環境を取り戻すため、その影響を速やかに低減する必要が生じた。

80 km 圏内における空間線量率の分布マップの推移

<2011年 4月>


<2020年10月>

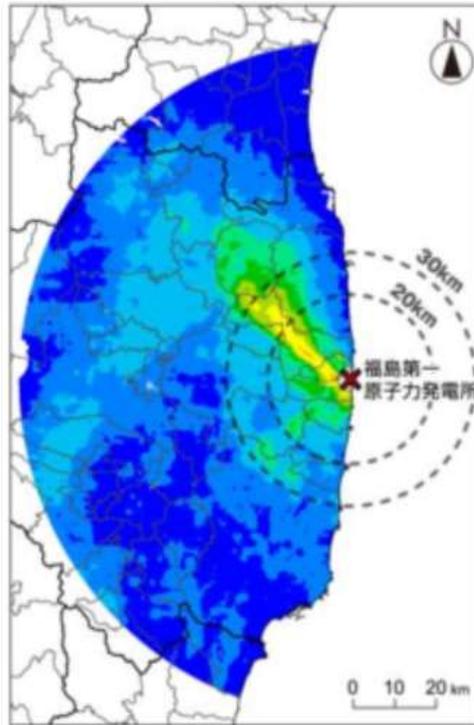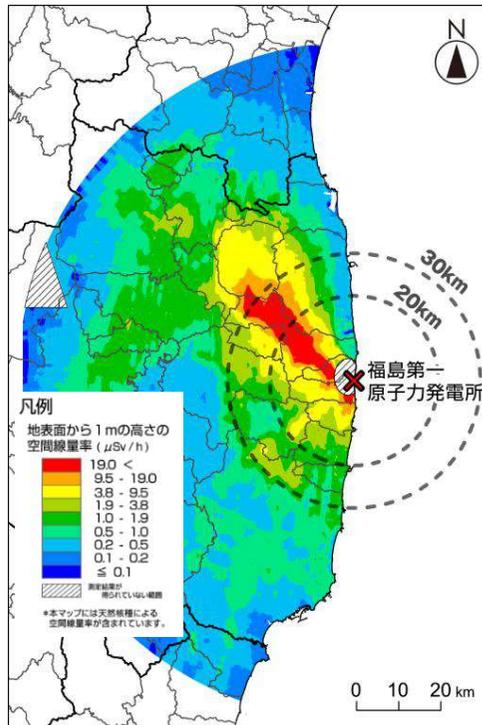

避難指示区域の変遷

当初の避難指示区域 (2013年 8月時点)

現在の避難指示区域 (2020年 3月時点)

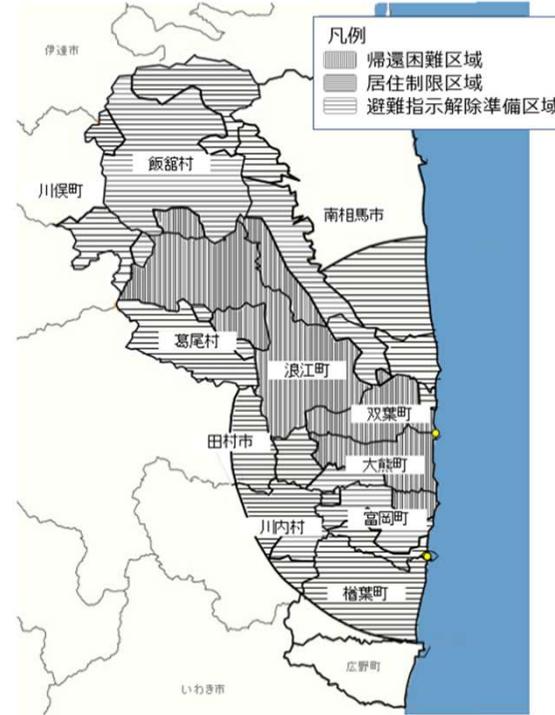

原発事故からの環境再生に向けた取組概要

- 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が環境中に放出され、環境汚染が発生。
- 放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、**除染や汚染廃棄物の処理等の環境再生の取組を実施。**
(※)平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)
- 福島県内で発生した大量の除去土壌等を貯蔵するため、**中間貯蔵施設の整備を進めるとともに、**
 県外最終処分の実現に向けて、**除去土壌の再生利用等**に係る取組を推進。
- 帰還困難区域を除き、全ての市町村で面的除染が完了。同区域内においては、福島復興再生特別措置法に基づき、**特定復興再生拠点の除染・家屋等の解体**を実施。
- これらに加え、福島復興に向けた未来志向の環境施策(脱炭素・資源循環・自然共生)を推進する「**福島再生・未来志向プロジェクト**」を展開。

放射性物質汚染対処特別措置法に基づく除染、廃棄物処理の概要

◆避難指示が発令された区域

(除染)

国が

- ・除染特別地域の指定
- ・除染実施計画の策定
- ・**除染を実施。**

(廃棄物)

国が

- ・汚染廃棄物対策地域の指定
- ・対策地域内廃棄物処理計画の策定
- ・**対策地域内廃棄物を処理。**



※汚染廃棄物対策地域は、除染特別地域と同範囲

◆その他の地域

(除染)

国が汚染状況重点調査地域を指定、市町村が

- ・除染実施計画の策定
- ・**除染を実施。**

(廃棄物)

8,000Bq/kg超の指定廃棄物は国が、それ以外の廃棄物は市区町村又は排出事業者が処理。



福島県内における土壌等の処理フロー

除染

国直轄除染及び市町村除染で発生した

- ・ 土壌
- ・ 廃棄物（刈り取った草木、雨樋の堆積物等）

廃棄物処理

国が処理責任を負っている**特定廃棄物**

- ・ 指定廃棄物（8,000Bq/kg超えの廃棄物）
- ・ 対策地域内廃棄物
（避難指示区域の解体家屋、津波がれき等）

可能な限り減容化

可能な限り減容化

10万Bq/kg超え

10万Bq/kg以下

中間貯蔵施設

[大熊町、双葉町]

特定廃棄物埋立処分施設

<帰還困難区域外の特定廃棄物等>

- ・ 旧フクシマエコテッククリーンセンター [富岡町]
（民間の産業廃棄物埋立処分場を国有化）※1

<帰還困難区域内の特定廃棄物等※2>

- ・ クリーンセンターふたば【予定】 [大熊町]
（双葉地方広域市町村圏組合の埋立処分場）

※1 搬入路は隣接する楡葉町側にある

※2 特定復興再生拠点区域内のもの

可能な限り減容・再生利用を行った上で、
中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分

被災地の環境再生に係る令和4年度予算（案） 3,334億円（3,530億円）

令和4年度予算（案）のポイント

- 安全を第一に地域の理解を得ながら中間貯蔵施設事業を着実に実施する。また、除去土壌等の減容・再生利用に関する技術開発を進める。
- 除去土壌搬出後の仮置場等の跡地について、円滑に原状回復・返地を進める。
- 帰還困難区域においては、特定復興再生拠点区域復興再生計画（6町村）に基づき、除染・廃棄物処理等を着実に進める。
- 廃棄物についても特定廃棄物埋立処分施設（旧エコテック）への搬入を開始しており、減容化→埋立の流れで着実に処理を行う。

令和4年度予算（案）の内容

中間貯蔵施設関連事業

1,981億円（1,872億円）

〔施設の整備、管理運営、除去土壌等の輸送、用地の取得、減容・再生利用技術開発等〕

特定復興再生拠点整備事業

445億円（637億円）

〔特定復興再生拠点区域復興再生計画（6町村）に基づく除染・廃棄物処理等〕

除去土壌等適正管理・原状回復等事業

271億円（253億円）

〔仮置場における除去土壌等の管理、搬出完了後の原状回復、減容化、モニタリング等のフォローアップ等〕

放射性物質汚染廃棄物処理事業等

638億円（768億円）

〔特定廃棄物の処理、指定廃棄物の一時保管、農林業系廃棄物の処理の促進、廃棄物処理施設のモニタリング等〕


※括弧内の金額は令和3年度当初予算額

(1) 除染について


除染の進捗状況

○ 2018年3月19日までに、帰還困難区域を除き、**8県100市町村の全てで面的除染が完了。**
 (帰還困難区域については、特定復興再生拠点区域で除染を実施中。)

＜汚染状況重点調査地域(市町村除染)＞

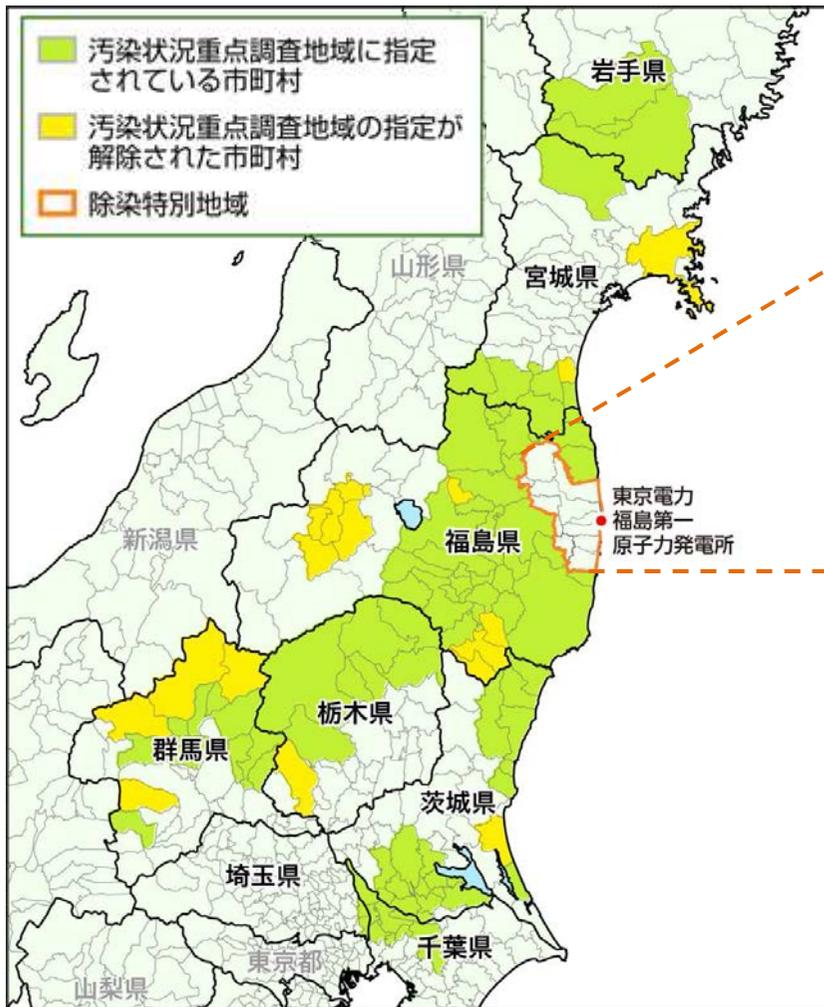

＜除染特別地域(国直轄除染)＞

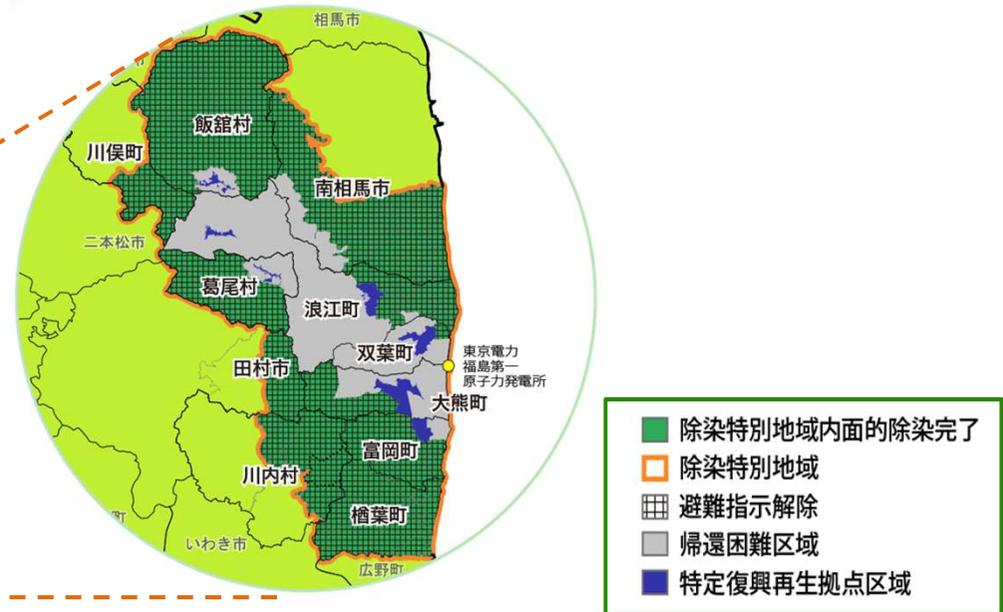

	面的除染完了市町村		
		汚染状況重点調査地域 (93)	除染特別地域 (11)
福島県内	43※	36	11
福島県外 (7県)	57	57	—
合計	100	2018年3月に完了	2017年3月に完了

※南相馬市、田村市、川俣町、川内村は、域内に除染特別地域と汚染状況重点調査地域双方がある

I. 森林・林業の再生に向けた取組

1. 生活環境の安全・安心の確保に向けた取組

- ・ 住居等の近隣の森林除染、必要に応じた土壌流出防止柵の設置等 (環境省)

2. 住居周辺の里山の再生に向けた取組

- ・ 森林内の人々の憩いの場や日常的に人が立ち入る場所等の除染 (環境省)
- ・ 広葉樹林等における林業の再生等の取組 (林野庁)
- ・ モデル地区を選定し、里山再生を進めるための取組を総合的に推進 (里山再生モデル事業) (林野庁、環境省)

3. 奥山等の林業の再生に向けた取組 (林野庁)

- ・ 間伐等の森林整備とそれに必要な放射性物質対策を実施する事業や、林業再生に向けた実証事業などを推進
- ・ 作業者向けにわかりやすい放射線安全・安心対策のガイドブックを新たに作成


II. 調査研究等の将来に向けた取組

- ・ 森林の放射線量のモニタリング、放射性物質の動態把握や放射線量低減のための調査研究等、森林・林業の再生のための努力を継続

III. 情報発信とコミュニケーション

- ・ 森林・林業の再生のための政府の取組等について、ホームページ、広報誌などへの掲載などにより、最新の情報を発信
- ・ 専門家の派遣も含めてコミュニケーションを行い、福島の皆様の安全・安心を確保する取組を継続

里山再生モデル事業 (2016~2019年度)

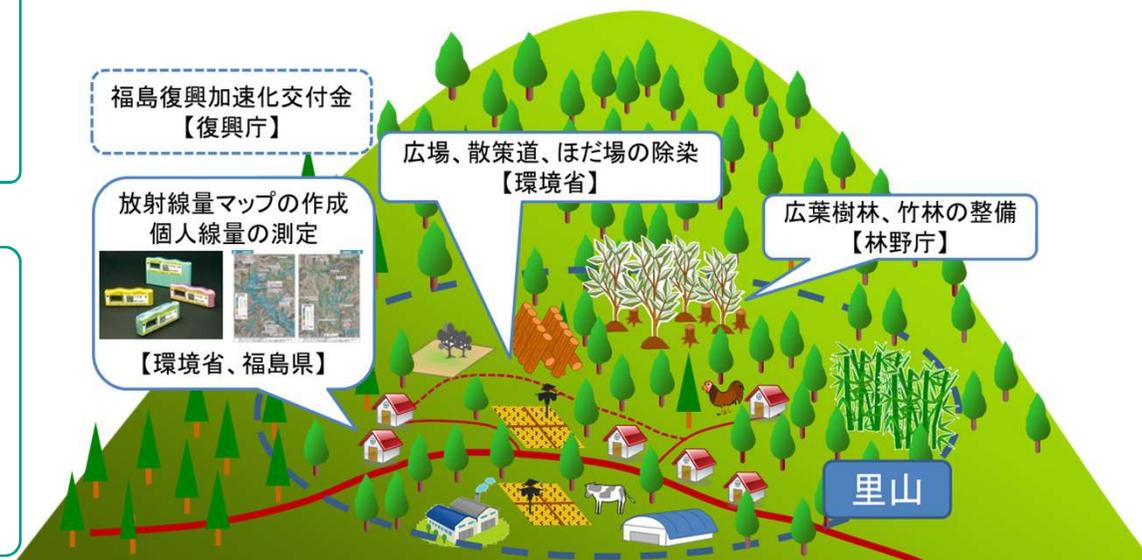

里山再生モデル事業(2016～2019)

○地元の要望を踏まえ選定した14のモデル地区(下図赤点)において、以下の事業を実施。

- ・**除染**: 堆積物除去、残渣除去等 (実施主体: 環境省、市町村)
- ・**森林整備**: 間伐、作業道作設、筋工設置等 (実施主体: 林野庁、市町村)
- ・**線量測定**: 空間線量率・被ばく線量測定等 (実施主体: 環境省、福島県、市町村)

実施結果(例)

広野町: Jヴィレッジスタジアム周辺

除染: 除草、堆積物除去



森林整備: 間伐、筋工設置



- 事業前後の2年間で実施箇所空間線量率が平均26%低減(自然減衰含む)
- 下層植生の繁茂による表土流出抑制効果等



里山再生事業(2020～)


○住民の安全・安心の確保に資する取組を当該里山の様態に合わせ組み合わせることで、住民が安心して利用できるような環境づくりを推進。

○市町村の要望に応じ、除染・森林整備・線量測定のうち全部又は一部を組み合わせるを実施する。


⇒これまで、郡山市・会津美里町・檜葉町・飯館村・富岡町・浪江町における実施場所を決定済。

帰還困難区域における取組（特定復興再生拠点区域の除染・家屋解体等）

- 帰還困難区域内については、福島復興再生特別措置法に基づき市町村長が**特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備（除染、インフラ等の整備）に関する計画を作成し、これを内閣総理大臣が認定**。計画認定から5年を目途に避難指示解除を目指す。
- 計画が認定されたすべての町村（双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯館村及び葛尾村）において、家屋等の解体・除染等工事を実施中。

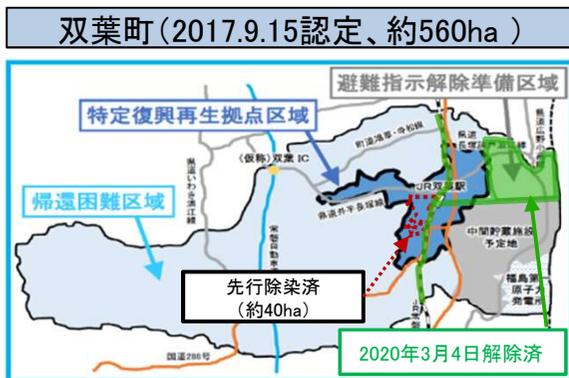


2022年春頃避難指示解除予定

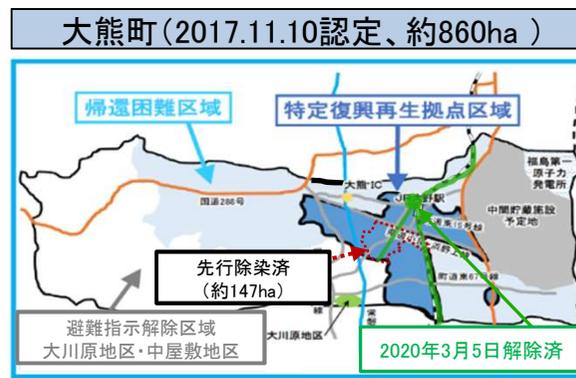


2022年春頃避難指示解除予定



2023年3月避難指示解除予定

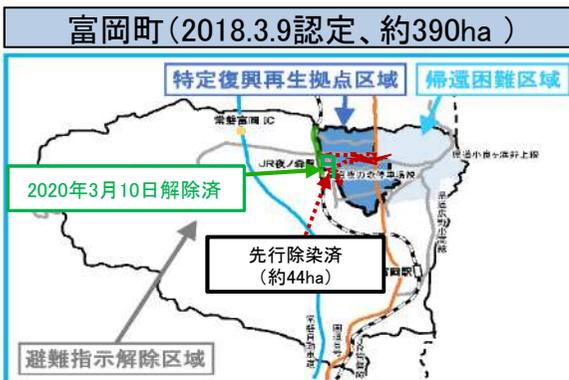

2023年春頃避難指示解除予定

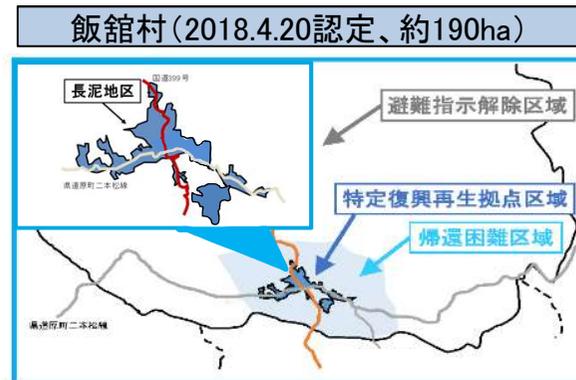

2023年春頃避難指示解除予定



2022年春頃避難指示解除予定

東日本大震災 復興加速化のための第10次提言

（自由民主党・公明党 令和3年7月20日総理へ手交）

特定復興再生拠点区域外における対応の具体化として、「住民の帰還に関する意向を個別に丁寧に把握したうえで、帰還に必要な箇所を除染し、避難指示解除を行う」ことが提言される。

特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に関する考え方（抄）

（令和3年8月31日 原子力災害対策本部・復興推進会議決定）

2. 拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に関する基本的方針


以下の基本的方針に基づき、拠点区域外の避難指示解除及び復興に向けて、地元と十分に議論しつつ、国は、施策の具体化を行う。そして、**国は、2020年代をかけて、帰還意向のある住民が帰還できるよう、避難指示解除の取組を進めていく。**

1. 国及び地元自治体は、拠点区域外の**住民の帰還に関する意向を個別に丁寧に把握した上で、帰還に必要な箇所を除染し、避難指示解除を行う。**住民の意向確認に際しては、すぐに帰還について判断できない住民にも配慮して、複数回にわたり実施する。なお、営農については、帰還意向と併せて住民の意向を確認し、地元自治体とも協議しながら必要な対応を進める。
2. 拠点区域外を除染は、現在計画されている拠点区域の**避難指示解除後、帰還意向確認等の状況を踏まえて、遅滞なく開始する。**その際、帰還する住民の生活環境の放射線量を着実に低減させ、避難指示解除及び住民の安全・安心に万全を期すため、国は、除染の手法・範囲について、十分に地元自治体と協議しながら、検討する。

(2) 中間貯蔵施設事業について

中間貯蔵施設の概要

- 中間貯蔵施設とは、福島県内の除染により発生した除去土壌や廃棄物、10万Bq/kgを超える焼却灰等について、中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分までの間、安全かつ集中的に管理・保管するための施設。
- 大変重いご決断で大熊町・双葉町に受け入れを容認いただいた。引き続き、安全第一を旨として、中間貯蔵施設事業に取り組む。
- 中間貯蔵施設区域は約1,600ha(渋谷区とほぼ同じ面積)。

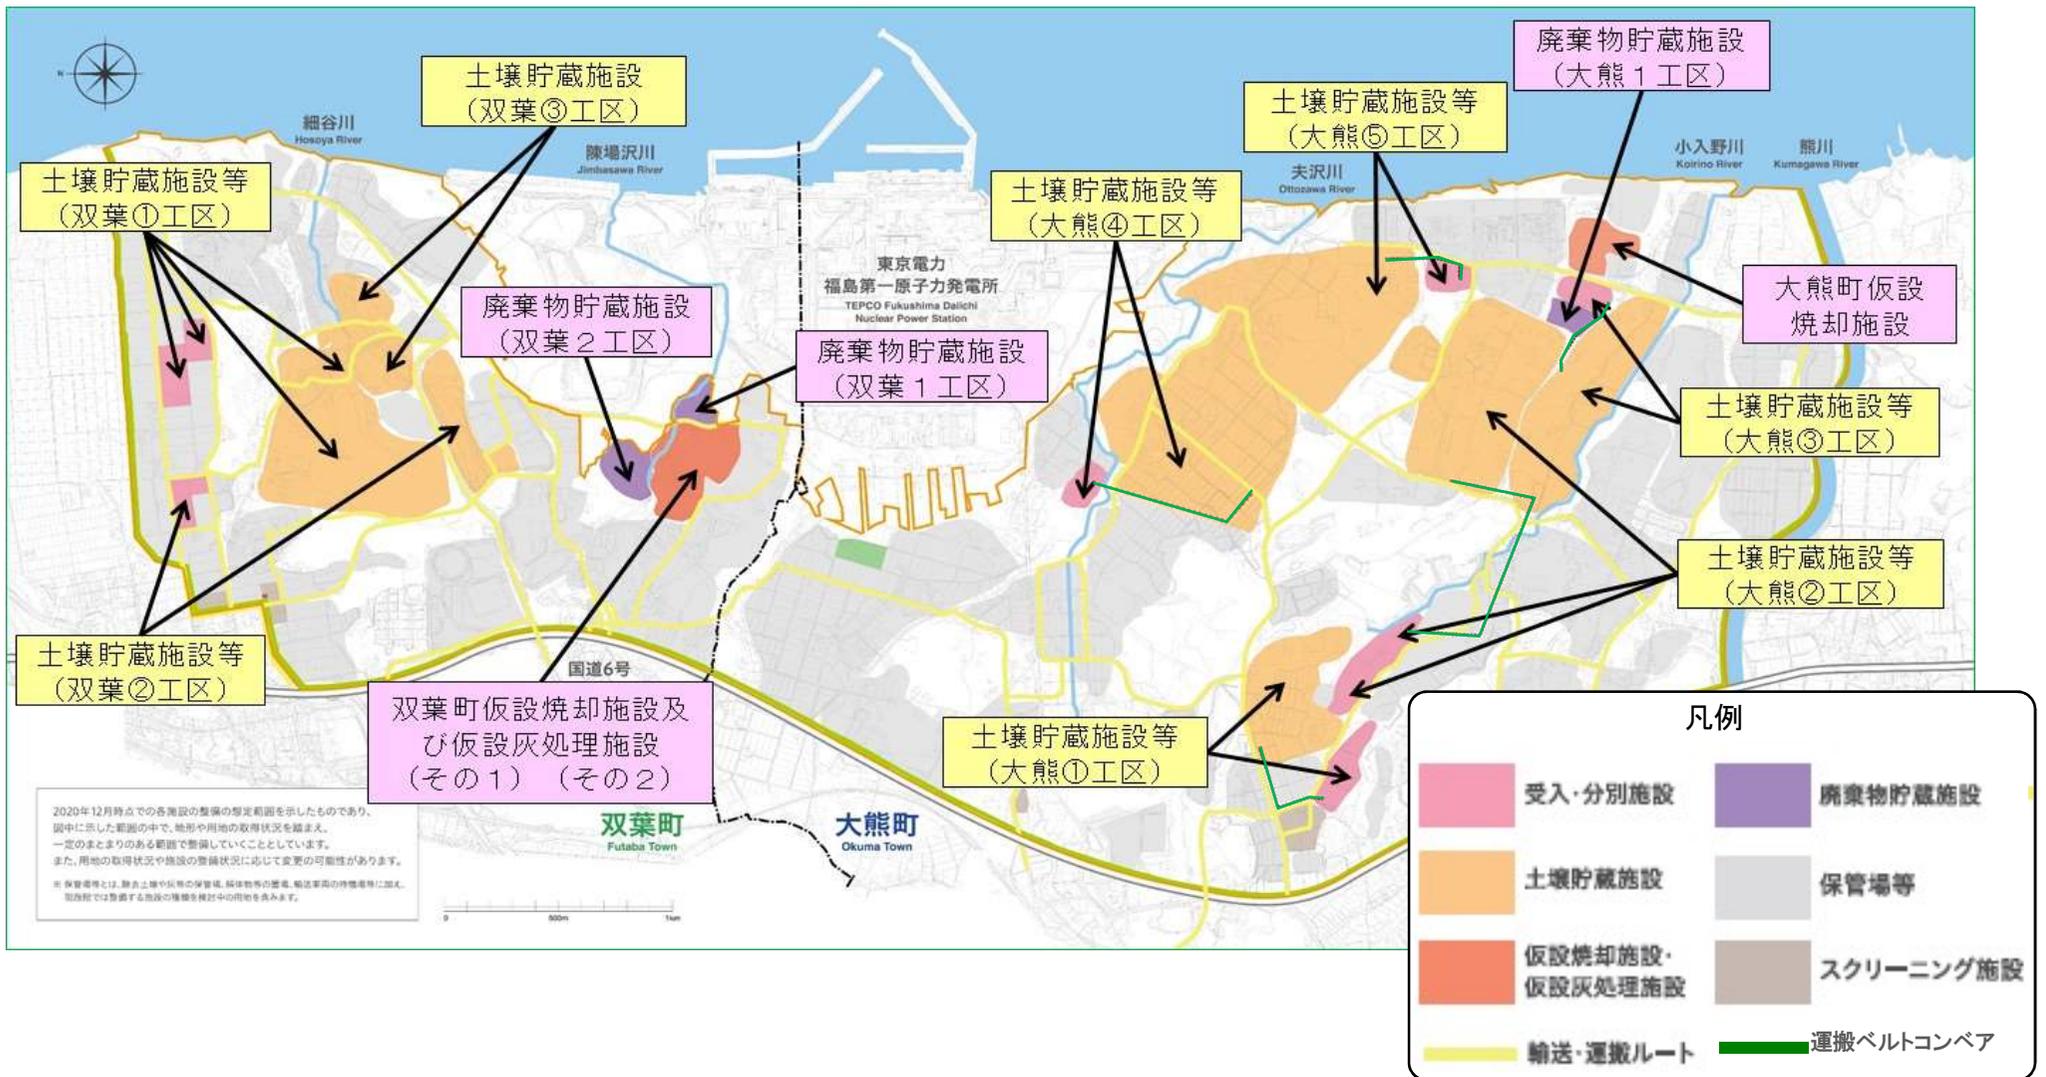

中間貯蔵施設の用地の状況

- 用地取得については、地権者との信頼関係はもとより、中間貯蔵施設事業を理解いただくことが何よりも重要であると考えており、引き続き地権者への丁寧な説明を尽くしながら取組を進める。
- 2022年1月末までに全体の約8割(民有地は9割超)の用地を取得している。

全体面積 約1,600ha	項目	全体面積に対する 面積と割合	全体登記記録人数 (2,360人※1)に対する 人数と割合
	地権者連絡先把握済み	約1,590ha※1 99.4%	約2,100人※1 89.0%
民有地 約1,270ha (約79%)	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> 契約済 民有地 約1,178ha(+1.2ha) 92.8%※3 </div>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> 計 約1,265ha (+1.6ha) 79.0% </div>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> 契約済 計 1,839人 (+3人) 77.9%※2 </div>
公有地 約330ha (約21%)	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> 公有地 約87ha(+0.3ha) 26.2%※4 </div>		
	その他の公有地	約243ha 15.2%	
	次を含む。 ①道路・水路等のように今後も元々の機能を維持する町有地、県有地、国有地等 ②事業の進展を踏まえつつ、必要に応じて、中間貯蔵施設用地としての提供・契約を調整する町有地、県有地、国有地等	<参考> 約1,508ha (94.3%)	[連絡先把握済みの2,100人に対する割合は、87.6%]


(注)端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。また、契約済におけるカッコ内の数字は、前月末からの増加分を表す。

※1 国、地方公共団体を含む。
 ※2 民有地1,837人、公有地2人。
 ※3 民有地(約1,270ha)に対する割合。
 ※4 公有地(約330ha)に対する割合。

中間貯蔵施設事業の流れ

- 仮置場から輸送した除去土壌等や仮設焼却施設から輸送した焼却灰は、中間貯蔵施設で処理し、貯蔵する。
- 2020年3月に、中間貯蔵施設における、除去土壌と廃棄物との処理から貯蔵までの全工程で、運転を開始した。

中間貯蔵施設事業の流れ

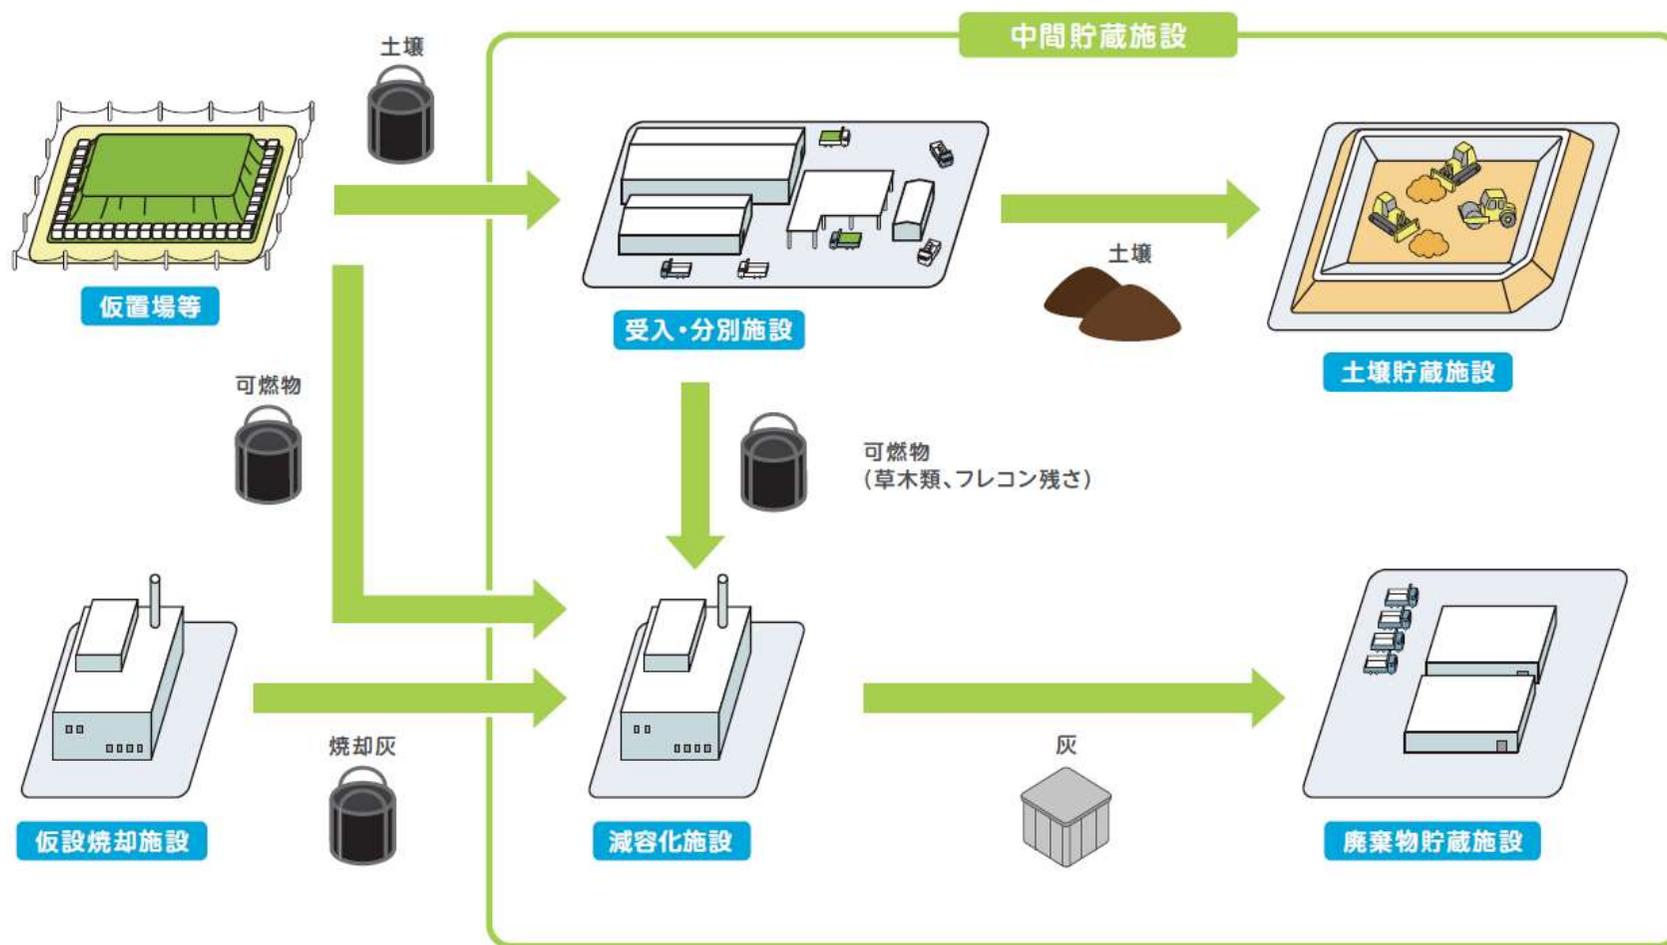

●主な物の流れを示しています。

中間貯蔵施設に係る当面の輸送の状況①

- 除去土壌等の仮置場からの中間貯蔵施設への輸送は10tダンプトラックを基本に実施。
- 輸送は2014年度末より開始し、2021年度は18市町村からの輸送を実施。
- 輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施中。
- 2021年度は、年度末までに、県内に仮置きされている除去土壌等(帰還困難区域のものを除く)の概ね搬入完了を目指すとともに、特定復興再生拠点区域において発生した除去土壌等の搬入を進める。



輸送の管理・監視について

輸送対象物の全数管理

- 仮置場等から搬出する輸送対象物は、保管容器ごとに一元的に全数管理をしている。



輸送車両の運行管理

- GPS等を活用し、輸送車両の位置情報等をリアルタイムに把握。
- 交通状況等に応じて、時間調整・ルート変更等の指示を行う。




※輸送が終了した市町村でも今後輸送が必要となるものが生じた場合には輸送することとしている。

中間貯蔵施設に係る当面の輸送の状況②


- 中間貯蔵施設への搬入にあたっては、安全を第一に、地域の理解を得ながら、輸送を実施する
- これまでに約1,261万 m^3 の除去土壌等(帰還困難区域を含む)を中間貯蔵施設に輸送した(2022年1月末時点)

中間貯蔵施設への搬入量の推移
(帰還困難区域を含む)

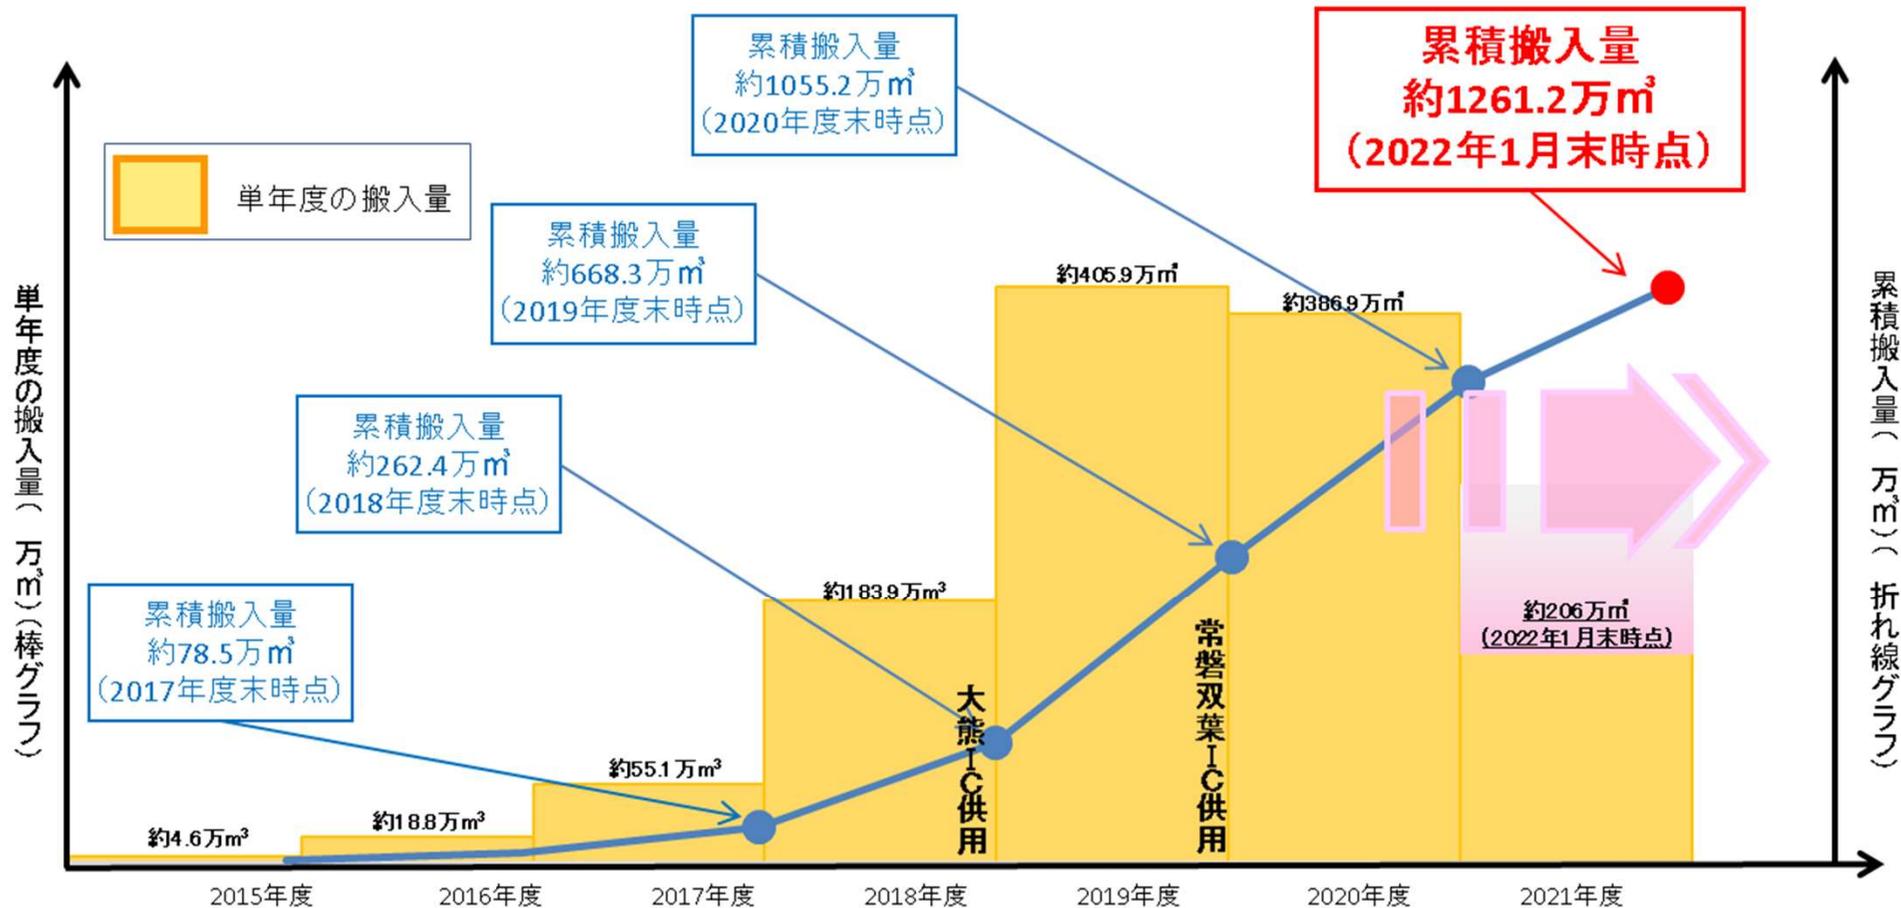

(注) 2022年度以降は、主に特定復興再生拠点区域における除染等に伴って生じた除去土壌等の輸送を行う予定

- 福島県内に保管されている除去土壌等については、帰還困難区域を除き今年度末までに中間貯蔵施設へ概ね搬入を完了するとの目標を掲げ、皆様のご理解とご協力のもと安全第一で搬入を進めている。
- 平成30年（2018年）10月時点における輸送対象物量約1,400万 m^3 ※1のうち、令和3年（2021年）11月末時点で、中間貯蔵施設や仮設焼却施設への搬入量及び飯舘村長泥地区における除去土壌の再生利用量の合計が約1,289万 m^3 となっている。
- 引き続き、安全第一を旨として中間貯蔵施設への除去土壌等の搬入を進める。

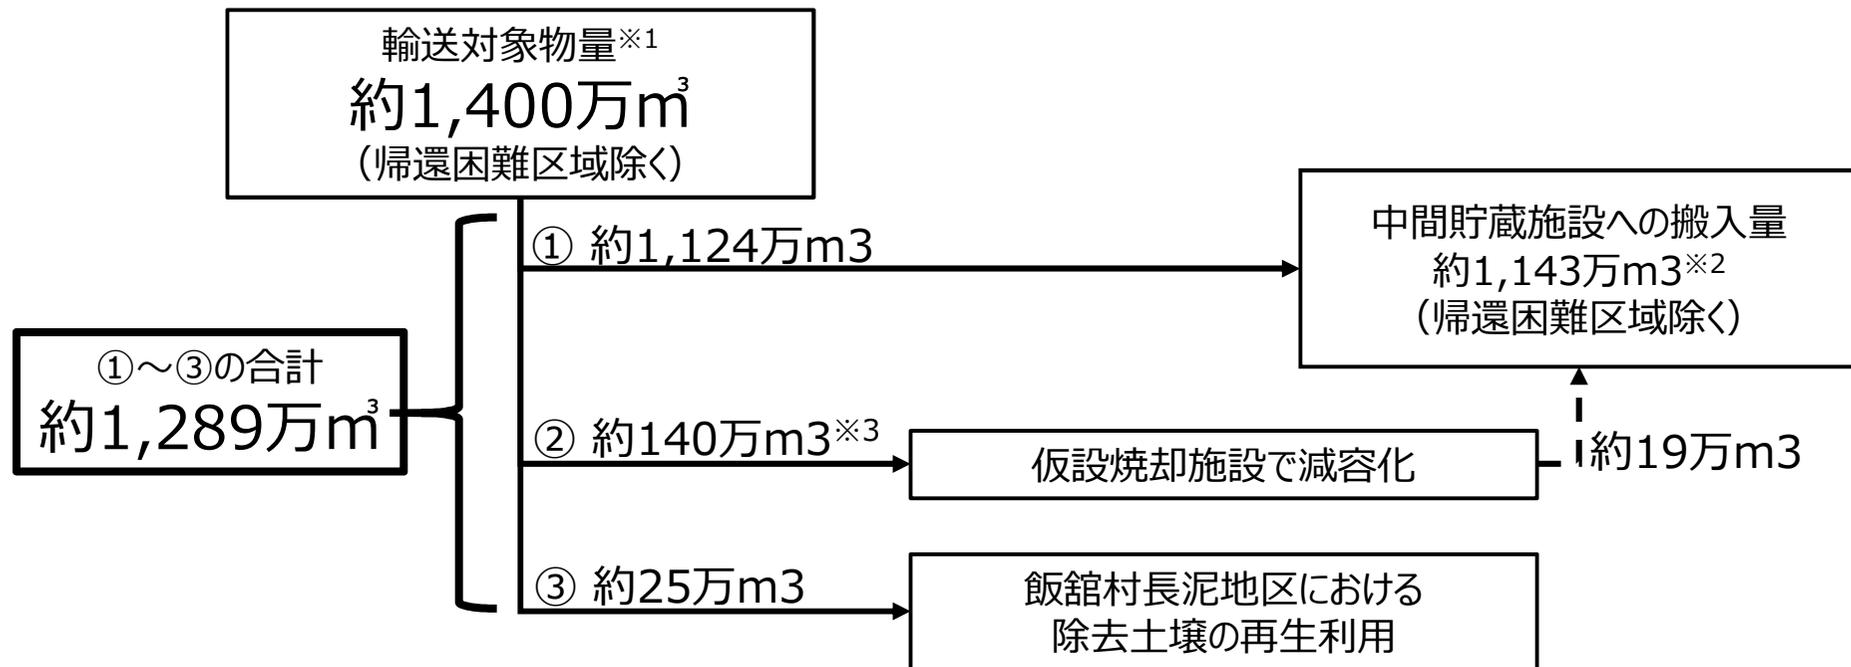

※1 平成30年（2018年）10月集計時点での輸送対象物量（中間貯蔵施設への搬入済量＋仮置場及び減容化施設等での保管量）
 ※2 帰還困難区域を含めた中間貯蔵施設への総搬入量は約1,228万 m^3 （令和3年11月末現在）
 ※3 平成30年（2018年）10月以降の値

輸送に係る主な交通安全対策について

- 新任者研修、現任者研修
輸送車両の運転手等の新任者を対象に、中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る研修を実施。また、既に輸送に従事している現任者についても、毎年度必ず再研修を受講することとしている。2021年度は12月末までに、新任者研修を6回、現任者研修を20回実施。
- 輸送ルート of 事前走行
全運転手が輸送ルートを事前に実走して危険箇所や配慮事項等を相互に確認。運転手の安全意識の底上げと、ルート逸脱防止を図る。
- 走行状況の現場確認
速度超過について注意すべき箇所や交通量の多い箇所等において、輸送車両等の走行状況(帰投時を含む)の確認を実施。
- 優良ドライバー表彰
運転手の安全意識とモチベーションの維持・向上のため、安全な輸送を100日以上行った者に、受注者を通じて優良ドライバー認定証(ヘルメット及び車両ダッシュボードに掲示)を交付。



輸送ルート・危険箇所事前周知



走行状況確認(国道114号)




優良ドライバー認定証の交付

仮置場等での保管

- 除染によって生じた除去土壌等は、一時的な保管場所である仮置場等において安全に管理を実施。
- 福島県内においては、除去土壌等の中間貯蔵施設等への輸送により、約9割の仮置場で搬出が完了した結果、現在は国管理で61箇所(2021年12月末時点)、市町村管理で63箇所(2021年9月末時点)となっている。

【仮置場の基本構造及び管理・点検(国管理の仮置場の例)】

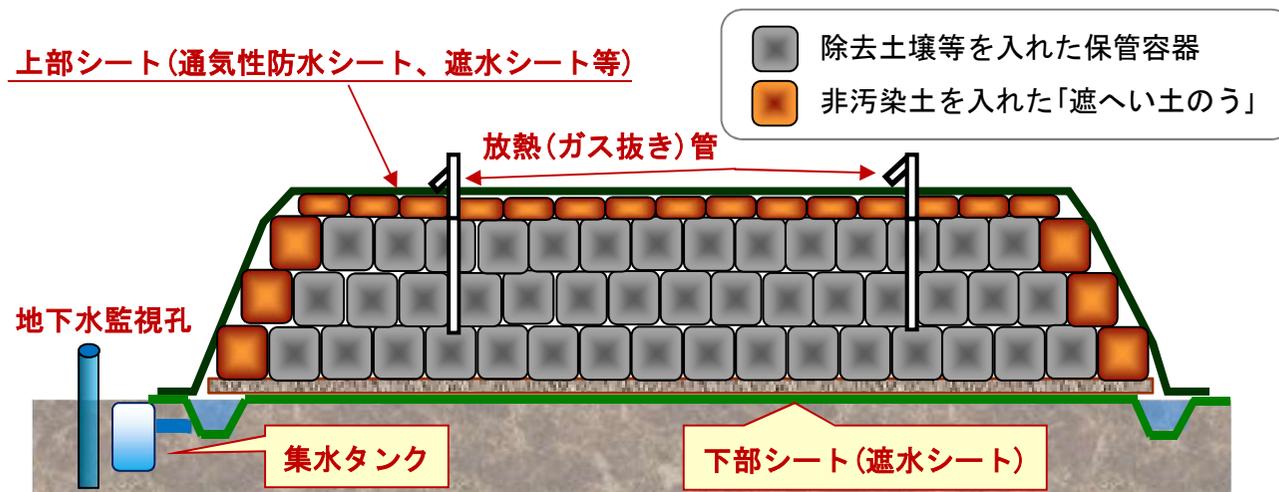

管理・点検の内容

日常点検	週1回	・目視点検 ・空間線量率の計測
	月1回	・地下水の計測
必要時		・集水タンク内 浸出水の計測と処理 ・不具合箇所の補修
異常気象・地震 時の緊急点検		・目視点検 ・空間線量率の計測

【仮置場等の箇所数及び除去土壌等の数量(保管物数)】

時点の数量 / 総数	仮置場箇所数	現場保管箇所数	除去土壌等の数量 (保管物数)
国管理※1	61箇所 / 331箇所	—	約106万袋 / 約1,078万袋
うち特定復興再生 拠点区域	18箇所 / 29箇所	—	約32万袋 / 約148万袋
市町村管理※2	107箇所 / 1,084箇所	32,518箇所 / 221,239箇所	約107万m ³ / 約733万m ³
うち福島県内	63箇所 / 1,040箇所	2,108箇所 / 190,829箇所	約59万m ³ / 約686万m ³

※1 国管理 : 2021年12月末時点
 ※2 福島県内: 2021年9月末時点
 ※2 福島県外: 2021年3月末時点

福島県内の仮置場の原状回復の進捗状況


- 搬出が完了した仮置場については、従前の土地利用形態や跡地利用計画を元に、回復方法について土地所有者や地元市町村等とも調整しながら、順次原状回復を実施し、土地所有者に返地。
- 2020年度は、仮置場288箇所の原状回復を完了。2021年度は、260箇所程度の原状回復完了を目指す。

【搬出・原状回復のイメージ】

中間貯蔵施設等への搬出・仮置場の原状回復

仮置場での保管


原状回復完了

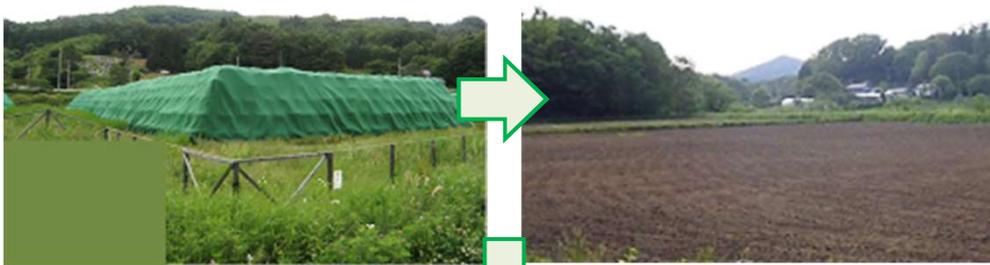

地権者等による営農再開




【原状回復した仮置場数の累計(一部試算)】

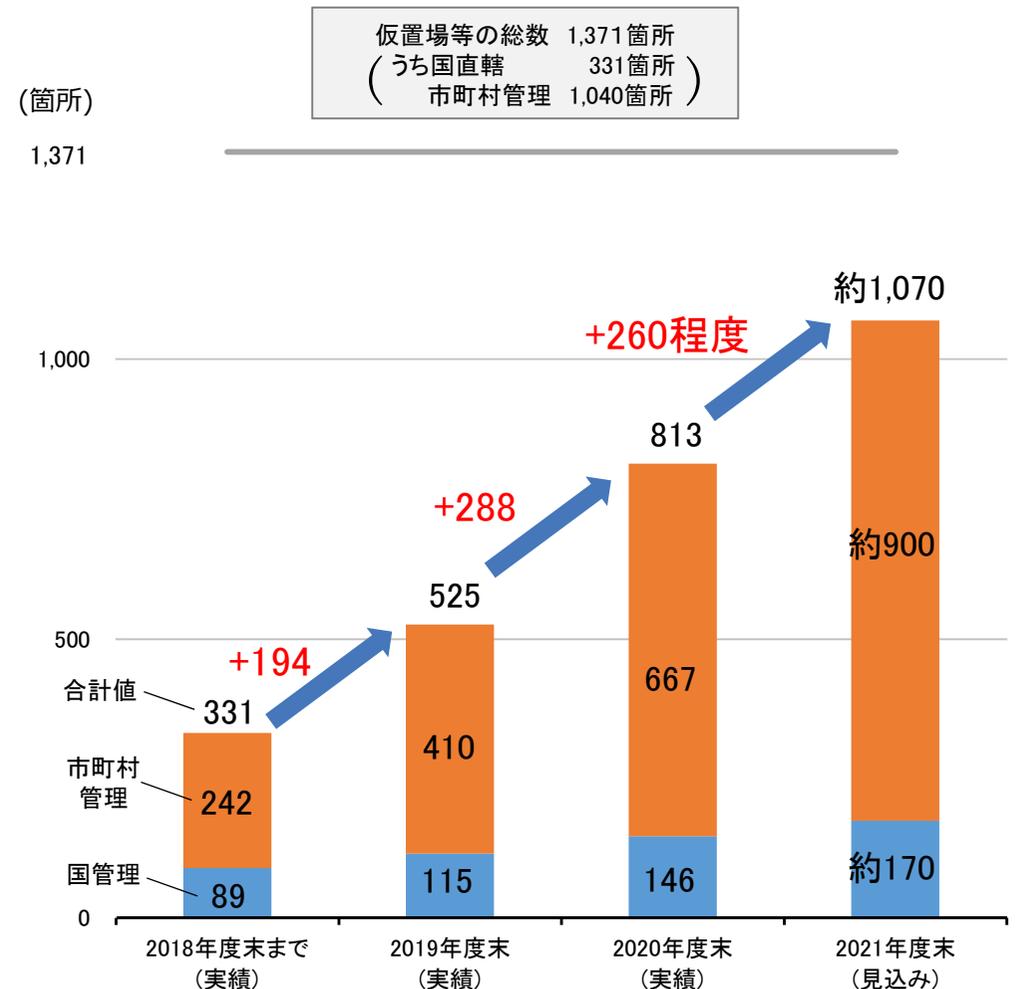

受入・分別施設、土壌貯蔵施設の整備状況

- 2016年11月に、大熊町・双葉町において受入・分別施設、土壌貯蔵施設の整備に着工。
- 2017年6月に除去土壌の分別処理を開始し、2017年10月には土壌貯蔵施設への分別した土壌の貯蔵を開始（大熊工区では2017年10月、双葉工区では2017年12月より除去土壌の貯蔵開始）。
- 2020年3月に、中間貯蔵施設における除去土壌と廃棄物との処理から貯蔵までの全工程で運転を開始した。

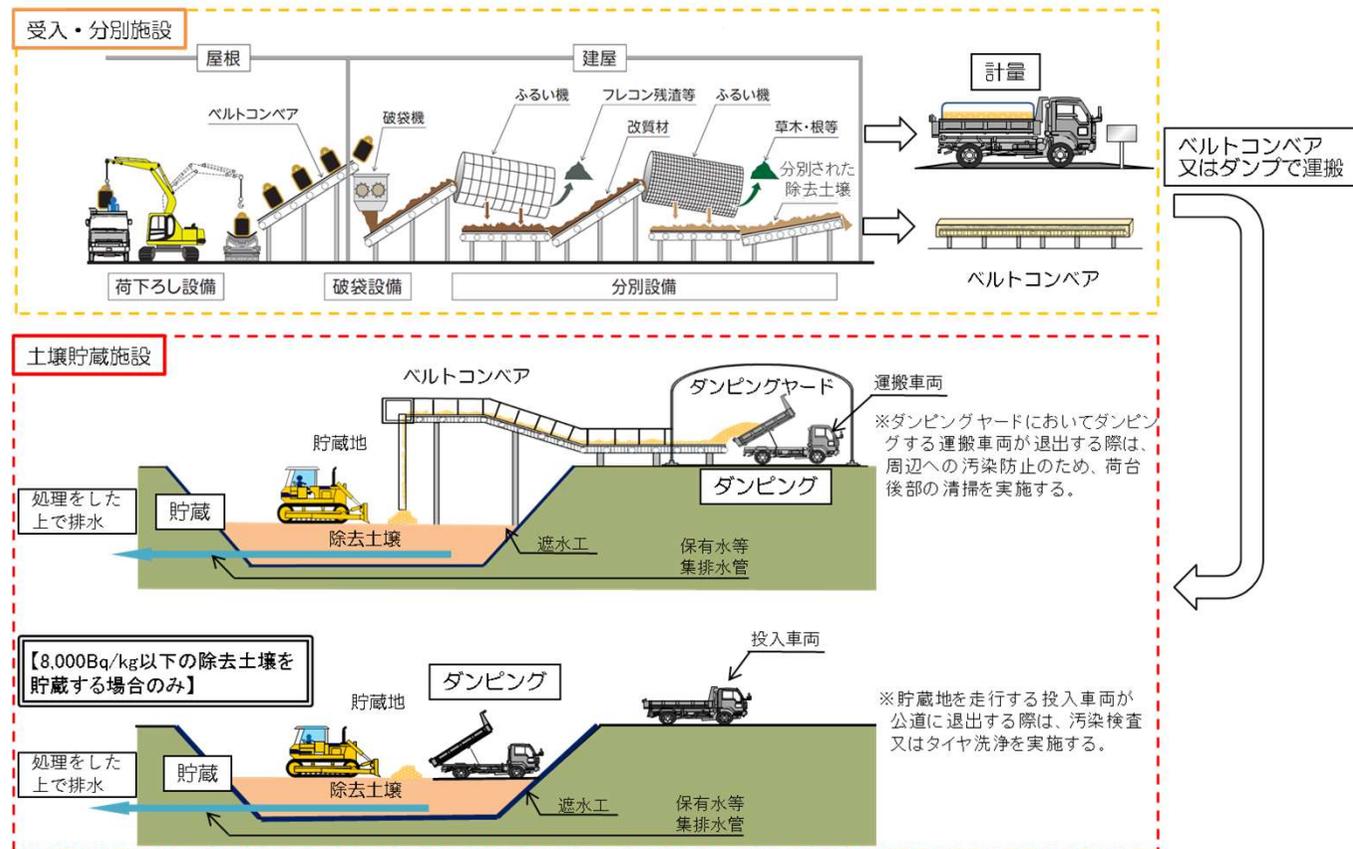

受入・分別施設(大熊①工区)



土壌貯蔵施設(大熊③工区)




土壌貯蔵施設等の整備状況



2022年1月6日撮影

大熊①工区

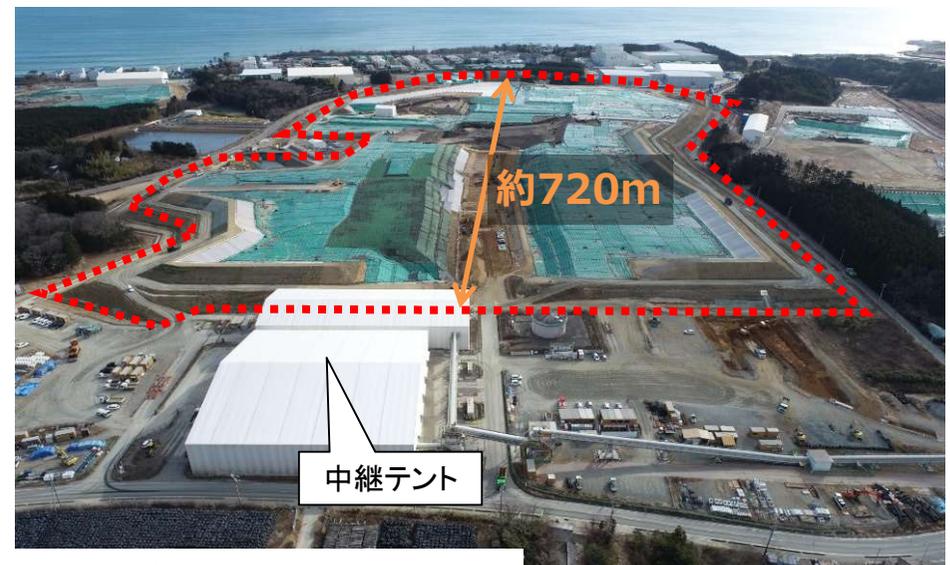

2022年1月6日撮影

大熊②工区



2022年1月6日撮影

双葉①工区



2022年1月6日撮影

双葉②工区

凡例
: 当該工区土壌貯蔵施設

受入・分別施設及び土壌貯蔵施設の状況（2022年1月末）

工区	大熊①工区	大熊②工区	大熊③工区	大熊④工区	大熊⑤工区	双葉①工区	双葉②工区	双葉③工区
受入・分別施設数※ ¹	1	2	1	1	1	2	1	—
貯蔵容量※ ²	約100万m ³	約330万m ³	約210万m ³	約160万m ³	約200万m ³	約140万m ³	約90万m ³	約80万m ³
貯蔵量※ ²	99.2万m ³	277.3万m ³	123.7万m ³	113.3万m ³	160.8万m ³	72.4万m ³	86.6万m ³	41.9万m ³
着工	2017年 9月着工	2016年 11月着工	2017年 11月着工	2018年 10月着工	2018年 10月着工	2016年 11月着工	2018年 1月着工	2018年 9月着工
受入・分別施設スケジュール	2018年7月 運転開始	2017年8月 2018年7月 運転開始	2018年7月 運転開始	2019年8月 運転開始	2019年8月 運転開始	2017年6月 2018年9月 運転開始	2019年2月 運転開始	(なし)
土壌貯蔵施設スケジュール	2018年7月 運転開始	2017年10月 運転開始	2018年10月 運転開始	2020年3月 運転開始	2019年4月 運転開始	2017年12月 運転開始	2019年5月 運転開始	2019年12月 運転開始
受注者	鹿島JV	清水JV	大林JV	清水JV	大林JV	前田JV	大成JV	安藤・間JV

※1 発注時の1施設当たりの処理能力は140t/時。双葉③工区は、受入・分別施設を整備していない。

※2 貯蔵容量及び貯蔵量は、仮置場等からの輸送量ベース（1袋＝1m³で換算）。用地確保状況等により変更となる可能性がある。

仮設焼却施設及び仮設灰処理施設の状況

施設	大熊町	双葉町（その1）	双葉町（その2）
規模	<ul style="list-style-type: none"> 仮設焼却施設：200 t / 日 × 1 炉（ストーカ炉） 	<ul style="list-style-type: none"> 仮設焼却施設：150 t / 日 × 1 炉（シャフト炉） 仮設灰処理施設：75 t / 日 × 2 炉（表面熔融炉） 	<ul style="list-style-type: none"> 仮設焼却施設：200 t / 日 × 1 炉（ストーカ炉） 仮設灰処理施設：75 t / 日 × 2 炉（コークスベット式灰熔融炉）
敷地面積	約5.0ha	約5.7ha	約6.8ha
着工	2016年7月伐採・造成開始	2018年6月伐採・造成開始	2018年6月伐採・造成開始
建設工事スケジュール	2016年12月開始	2019年1月開始	2019年1月開始
処理スケジュール	2018年2月処理開始	2020年3月処理開始	2020年3月処理開始
受注者	三菱・鹿島JV	新日鉄・クボタ・大林組・TPT JV	J F E ・ 前田 J V
外観			

廃棄物貯蔵施設の状況 (2022年1月末)

工区	大熊1工区	双葉1工区	双葉2工区
主な建築構造	鉄骨鉄筋コンクリート造 (2棟)	鉄骨鉄筋コンクリート造 (1棟)	鉄骨鉄筋コンクリート造 (1棟)
貯蔵容量※	29,280個	14,678個	30,028個
貯蔵量※	3,877個	6,348個	—
敷地面積	約2.4ha	約2.2ha	約3.7ha
着工	2018年7月 造成開始 2018年12月 建築開始	2018年6月 造成開始 2018年11月 建築開始	2019年12月 造成開始 2019年12月 建築開始
貯蔵スケジュール	2020年4月貯蔵開始	2020年3月貯蔵開始	双葉1工区貯蔵完了後予定
施設整備受注者	鹿島建設	大林組	鹿島建設
定置・維持管理受注者	鹿島建設		
外観			

※ 貯蔵容量及び貯蔵量は、鋼製角形容器 (内寸 約1.3m(幅)×約1.3m(奥行)×約1.1m(高さ)) の個数。

工事全般に係る安全対策

○安全を第一に事業を実施するため、中間貯蔵施設等の工事全般に係る安全対策を徹底している。

○具体的な対策としては

- ①安全パトロール、②発注者安全点検、③危険予知(KY)訓練ワークショップ、
- ④中間貯蔵施設災害防止協議会、⑤中間貯蔵工事等協議会及び中間貯蔵安全会議等を実施している。

①安全パトロール

環境省職員及び労働安全コンサルタントによる抜き打ちの安全パトロールを実施。



②発注者安全点検

災害・事故防止のため、作業の安全管理状況、施工体制整備状況等について環境省職員による点検を実施



③危険予知(KY)訓練ワークショップ

監督官及びJESCOの委託監督員等を対象に、労働安全コンサルタントの指導による危険予知訓練を実施。



④中間貯蔵施設災害防止協議会

福島労働局及び富岡労働基準監督署の指導により、中間貯蔵施設事業の作業現場における安全管理水準の更なる向上を目的として開催。



⑤中間貯蔵工事等協議会及び中間貯蔵安全会議

重大な事故等の発生要因及び再発防止策等を共有し、各受注者の取組状況や課題に関する意見交換等を行い、各現場における安全対策の強化・改善等を図る。



総論

○安全を第一に、地域の理解を得ながら、事業を実施する。

輸送

○特定復興再生拠点区域等で発生した除去土壌等の搬入を進める。

○より安全で円滑な輸送のため、以下の対策を実施する。

- ・運転者研修等の交通安全対策や必要な道路補修等を実施し、安全な輸送を確保
- ・円滑な輸送のため、輸送出発時間の調整など、特定の時期・時間帯への車両の集中防止・平準化

○福島県と連携し、市町村と調整の上、立地町である大熊町・双葉町への配慮等をしつつ、計画的な輸送を実施する。

用地

- 着実な事業実施に向け、丁寧な説明を尽くしながら、施設整備の進捗状況、除去土壌等の発生状況に応じて、必要な用地取得を行う。

施設

○受入・分別施設及び土壌貯蔵施設

- ・受入・分別施設は、安全かつ計画的に稼働する。
- ・土壌貯蔵施設は、安全に稼働するとともに、整備されたところから順次活用する。土壌貯蔵が終了した施設では、安全性を確保しつつ、維持管理を着実に実施する。

○廃棄物関連施設

- ・仮設焼却施設及び灰処理施設並びに廃棄物貯蔵施設を、安全に稼働しつつ有効に活用する。

再生利用・最終処分

- 最終処分量の低減に資する、除去土壌等の減容・再生利用に向け、関係機関の連携の下、地元の御理解を得ながら、技術開発や実証事業を実施するとともに、再生利用先の具体化を推進する。
- 県外最終処分に係る経緯や必要性及び減容・再生利用の必要性・安全性等に関する理解醸成活動を全国に向けて推進する。
- 減容処理や安定化技術のさらなる開発・検証を行うなど、県外最終処分に向けた検討を進める。

情報発信

- 環境再生に向けた取組や地元の思いなどを発信するための更なる方策について検討を行う。

(3) 再生利用・最終処分について

2011. 11. 11 放射性物質汚染対処特措法基本方針(閣議決定)

- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 基本方針(抜粋)
- 5. 除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項
……また、仮置場等の確保等の観点から、除去土壌について、技術の進展を踏まえつつ、保管又は処分の際に可能な限り減容化を図るとともに、減容化の結果分離されたもの等汚染の程度が低い除去土壌について、安全性を確保しつつ、再生利用等を検討する必要がある。

2014. 11. 17 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(改正JESCO法)成立

- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(抄)
- (国の責務)
- 第三条(略)
- 2 国は、前項の措置として、特に、中間貯蔵を行うために必要な施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、当該施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとする。

2015. 2. 25 中間貯蔵施設の周辺地域の安全確保等に関する協定書(福島県、大熊町、双葉町、環境省)


- 中間貯蔵施設の周辺地域の安全確保等に関する協定書(抄)
- (最終処分を完了するために必要な措置等)
- 第14条
- 4 丙(環境省)は、福島県民その他の国民の理解の下に、除去土壌等の再生利用の推進に努めるものとするが、再生利用先の確保が困難な場合は福島県外で最終処分を行うものとする。

2019. 12. 20 「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針(閣議決定)

- 「復興・創生期間」後の基本方針(抄)
- 1. 復興の基本姿勢及び各分野における取組
- (2)② 環境再生に向けた取組
最終処分量を低減するため、国民の理解の下、政府一体となって除去土壌等の減容・再生利用等を進めることが重要であり、……再生利用先の創出等については、関係省庁等の連携強化を図り、政府一体となって取組を進める。

減容・再生利用技術開発戦略、再生利用の基本的考え方


- 福島県内で発生した除去土壌等については、中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずることとしている。 県外最終処分量を低減するため、政府一体となって、除去土壌等の減容・再生利用等に取り組んでいるところ。
- 減容・再生利用の推進に当たっては、2016年に策定し、2019年に見直しを行った「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」に沿って、具体的な取組を進めている。
- 特に、再生利用については、2016年にとりまとめた「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方」を指針として、実証事業を実施するとともに、全国民的な理解醸成に取り組み、環境整備を進めている。

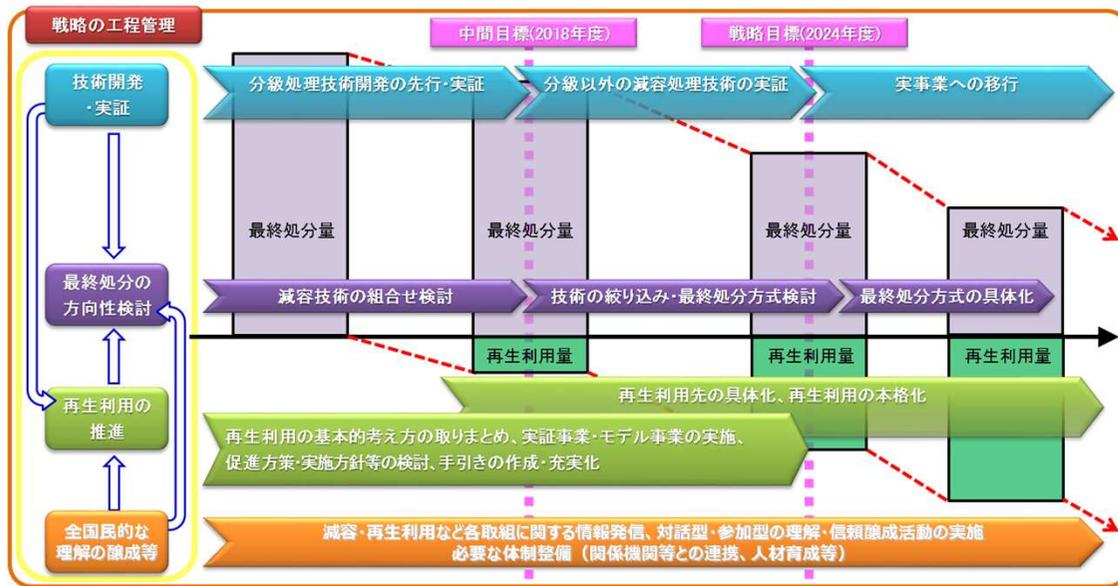

(下)「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方」の概要

- **再生利用の用途の限定** (管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等における道路等の盛土材等に限定)
- **追加被ばく線量を制限するための適切な管理** (再生資材の放射能濃度の限定、適切な厚さの覆土等)

(上)「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」の概要

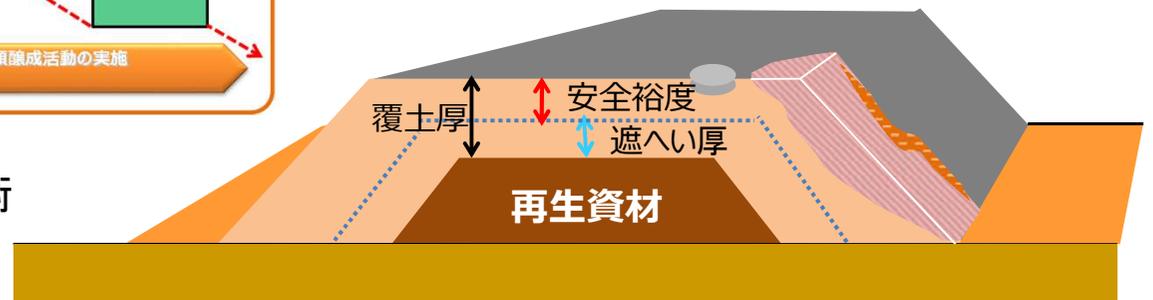

覆土厚は、土木構造物としての通常の補修がなされる場合でも、被ばくを制限するための遮へい厚が確保されるよう設計。

除去土壌の再生利用の必要性



中間貯蔵施設へ運び込まれる除去土壌等の量は

東京ドーム約11杯分※

県外最終処分に向け 最終処分量を低減するための 再生利用が鍵

※帰還困難区域のものを除く

除去土壌の放射能濃度分布

濃度の**低い**土壌

8,000Bq/kg以下
約 3 / 4

8,000Bq/kg超
約 1 / 4

再生利用

公共工事等で管理
した上での再生利用

覆土材

再生資材

減容等を図った上で

中間貯蔵開始後 30年以内の 県外最終処分の完了


福島県飯舘村長泥地区での再生利用実証事業

- 2018年4月に計画認定された飯舘村の「特定復興再生拠点区域」において、除染による発生土（除去土壌）を再生資材化して盛土材として使用し、その上に覆土をして、農地として利用する実証事業を実施。
- 実証事業の成果・進捗状況は以下の通り。
 - 地元の皆様の御要望等を踏まえ、2019年度から盛土実証エリアにおいて、野菜・花き類等の栽培実験を開始。2021年度に栽培した**野菜の放射能濃度は、0.1~2.5Bq/kgで、いずれも基準値を大きく下回っている。**
 - ※一般食品に関する放射性セシウムの基準は、100Bq/kg。
 - これまでのモニタリングの結果、**空間線量率の上昇は見られず、盛土浸透水から放射性セシウムは検出されていない。**
 - 2020年6月から農地造成に向けた準備工事を開始し、2021年4月からは再生資材による盛土を開始。

栽培実験での測定結果



<2021年度に行われた栽培実験での放射性セシウムの測定結果（一部）>

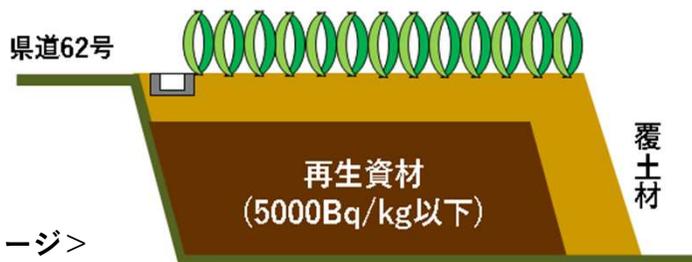

<造成後の営農イメージ>



長泥地区ドローン写真

再生利用等に関する理解醸成への取組状況

- 再生利用等に関する理解醸成を図るため、福島県内除去土壌を用いた鉢植えを環境省本省に加え、2021年7月には総理大臣官邸、復興庁、自民党本部、公明党本部にも設置。また、12月には5か所の環境省関連施設内にも設置。
- 飯舘村長泥地区の実証事業について多くの方に認知・理解していただくため、事業エリアを対象とした一般の方向けの現地見学会を実施。2021年7月から11月にかけて計12回実施した。
- 除去土壌等の最終処分量を減らすための減容・再生利用の必要性及び安全性について、全国各地で対話集会を開催するなど、全国での理解醸成活動を抜本的に強化し取り組んでいる。

◆福島県内除去土壌の環境省本省等での利用



環境省本省内



総理大臣官邸

◆再生利用実証事業現地見学会



◆第3回対話フォーラムの様子（12月18日に名古屋にて開催）




利用のイメージと
周辺の放射線量

※鉢植えの設置前後で
大臣室内の鉢植え周辺の
空間線量率は変化なし。
(空間線量率：0.06 μ Sv/h)

※2021年5月に第1回を、9月に第2回を開催。
2022年3月19日に第4回を福岡で開催予定。

福島県外における除去土壌の処分

- 福島県外の市町村が除去土壌の埋立処分を実施する場合、国が施行規則で定める処分方法に従う必要があるが、当該規則は未策定。※福島県外に保管されている除去土壌の総量は約33万m³(7県56市町村)。
- 処分方法について、環境回復検討会の下に「除去土壌の処分に関する検討チーム」を設置し、専門的見地から管理下での処分方法について検討中。
- 埋立処分の安全性について確認するため実証事業を実施(那須町:終了、東海村:継続中、丸森町:R3-)。
※ 福島県外で保管中の除去土壌の放射性セシウム濃度(推計値)の中央値は600Bq/kg程度、約95%は2,500Bq/kg以下。

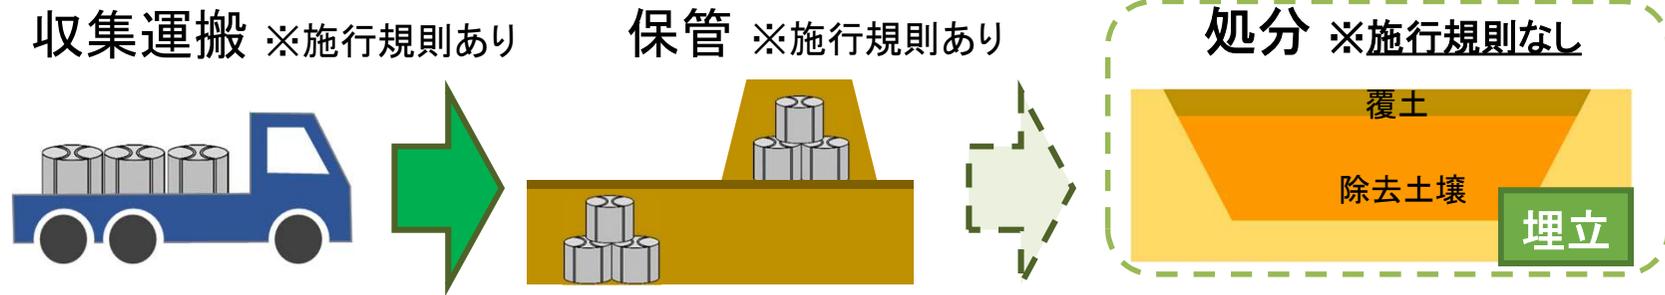

<「検討チーム」における主な意見>

- 福島県外の除去土壌については放射性物質濃度が比較的 low、外部被ばく及び地下水等からの内部被ばくの影響はきわめて低いレベルになると考えられる。
- 実証事業を通じて安全に埋立処分が実施できることが確認された。
- 地域住民においては安全性に対する不安も大きいと考えられるため、処分方法の検討に当たっては、自治体の意見も伺いながら住民の理解醸成を図ることが重要。

<自治体の主な意見>


- 速やかに処分に移行したい。
- 現在の保管場所での埋立処分を検討する。
- 基準ができては実際には住民の理解を得ることが難しく処分は進まないと思われる。

福島県外の除去土壌の埋立処分の実証事業結果～空間線量率・浸透水ともに異状なし～

茨城県東海村

・村内2箇所現場保管されていた除去土壌(1,428m³)を用いて、JAEA原子力科学研究所敷地内で実施。

＜敷地境界における空間線量率の推移＞

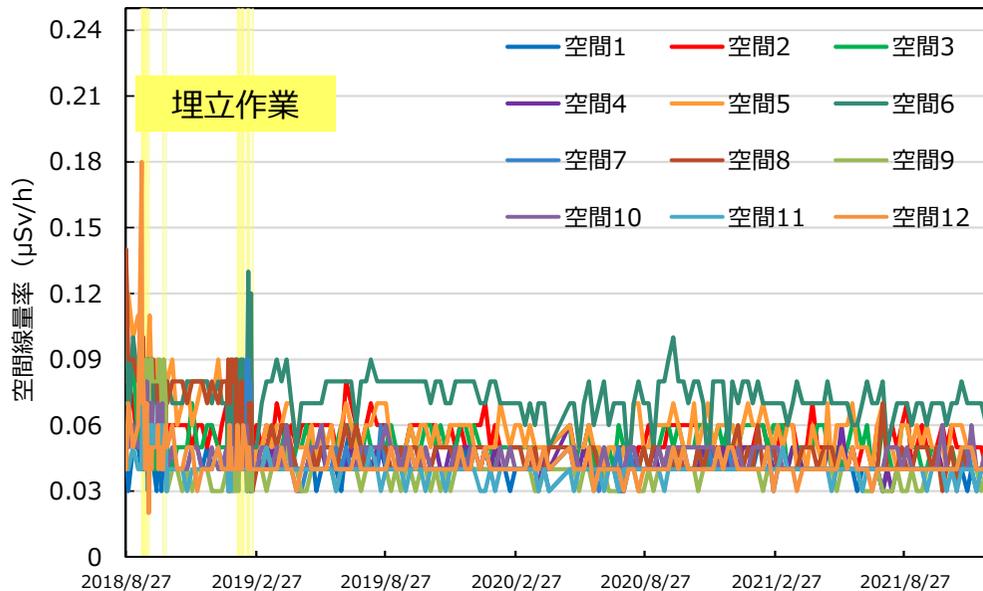


＜浸透水中の放射能濃度＞

すべて検出下限値未満(検出下限値1Bq/L以下)

栃木県那須町

・現場保管されていた除去土壌(217m³)を用いて、伊王野山村広場内で実施。


＜敷地境界における空間線量率の推移＞

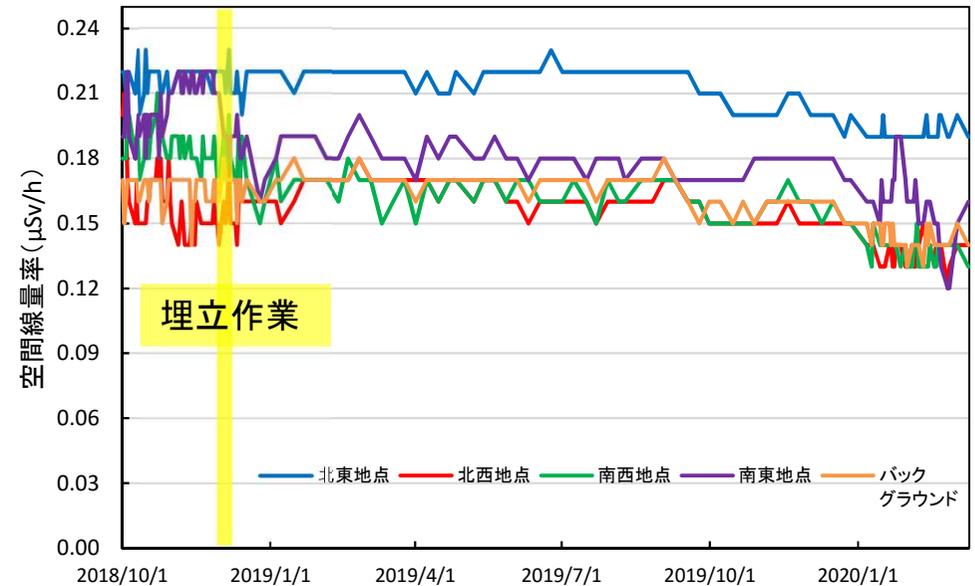

＜浸透水中の放射能濃度＞

すべて検出下限値未満(検出下限値1Bq/L以下)

【実証事業のイメージ】

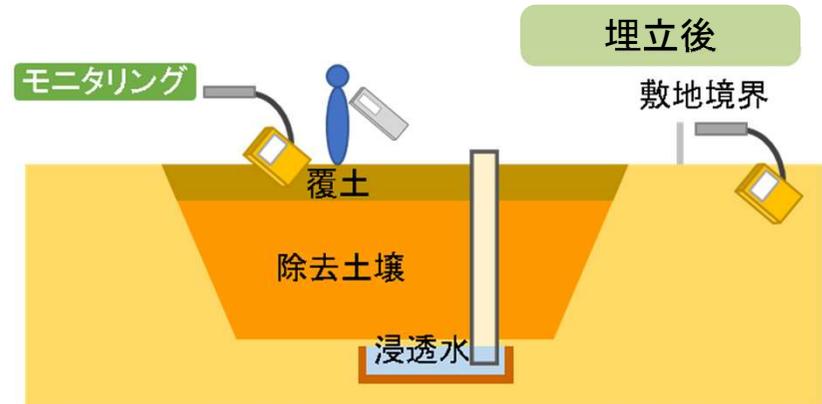

目的

- 除去土壌の埋立処分により、周辺居住者の健康と生活環境に悪影響がないこと及び作業員の安全性に問題がないことを確認する。
- 安全に除染廃棄物から除去土壌を分別し、埋立処分を行えることを確認する。

出典：丸森町ホームページ／まるもりマップ

対象物

除去土壌：480袋

除染廃棄物：2,258袋から分


別された除去土壌

実施場所

上滝仮置場内

(宮城県丸森町字石羽

49-127)

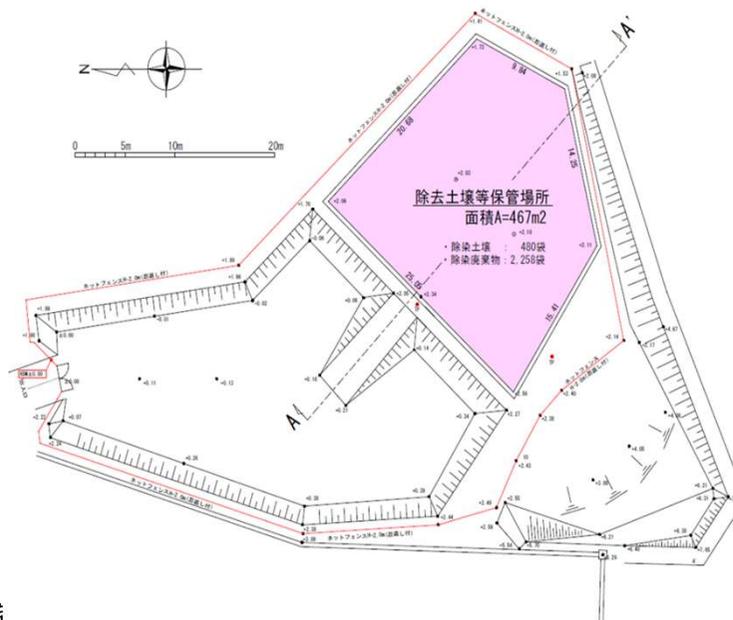

出典：国土地理院

(<https://maps.gsi.go.jp/#15/37.875091/140.778551/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>)

(4) 指定廃棄物等について

- 放射性物質汚染対処特別措置法の基本方針(2011年11月11日閣議決定)において、各都道府県内で発生した指定廃棄物は当該都道府県内で処理することが定められている。

- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針(抜粋)


3. 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項

(3) 指定廃棄物の処理に関する事項

(前略)

指定廃棄物の処理は、水道施設から生じた汚泥等の堆積物等については厚生労働省、公共下水道・流域下水道に係る発生汚泥等については国土交通省、工業用水道施設から生じた汚泥等の堆積物等については経済産業省、集落排水施設から生じた汚泥等の堆積物等及び農林業系副産物については農林水産省と連携して、環境省が行う。また、指定廃棄物の処理は、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うものとする。

福島県（汚染廃棄物対策地域内）における廃棄物の処理フロー

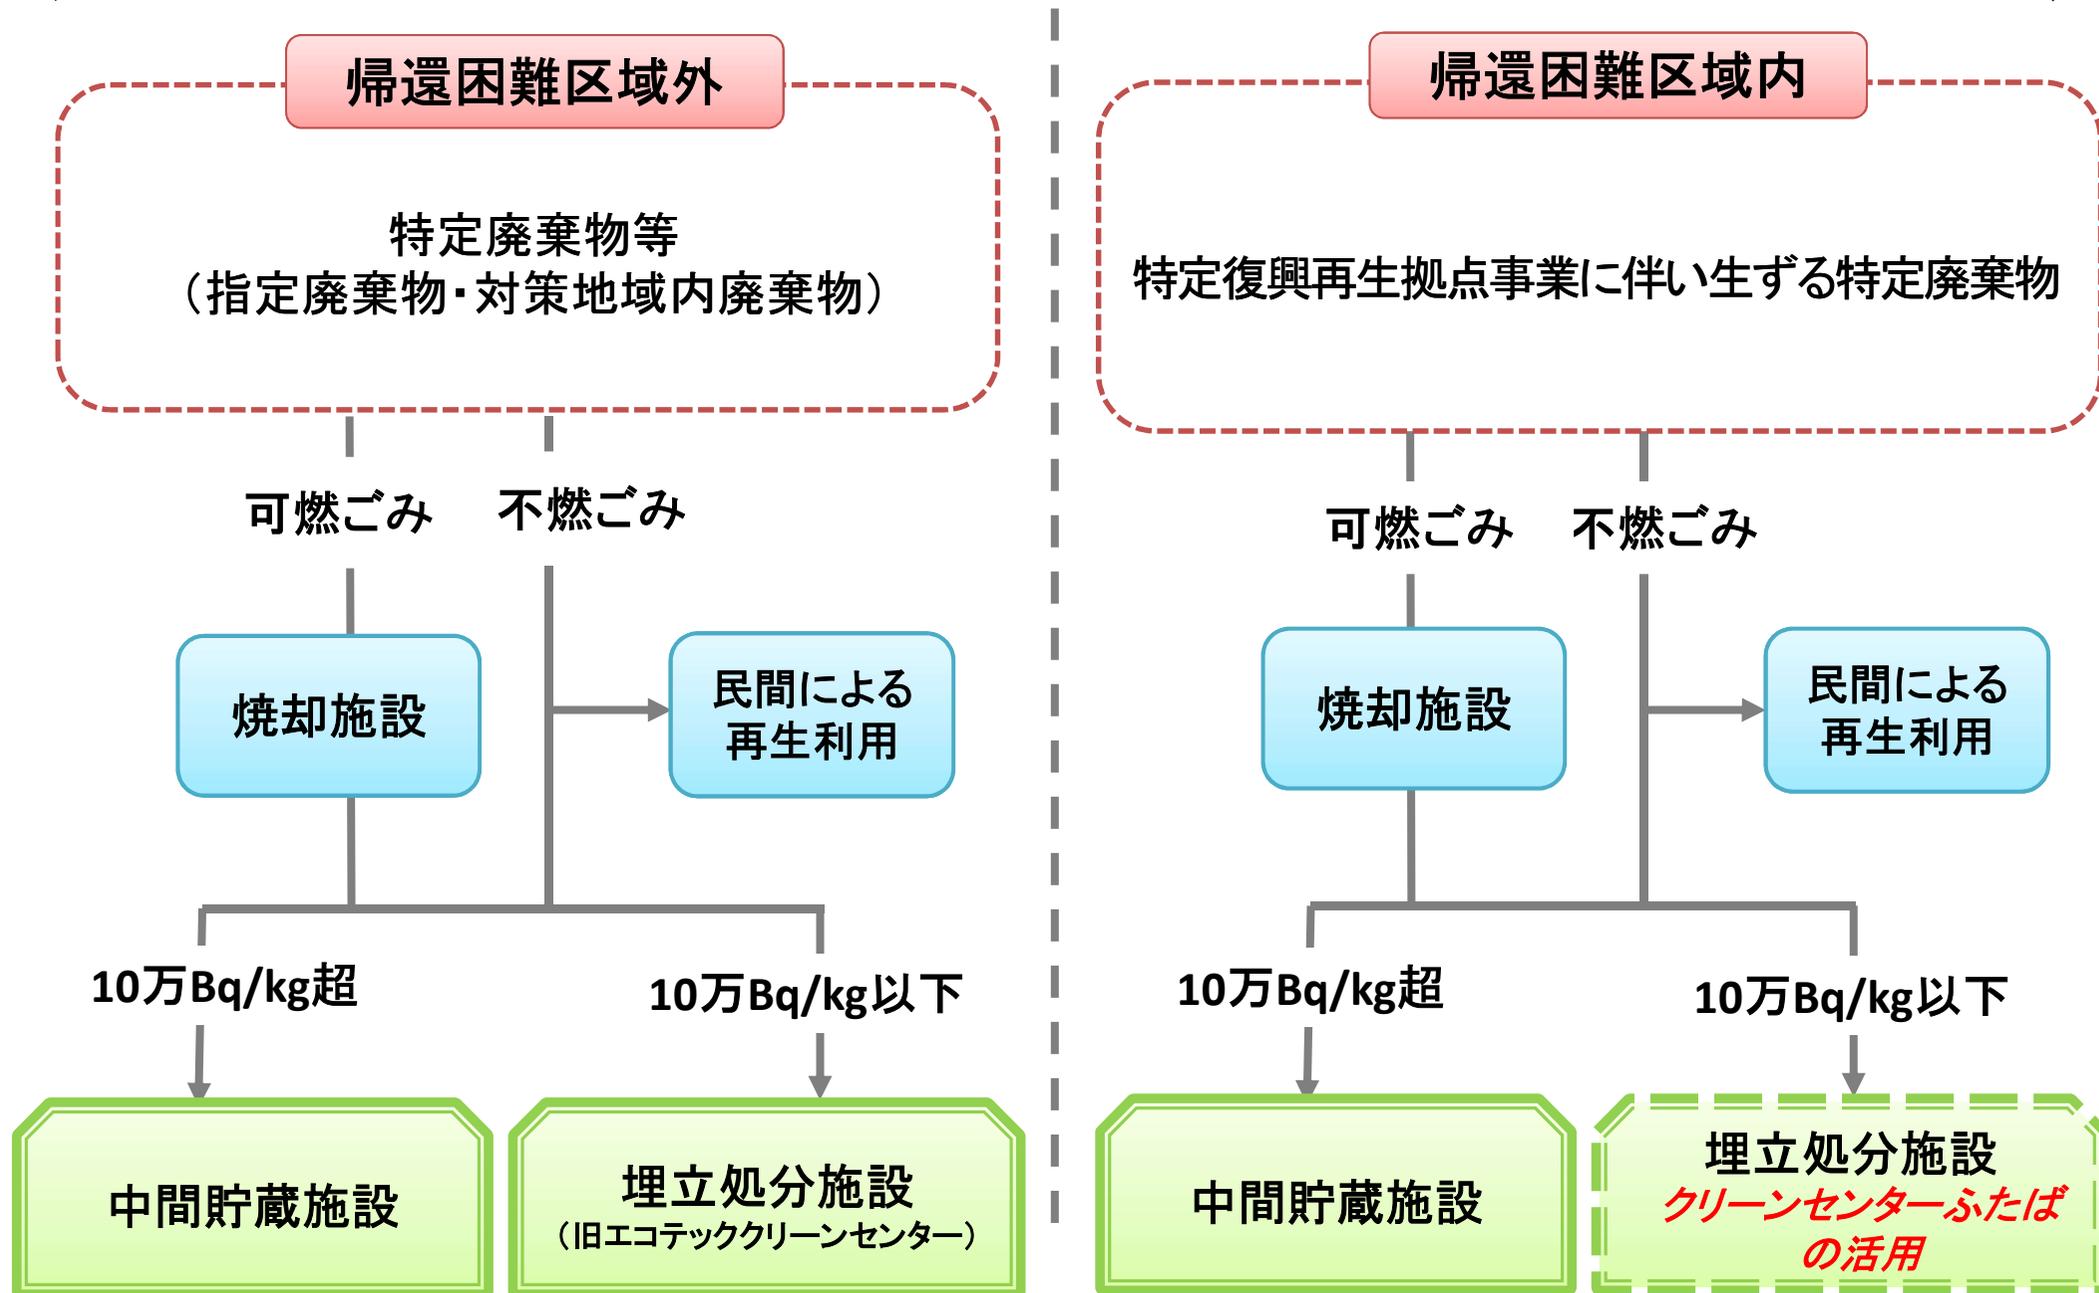

注) 双葉郡8町村の生活ごみは、旧エコテッククリーンセンター(10年間)において埋立処分される。
除染により生じる土壌や廃棄物は分別や焼却処理を経て、中間貯蔵施設にて保管される。

指定廃棄物の指定状況

2021年9月末時点

	焼却灰		浄水発生土 (上水)		浄水発生土 (工水)		下水汚泥 焼却灰含む		農林業系副産物 (稲わらなど)		その他		合計	
	件	数量(t)	件	数量(t)	件	数量(t)	件	数量(t)	件	数量(t)	件	数量(t)	件	数量(t)
岩手県	9	312.1									1	1.3	10	313.5
宮城県			5	553					4	2,274.4	4	0.5	13	2,827.9
福島県 ^{※1}	1,301	325,852.5	36	2,445.2	11	584.1	110	8,076.9	3	690.3	459	14,916.3	1,920 (331)	352,565.2 (85,684.3)
茨城県	20	2,380.1					2	925.8	1	0.4	3	229.4	26	3,535.7
栃木県	8	1,331.4	14	727.5		(26.0) ^{※2}	8	2,200.0	27	8,137.0	6	21.3	63	12,417.1
群馬県			6	545.8	1	127.0	5	513.9			1	0.3	13	1,187.0
千葉県	47	2,719.6					1	542.0			17	455.2	65	3,716.8
東京都	1	980.7									1	1.0	2	981.7
神奈川県											3	2.9	3	2.9
新潟県			4	1,017.9									4	1,017.9
合計	1,386	333,576.4	65	5,289.4	12	711.1	126	12,258.6	35	11,102.1	495	15,628.2	2,119	378,565.7

※1 福島県の合計の括弧書き331件・85,684.3tについては、事業者・自治体に保管されている指定廃棄物を表している。

※2 栃木県の浄水発生土(工水)(26.0t)、は上水と兼用の施設で発生したものであり、浄水発生土(上水)に含めている。

福島県内の指定廃棄物の状況について


- 現存している福島県内の指定廃棄物1,920件・352,565t^{※1}のうち、特定廃棄物埋立処分施設で処分又は中間貯蔵施設で保管等するため、搬出された指定廃棄物は1,419件・202,249t(約57%^{※2})である。
- また、事業者・自治体等の申請等に基づき指定された福島県内の指定廃棄物1,563件・188,243tのうち、1,232件・102,559t(約54%^{※2})が、焼却処理・埋立処分等するため搬出され、事業者・自治体において331件・85,684tの指定廃棄物が保管されているところ。

※1 小数点第一位を四捨五入(以下同じ) ※2 重量割合を示す

(2021年9月末時点)

福島県内の指定廃棄物の状況

事業者・自治体等の申請等に基づき指定された指定廃棄物

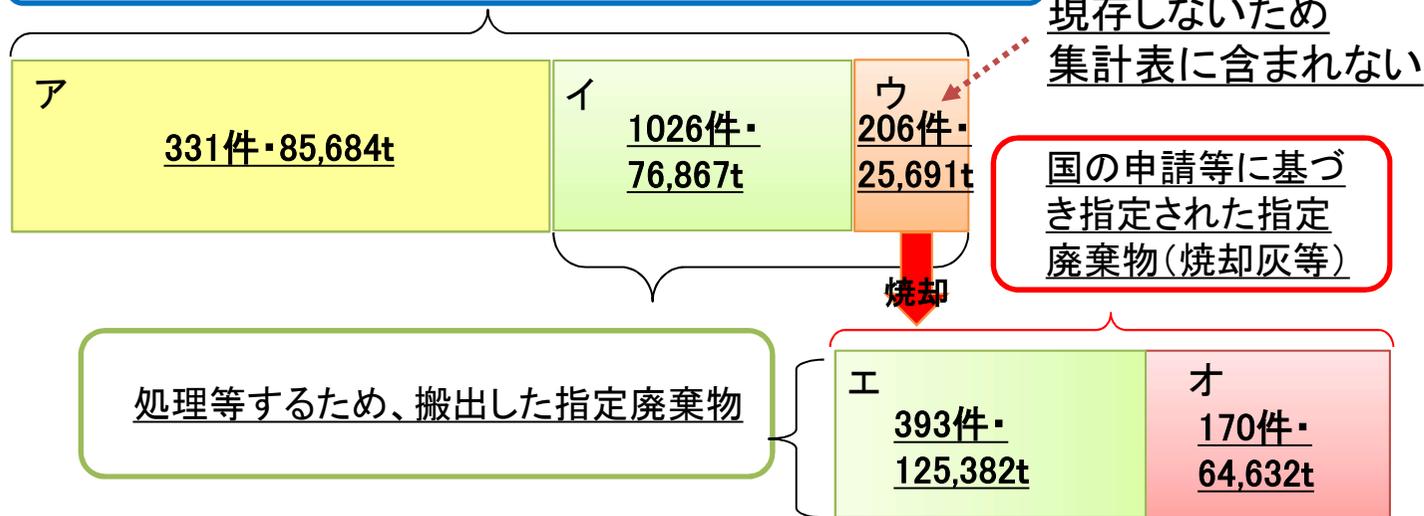

- 一時保管中の指定廃棄物
- 特定廃棄物埋立処分施設で処分又は中間貯蔵施設で保管等(仮設焼却施設で焼却処理する場合を除く。)するため、搬出した指定廃棄物
- 仮設焼却施設で焼却処理するため、搬出した指定廃棄物
- 事業者・自治体等の指定廃棄物、対策地域内廃棄物等を焼却処理したことによって発生した焼却灰・ばいじん(なお、焼却灰・ばいじんであって、特定廃棄物埋立処分施設で処分又は中間貯蔵施設で保管等するため、搬出したものは に示す。)

- 現存している福島県内の指定廃棄物うち、処理等するため搬出されたもの = ア + イ + エ + オ = 1,920件・352,565t
- 事業者・自治体等の申請等に基づき指定された指定廃棄物うち焼却処理・埋立処分等するために搬出されたもの = イ + エ = 1,419件・202,249t
- 事業者・自治体等の申請等に基づき指定された指定廃棄物 = ア + イ + ウ = 1,563件・188,243t
- 事業者・自治体等の申請等に基づき指定された指定廃棄物うち焼却処理・埋立処分等するために搬出されたもの = イ + オ = 1,232件・102,559t

対策地域内廃棄物の処理状況

○ 福島県内の対策地域内廃棄物について、一部市町村では減容化まで終了し、着実に処理を進めている。

(2021年12月末時点)

		被災家屋等の解体撤去※1 (特定復興再生拠点区域を除く)	仮置場への搬入	仮設焼却施設における 焼却処理等※2	埋立処分
対策地域内廃棄物 災害廃棄物等	南相馬市	終了	終了	実施期間(2015年4月～2020年3月)	特定廃棄物埋立処分施設 へ搬入中※4 (2017年11月から 約6年間程度)
	飯舘村 (小宮地区)	終了	終了	実施期間(2014年8月～2017年3月)	
	飯舘村 (蕨平地区)	終了	終了	実施期間(2016年1月～2021年2月)	
	葛尾村	終了	終了	実施期間(2015年4月～2021年3月)	
	浪江町	終了	終了	実施中(2015年5月～)	
	双葉町	ほぼ終了	実施中	実施中(2020年3月～)※3	
	大熊町	ほぼ終了	実施中	実施中(2017年12月～)	
	川内村	終了	終了	実施期間(2014年12月～2016年2月)	
	富岡町	終了	終了	実施期間(2015年4月～2018年8月) (現在は、浪江町で広域処理実施中)	
	楢葉町	終了	終了	実施期間(2016年11月～2019年3月)	
	川俣町	終了	終了	既存の処理施設で処理終了	
	田村市	終了	仮置場設置なし	既存の処理施設で処理終了	

※1家屋解体については、各市町村と解体受付期間を相談しながら進めている。

※2川俣町、田村市では、地元の既存施設を用いて処理を実施。

※3双葉町には、第一(150t/日)と第二(200t/日)の2施設がある。

※4特定復興再生拠点区域から発生する廃棄物等については、クリーンセンターふたばに搬入する予定となっている。

福島県内の管理型処分場を活用した特定廃棄物の埋立処分

- 特定廃棄物埋立処分事業について、2017年11月17日に特定廃棄物等を搬入開始。
- これまでに搬入目標の約7割にあたる209,112袋搬入済み。(2021年12月末時点)
- 搬入開始前後のモニタリング結果において、空間線量率等の特異的な上昇は見られていない。

これまでの経緯

- 2013.12.14 国が福島県・富岡町・楢葉町に受入れを要請
- 2015.12.4 県・富岡町・楢葉町から国に対し、事業を容認する旨、伝達
- 2016.4.18 管理型処分場(旧エコテッククリーンセンター)を国有化
- 2016.6.27 国と県、両町との間で安全協定を締結
- **2017.11.17 搬入開始**
- 2018.8.24 特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」開館
- 2019.3.20 特定廃棄物等固型化処理施設稼働

埋立対象物・搬入期間

- 対策地域内廃棄物等(10万Bq/kg以下):約6年
- 福島県内の指定廃棄物(10万Bq/kg以下):約6年
- 双葉郡8町村の生活ごみ:約10年
- なお、10万Bq/kg超は中間貯蔵施設に搬入




2020年3月10日時点

- 汚染廃棄物対策地域
- ▨ 帰還困難区域
- 仮設焼却施設

関連施設について

- 1 特定廃棄物埋立処分施設
- 2 特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」
- 3 特定廃棄物固型化処理施設

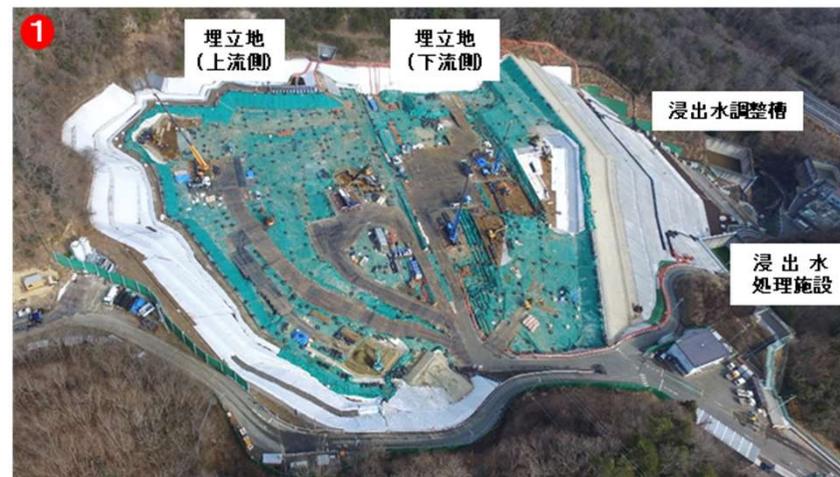

1.受入れ・保管 → 2.固型化処理 → 3.養生 → 4.保管・搬出

特定復興再生拠点区域における解体の進捗状況

○ 特定復興再生拠点区域における家屋解体工事は、現時点の申請数に比して約82%で、各町村における進捗状況は以下のとおり。

2021年12月末時点

町村名	申請受付状況	解体申請件数	解体済件数
浪江町	受付中	479	310
双葉町	受付中	1,096	902
大熊町	受付中	1,435	1,236
富岡町	受付中	863	703
飯舘村	受付終了	90	89
葛尾村	受付終了	47	47
合計		4,010	3,287

双葉町
(双葉町)
双葉町体育館



クリーンセンターふたばを活用した廃棄物の埋立処分

- 福島県内では、双葉郡の住民の生活や、特定復興再生拠点区域の整備事業から生じる廃棄物等の処分先の確保が課題。
- 双葉郡の復興を加速化するため、双葉地方広域市町村圏組合が所有する管理型処分場「クリーンセンターふたば」をこれらの廃棄物の最終処分場として使用すること等について、同組合、福島県及び環境省との間で合意し、2019年8月5日に、基本協定を締結。
- 環境省において、2020年12月から、約2年後の供用再開に向けた整備を行っているところ。

最終処分する廃棄物の種類

- ① 双葉郡内の住民の日常生活に伴って生じたごみその他の一般廃棄物
- ② 双葉郡内において実施されるインフラ整備等の各種事業活動に伴って生じた産業廃棄物及び事業系一般廃棄物
- ③ 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う被災建物等解体撤去等に伴って生じた特定廃棄物



現況写真(2019年7月24日撮影)

【クリーンセンターふたばの現状】

- 設置場所 大熊町小入野(こいりの)
- 設置者 双葉地方広域市町村圏組合
- 東日本大震災前まで、産業廃棄物最終処分場及び双葉郡の一般廃棄物最終処分場として活用されてきた。東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により休止している。

関係5県の指定廃棄物に関する状況

<長期管理施設の設置>

- 5県(宮城・栃木・千葉・茨城・群馬)において、国が各県内での「長期管理施設」の新設を検討。
- うち3県(宮城・栃木・千葉)について、2014~2015年に候補地を提案したが、そのための詳細調査の実施の目的が立っていない。今後の方針を県ごとによく相談する必要。

<各県ごとの課題を段階的に解決するための取組>

- 長期管理施設の設置は進んでいないが、放射性物質を生活圏から段階的に遠ざけるための取組を実施。
 - ・ 指定廃棄物の約10倍の量がある低濃度の農林業系廃棄物の処理(宮城県) ・保管の強化(茨城県)
 - ・ 分散している保管場所の集約(栃木県) ※R3.10 那須塩原市で集約に向けた搬出作業開始
 - ・ 8,000Bq/kg以下に減衰した指定廃棄物の処理(関係全県で模索中)

※県名下部二〇二一年九月末時点の指定廃棄物保管量	2013 (H25)	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018~ (H30)
宮城県 (2,827.9t)	長期管理施設の選定 プロセスについて議論	長期管理施設の詳細 調査候補地を公表		まずは8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物から 処理することとし、2018年3月から処理を開始		
栃木県 (12,417.1t)				詳細調査の 実施に向けた 働きかけの継続	農家の保管する指定廃棄物の市町 単位での集約を検討・実施	
千葉県 (3,716.8t)				長期管理施設は設置せず、現地保管 継続・段階的処理 の方針を決定	一時保管場所での 保管強化対策の実施	
茨城県 (3,535.7t)						
群馬県 (1,187.0t)						

指定廃棄物の指定解除の仕組みについて

【 仕組み 】(放射性物質汚染対処特措法施行規則第14条の2)

平成28年4月28日 改正省令公布・施行

- 指定廃棄物が8,000Bq/kg以下となっている場合、環境大臣は、一時保管者や解除後の処理責任者（市町村又は排出事業者）と協議した上で、指定を解除することができる。


※ 協議が整わない場合、指定の解除は行わない。

- 指定解除後は、廃棄物処理法の処理基準等に基づき、一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は排出事業者の処理責任の下で必要な保管・処分を行う。

※ 指定解除後の廃棄物の処理が円滑に進むよう、8,000Bq/kg以下の廃棄物の安全性の説明等、環境省でも必要な技術的・財政的支援を行う。

【 実績 】

- 千葉県、山形県、宮城県、静岡県、岩手県、東京都、栃木県の7都県で計約2,000トン、56件の指定が解除されている。（2021年9月末時点）

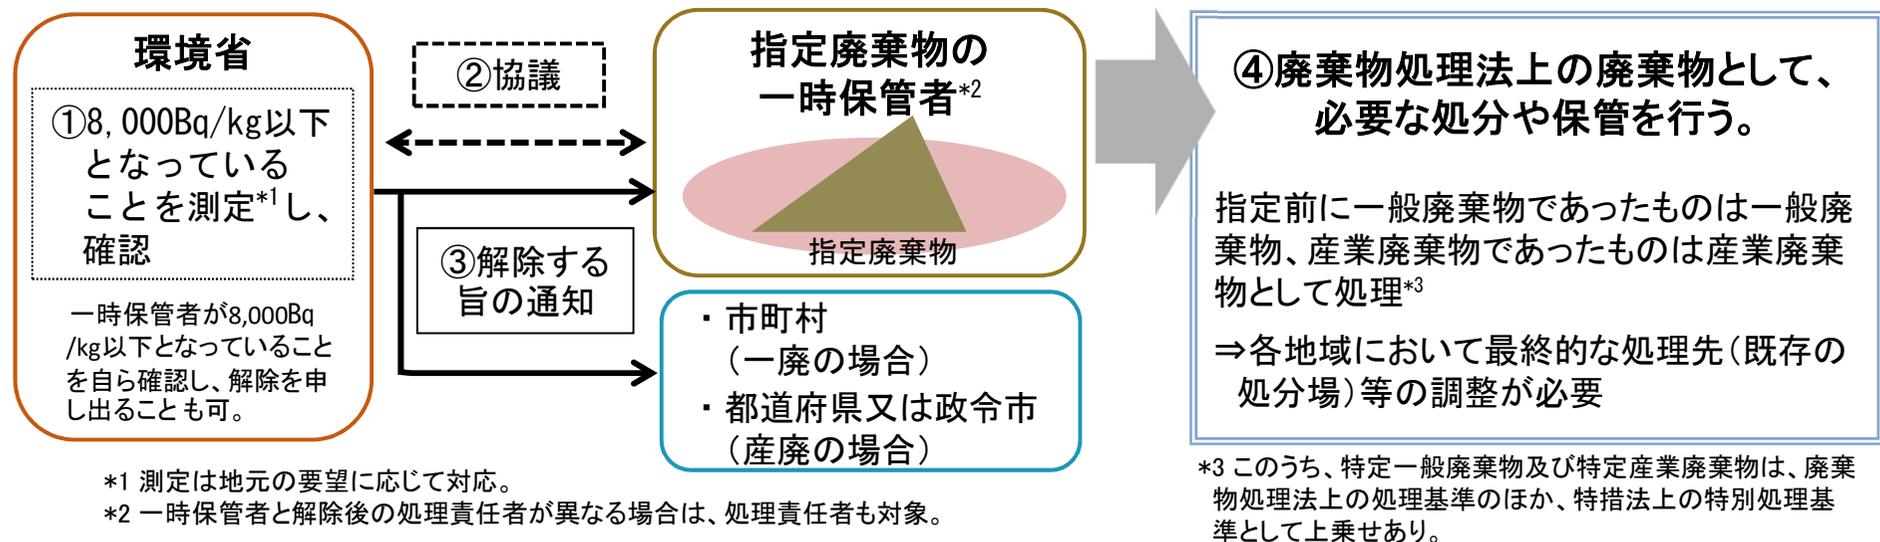

【目的】

従来、循環利用されていた稲わら、牧草等が放射性物質に汚染されたことにより、廃棄物となって大量に発生。

このうち、8,000Bq/kg以下のものは、廃棄物処理法に基づき市町村等が処理を行うこととしているが、その処理が進まないことから、やむを得ず農家の敷地等に一時保管されており問題化。また、このまま処理が進まないと、腐敗や火災の原因となることが懸念され、処理そのものが困難となるおそれ。

このため、当該廃棄物の処理に要する経費の一部を助成し、市町村等による処理を促進。

保管がひっ迫している 汚染廃棄物の例



稲わら



堆肥



牧草



きのこ原木

処理の
加速化

【事業の概要】

1 補助対象者

廃棄物の処理を行う市町村等（一部事務組合を含む。）

2 処理の対象となる汚染廃棄物

これまで循環利用されてきたが、事故由来放射性物質に汚染されたことで発生した8,000Bq/kg以下の可燃性一般廃棄物

3 事業実施期間

令和3年度

4 補助率

1/2(国)

※残りの地方負担額は震災復興特別交付税で全額措置

5 処理に必要な経費の例

廃棄物の処理に必要な一連の工程に係る経費を助成


- ① 処理計画の策定等に要する経費
- ② 地域住民への理解促進に要する経費（空間線量率測定費等）
- ③ 廃棄物の収集・運搬から処理・処分に要する経費（仮設焼却炉の設置等）

(5) ALPS処理水に係る海域モニタリングについて

ALPS処理水の海洋放出に関する海域モニタリング強化の取組について

新たにトリチウムに関する放出開始の前後における海域のモニタリングを実施する等、モニタリングを強化拡充する。

- モニタリング調整会議（議長：環境大臣）により、関係省庁が連携して、モニタリングを実施する。
- 専門家による新たな会議を立ち上げ、海域モニタリングの実施状況について確認・助言を得る。
- IAEAの協力を得て、分析機関間の相互比較を行うなどにより、分析能力の信頼性を確保する。

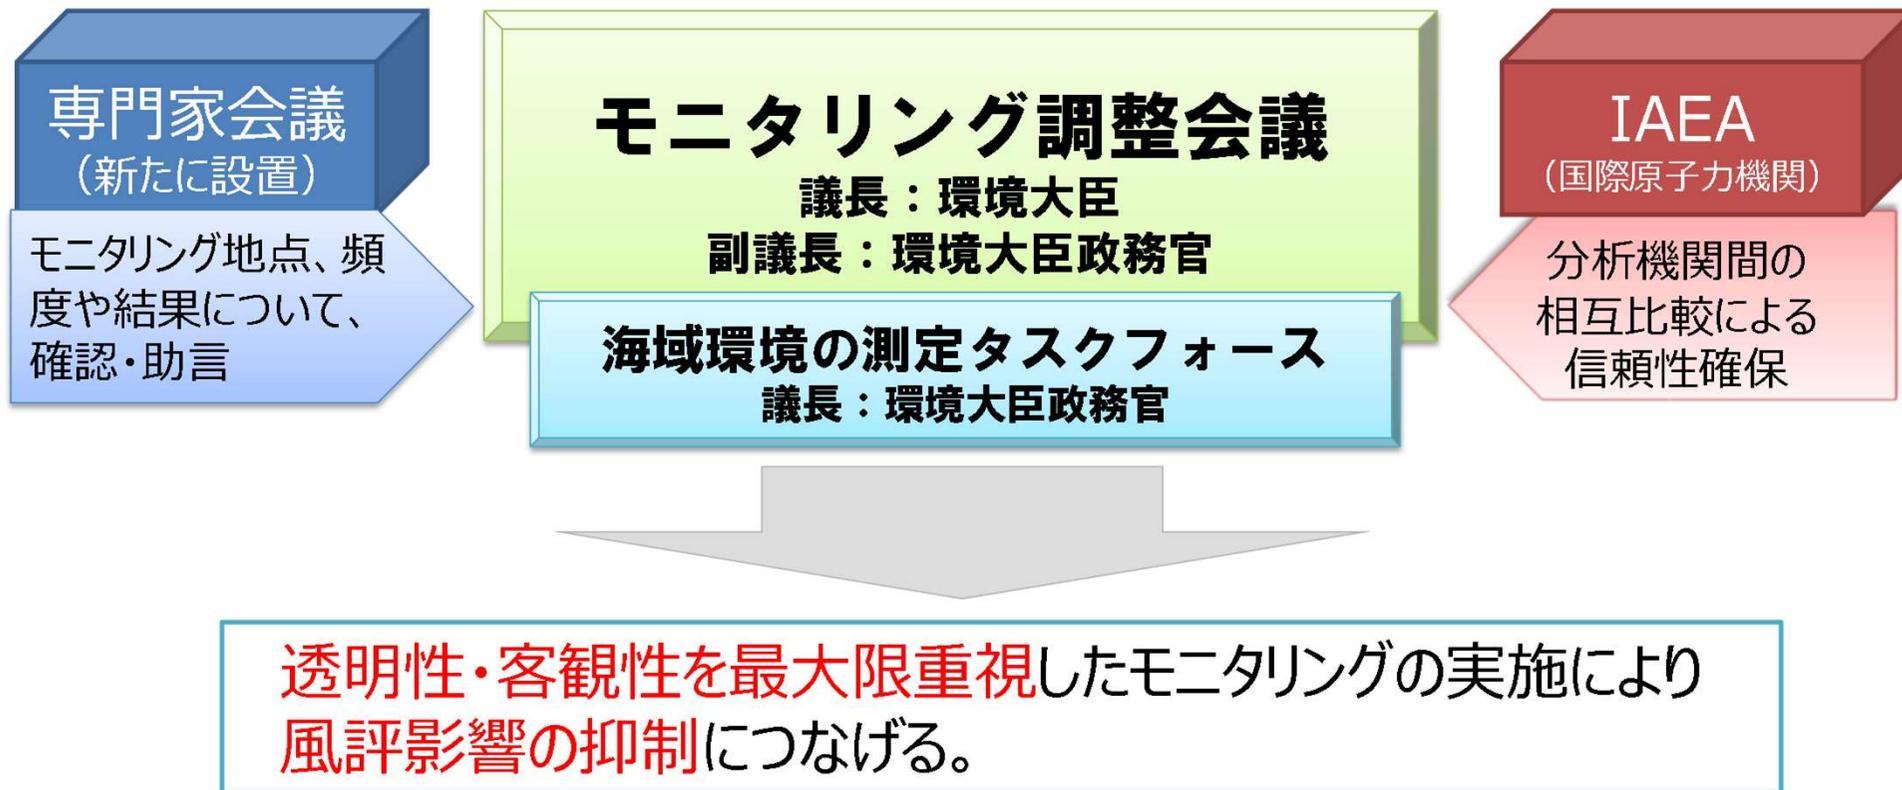

スケジュール

スケジュール (想定)

令和3年4月

基本方針決定

実行会議

・閣僚級会議
・風評影響抑制などを
確実に実施

モニタリング調整会議

専門家会議による確認・助言

海洋のモニタリングを実施

放出前からの
モニタリング

放出後の
モニタリング

IAEAの関与・協力

方針決定から
2年程度後

放出
開始

2. 放射線リスクコミュニケーションの取組について

放射線リスクコミュニケーション・情報発信

ぐぐるプロジェクト

- 放射線健康影響に関する課題を通じ、「学び・知をつむ“ぐ”」、「人・町・組織をつな“ぐ”」、「自分ごととしてつたわ“る”」ことにより、風評にまどわされない適正な判断力を養っていく「ぐぐるプロジェクト」を2021年7月に立ち上げ、正確な情報を全国に分かりやすく発信する取組を推進。
- 目標は、**2025年度までに**「現在の放射線被ばくで、次世代への健康影響が福島県民に起こる可能性が高い」と思っている方を（2020年度）**40%から20%へ減らす**こと。



出典：環境省令和2年度放射線の健康影響に関する情報発信実施業務 アンケート調査 より抜粋（2021年3月）



○ ラジエーションカレッジ



全国の大学でセミナー展開。学ぶ場だけでなく、発表の場として収録会を開催。

○ ぐぐるプロジェクト公式HP



<https://www.env.go.jp/chemi/rhm/portal/communicate/>



放射線相談員支援センター

- 福島県いわき市に「放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター」を設置。12市町村を中心に、相談員や自治体職員のリスキ活動に対する様々な支援を実施。



放射線の健康影響等に関する統一的な基礎資料

- 放射線に関する科学的知見や、関係省庁等の取組を掲載した「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」を作成し、毎年度更新。研修等での配布のほか、放射線の健康影響に関する情報ポータルサイト（Web）にて公開。




3. 鳥獣害対策の取組について

帰還困難区域等におけるイノシシ等対策について

- **環境省では、帰還困難区域内等の野生鳥獣が帰還準備や帰還後の生活及び地域経済の再建に支障となっていることを踏まえ、帰還される方々の安心の確保等を図ることを目的に、2013（平成25）年度から帰還困難区域等におけるイノシシ等の捕獲事業を実施。**
- 2021（令和3）年度のイノシシの捕獲頭数は2022年1月末時点で1,347頭となっており、前年度と比べて減少。帰還困難区域内におけるイノシシの自動撮影カメラでの撮影頻度は、**2019（平成31）年度以降、減少傾向にあることから、イノシシの出没が減少**しているものと考えられる。アライグマ、ハクビシンについても、捕獲頭数は減少傾向である。


イノシシ等の捕獲状況

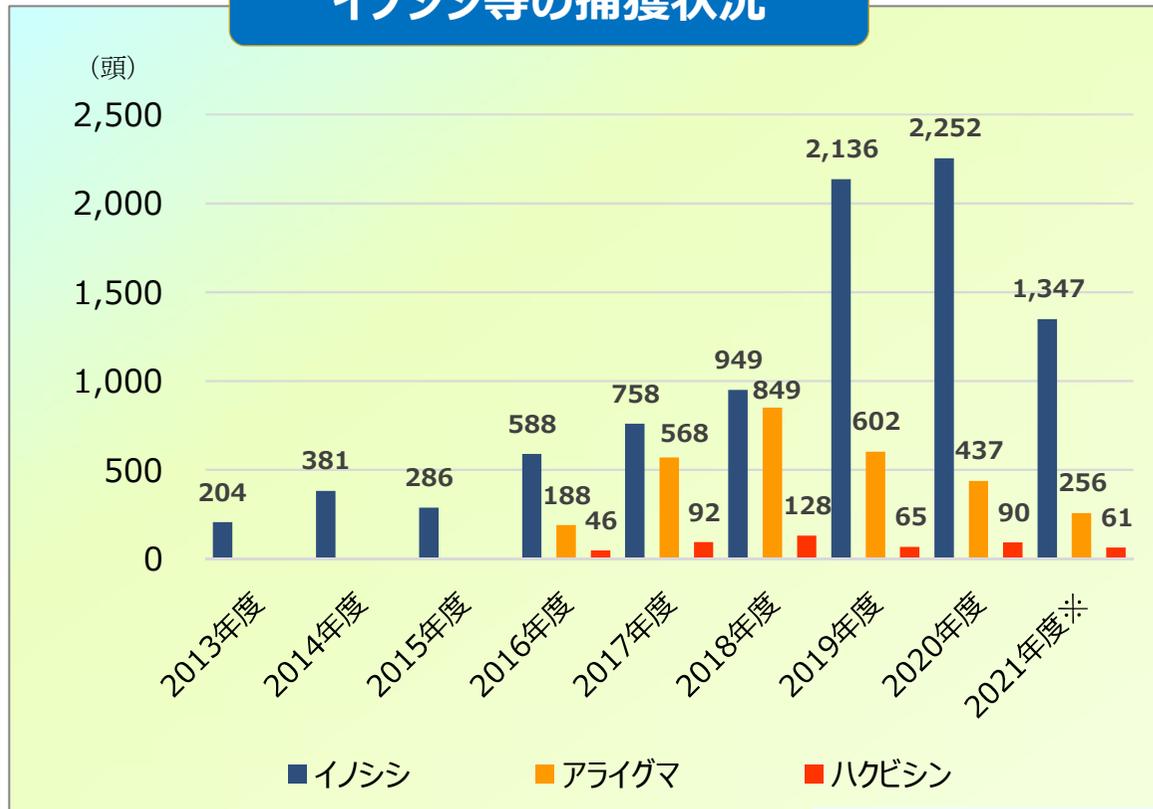

※2022年1月末現在

イノシシの出没状況（撮影頻度）

野生鳥獣の生息状況を把握するために、帰還困難区域の調査可能な範囲において、2 kmメッシュごとに自動撮影カメラを配備し、経年変化をモニタリングしている。
調査は年3回（1回の調査は1月程度）実施。

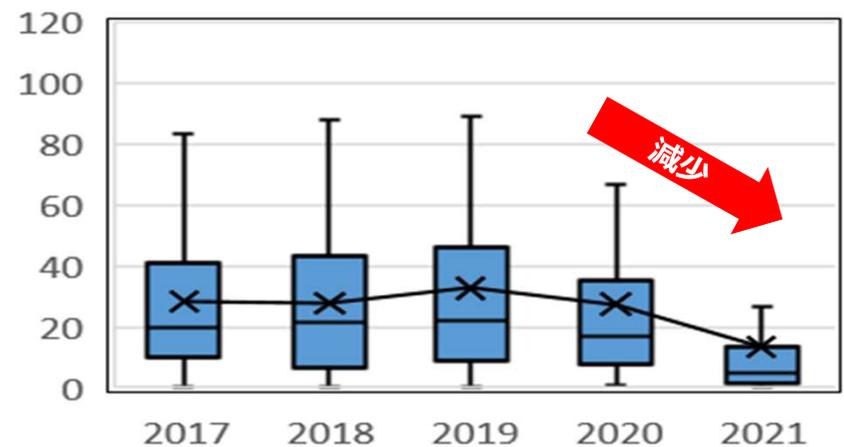

イノシシの撮影頻度 = イノシシ撮影枚数 / カメラ稼働日 × 100

×は平均値を示す。
令和3年度は第1、2回調査データのみを使用。

4. 未来志向の取組について

福島再生・未来志向プロジェクトの進捗状況

「福島」×「脱炭素・資源循環・自然共生」



- 福島県知事からの要望を受けて、2018年8月に「福島再生・未来志向プロジェクト」を始動。
- 2021年4月には、環境再生・資源循環局に「福島再生・未来志向プロジェクト推進室を設置するなど、体制を強化しながら取組を推進。

基本的な考え方

- 福島県内の地元のニーズに応え、環境再生の取組のみならず、脱炭素・資源循環・自然共生という環境の視点から地域の強みを創造・再発見し、福島復興の新たなステージに向けた取組を推進。
- 環境省事業を効果的に組み合わせ、また、放射線健康不安に対するリスクコミュニケーションや広報・情報発信を通じて地元に取り添いつつ、分野横断的な政策パッケージを戦略的に展開。

産業創生への支援

<かなりわいの復興>

不燃性廃棄物再資源化施設



- 廃棄物リサイクル産業の創生を支援。地元企業等の共同事業として不燃性廃棄物の再資源化施設が、2020年10月に竣工した



使用済み太陽光パネルの先端リサイクル技術

- 先端リサイクル技術の実証や事業化に向けた取組を推進（使用済み太陽光パネルのリサイクルや、人工知能を使った自動選別システム等）

ふくしまグリーン復興への支援

<自然資源活用による復興>

- 2019年4月に福島県と共同で策定した「ふくしまグリーン復興構想」に基づき、国立・国定公園の魅力向上等の取組を推進。
- 2021年には磐梯朝日国立公園満喫プロジェクト推進に向けた地域協議会を立ち上げ、取組を推進。



尾瀬沼ビジターセンター完成予想図

脱炭素まちづくりへの支援

<暮らしの復興>

- 脱炭素社会の実現に向けた新たなまちづくりを支援。
- 2021年度は、8件の実現可能性調査に加え、福島県での自立・分散エネルギーシステム導入に関して計画策定と設備導入に関して財政的支援の開始。



ソーラーシェアリングイメージ図



地域活性化への支援

<リスコミ・情報発信による復興>

- 特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」等を活用し、環境再生事業に対する放射線リスクコミュニケーションを実施
- 環境省が所管する新宿御苑等において福島県の環境再生の状況を発信。福島県の環境再生の状況をパネル、動画等で紹介。



活動の様子

福島県との連携協力協定

- 環境省では、これまでの環境再生事業や「福島再生・未来志向プロジェクト」の取組を踏まえ、2020年8月に、福島県と「福島の復興に向けた未来志向の環境施策推進に関する連携協力協定」を締結し、福島県と環境省が更なる連携の下で取組を進めることとした。
- 環境省として、単一の地方公共団体と包括的な協定を締結するのは初めてのこと。

連携協力協定の概要

基本的な考え方

- 福島グリーン復興、福島県の再生可能エネルギー先駆け地を目指した取組等、環境面での福島の特長を活かした施策を福島県と環境省が連携して展開
- ウイズ・コロナ、ポスト・コロナ社会を意識して取組むことで、新しい日常生活、新しい地域のあり方を福島から発信

ふくしまグリーン復興構想等の着実な推進

- 自然資源活用による交流人口の拡大

復興と共に進める地球温暖化対策の推進

- 浜通り地区をはじめとする復興の加速と地球温暖化対策への寄与

ポスト・コロナ社会を先取りした環境施策の推進

- 自立・分散・ネットワーク型の社会形成の実現

本協定の効果的な実施に関する共通的事項

- シンポジウムなどを開催し、福島復興の姿を福島県内外へ発信

連携協力協定フォローアップ会議の開催

(2021年6月10日実施)

- 本協定のフォローアップ会議として、2020年度の実施状況、2021年度の実施予定などについて、福島県、環境省双方から資料に沿って説明を行った後、これまでの課題やそれを踏まえた今後の取組方針などを中心に意見交換を実施。
- ワークーション推進に向けた整備や脱炭素への取組など、本協定に基づいた取組を今後とも連携して実施していく。



フォローアップ会議の様子

未来志向の新たな環境施策の展開 ～ふくしま、次の10年へ～

- 第2期復興・創生期間を迎え、福島県が本格的な復興・再生に向けたステージへ歩みを進めるこの機会に、環境省としてなすべき取組を、「ふくしま、次の10年へ」と題して取りまとめ。
- 東日本大震災から10年の節目を越え、福島の本格的な復興・再生という次のステージに向け、環境省と福島県の連携協力協定やふくしまグリーン復興構想の下、脱炭素・風評対策・風化対策の3つの視点から、未来志向の新たな環境施策を連携して取り組む。

2021年度の取組例

脱炭素×復興まちづくりの先進地創出

■ FS事業

- 大熊町における榊栽培を想定した営農型太陽光発電に係るFS

対象地域：大熊町

事業概要：太陽光パネル下で、榊栽培を長期（15年間以上を想定）にわたり営農するための栽培システム構築など、営農型太陽光発電に係る調査及び検討を行う。



■ 計画・導入補助事業

- 榊葉町屋内体育施設太陽光発電設備導入計画事業

対象地域：榊葉町

事業概要：ならはスカイアリーナへの太陽光発電、蓄電設備導入に向けた基本設計等



福島・環境再生の記憶の継承

■ チャレンジ・アワード

福島にゆかりのある学生を対象とし、福島のこれまでとこれからのアイデアや想いを募集。



環境先進地域へのリブランディング

■ 国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）での発信

東日本大震災とそれに伴う東京電力福島第一原子力発電所事故からの復興と脱炭素への取組について世界に発信し、福島に対する風評払拭を図ることを目的に、国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）にて、福島県とともに福島県内で実施している脱炭素の取組を紹介。



■ FUKUSHIMA NEXT

福島において、環境の視点から地域の強みを創造・再発見する未来志向の取組を実施する方々を県内外の様々なメディアで発信。



各町との取組

- 東日本大震災とそれに伴う東京電力福島第一 原子力発電所事故からの復興と脱炭素への取組 について世界に発信し、福島に対する風評払拭を図ることを目的に、国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）にて、大熊町・浪江町の脱炭素の取組を紹介。
- また、福島県にある郡山女子大学短期大学部地域創成学科とともに双葉町由来の生地を活用したリメイク品のデザインに取り組むプロジェクトを推進。

COP26で大熊町・浪江町の脱炭素の取組の紹介



■セミナーでの様子

2階のセミナー会場では、開始前に約30席が満席となり、1階の同時配信モニター前では立ち見を含む10人ほどの方が視聴。国籍問わず多くの方にご来聴いただき、福島の復興と脱炭素に向けた取組について正しい理解を促進。



左：大熊町長プレゼンの様子 右：浪江町長プレゼンの様子

■特設サイトにて各町の取組を英語にて紹介

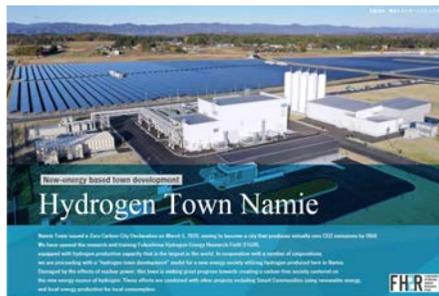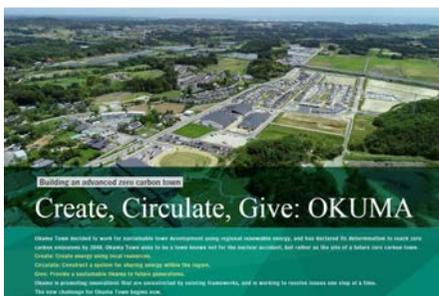

▲サイトはこちらから
<http://shiteihaiki.env.go.jp/cop26/>

双葉町「環境再生」デザインプロジェクト

双葉町立双葉北小学校及び南小学校でそれぞれ使用していた紅白幕とカーテンを双葉町より譲り受け、来秋双葉町中野地区復興産業拠点に進出するフレックスジャパン株式会社の協力を得てリメイク品のデザイン及び制作を実施。
 リメイク品は双葉町の成人式にて新成人皆様に贈呈しました。



▲本プロジェクトに参加した郡山女子大学短期大学部の学生（双葉北小学校体育館にて撮影）
