

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

今年度の輸送対象物量は 400 万 m³ としています。安全を第一に除去土壌等の輸送を行っていきます。

(1) 除去土壌等の輸送の進捗状況 (5/31 時点)

今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約 400 万 m ³	約 43.6 万 m ³	約 10.9 %

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約 1,400 万 m ³	約 306.1 万 m ³	約 21.9 %

(2) 令和元年度の進捗状況


○ 除去土壌等の輸送

(5月31日までの搬出実績)

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 (m ³)	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定量 (m ³)	今年度の 搬出済量(m ³)	累積 搬出済量 (m ³)
浜通り	いわき市	50,000	10,000	13,857	69,796
	相馬市	39,000		15,280	48,541
	南相馬市	274,000	8,000	18,372	164,073
	広野町	67,000		10,175	55,629
	楡葉町	149,000		23,797	143,867
	富岡町	406,000		36,497	247,771
	川内村	96,000		7,380	66,071
	大熊町	342,000		23,680	207,785
	双葉町	312,000		0	152,573
	浪江町	353,000		32,921	198,652
	葛尾村	168,000		21,331	120,157
	飯舘村	395,000		24,346	203,371
中通り	福島市	198,000	78,000	44,388	161,348
	郡山市	153,000		30,053	228,465
	白河市	63,000		11,243	79,378
	須賀川市	53,000		8,396	57,401
	二本松市	113,000		17,276	115,540
	田村市	101,000		10,826	89,443
	伊達市	85,000	4,000	12,146	95,499
	本宮市	58,000		5,370	51,323
	桑折町	43,000		10,894	49,167
	国見町	39,000		9,502	38,017
	川俣町	163,000		28,558	112,150

	大玉村	26,000		3,244	28,505
	天栄村	34,000		665	26,993
	西郷村	125,000		10,540	90,723
	泉崎村	18,000		2,873	30,146
	矢吹町	10,000		2,865	24,566
	三春町	47,000		0	44,674
	合計	3,980,000	100,000	436,475	3,060,904

2019年度の中間貯蔵施設への搬出状況(累計)

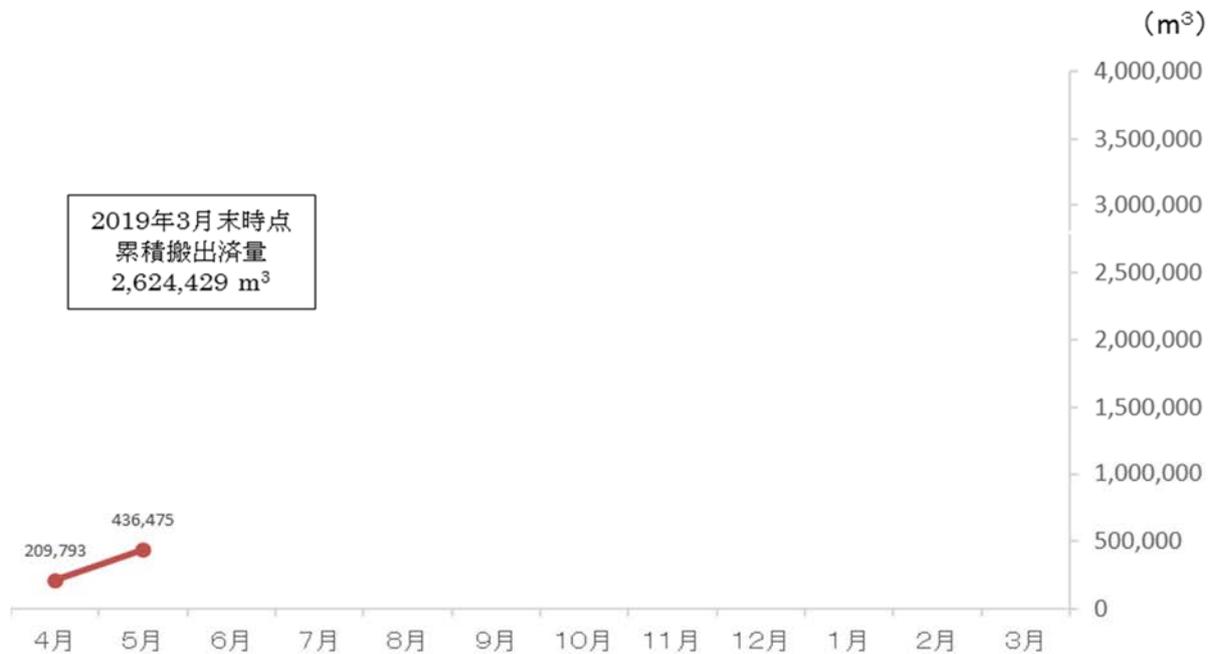

- ※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1 m³と換算しています。
- ※ 輸送対象物量1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬出済量（国直轄除染市町村：2019年2月末、市町村除染市町村：2018年12月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2019年2月末）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2019年2月末時点、市町村除染：2018年12月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2019年2月末時点、市町村除染：2018年12月末時点））の合計量。
- ※ 輸送対象物量1,400万m³には、10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
- ※ 累積搬出済量の合計値には、2019年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
