

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

令和元年 7 月 5 日

今年度の輸送対象物量は 400 万 m³としています。安全を第一に除去土壌等の輸送を行っていきます。

(1) 除去土壌等の輸送の進捗状況 (6/29 時点)

今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約 400 万 m ³	約 70.9 万 m ³	約 17.7 %

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約 1,400 万 m ³	約 333.3 万 m ³	約 23.8 %

(2) 令和元年度の進捗状況


○ 除去土壌等の輸送

(6 月 29 日までの搬出実績)

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 (m ³)	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定量 (m ³)	今年度の 搬出済量(m ³)	累積 搬出済量 (m ³)
浜通り	いわき市	50,000	10,000	18,764	74,703
	相馬市	39,000		16,146	49,407
	南相馬市	274,000	8,000	28,269	173,970
	広野町	67,000		16,937	62,391
	檜葉町	149,000		42,127	162,197
	富岡町	406,000		58,890	270,164
	川内村	96,000		10,931	69,622
	大熊町	342,000		35,836	219,941
	双葉町	312,000		0	152,573
	浪江町	353,000		62,287	228,018
	葛尾村	168,000		32,670	131,496
飯舘村	395,000		41,538	220,563	
中通り	福島市	198,000	78,000	67,637	184,597
	郡山市	153,000		54,941	253,353
	白河市	63,000		19,773	87,908
	須賀川市	53,000		11,666	60,671
	二本松市	113,000		22,091	120,355
	田村市	101,000		19,538	98,155
	伊達市	85,000	4,000	19,153	102,506
	本宮市	58,000		12,504	58,457
	桑折町	43,000		13,912	52,185

	国見町	39,000		12,053	40,568
	川俣町	163,000		44,511	128,103
	大玉村	26,000		6,424	31,685
	天栄村	34,000		2,253	28,581
	西郷村	125,000		25,433	105,616
	泉崎村	18,000		5,082	32,355
	矢吹町	10,000		3,997	25,698
	三春町	47,000		3,615	48,289
	合計	3,980,000	100,000	708,978	※3,333,407

2019年度の中間貯蔵施設への搬出状況(累計)

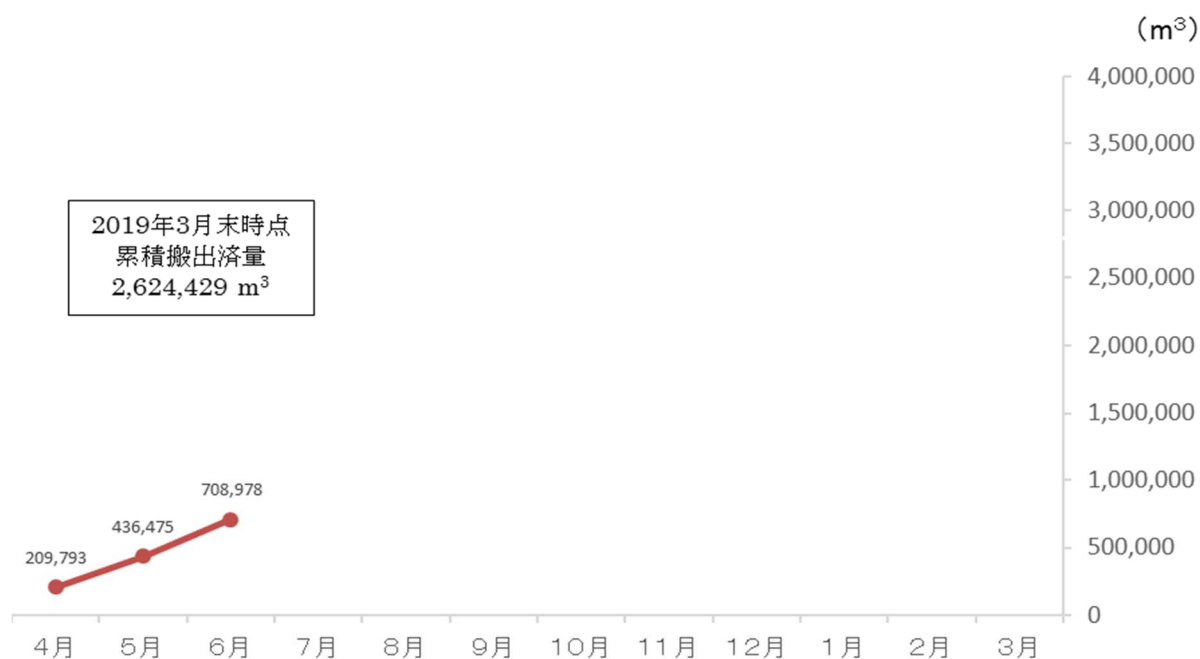

- ※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m³と換算しています。
- ※ 輸送対象物量1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬出済量（国直轄除染市町村：2019年2月末、市町村除染市町村：2018年12月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2019年2月末）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2019年2月末時点、市町村除染：2018年12月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2019年2月末時点、市町村除染：2018年12月末時点））の合計量。
- ※ 輸送対象物量1,400万m³には、10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
- ※ 累積搬出済量の合計値には、2019年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
