

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

令和元年 8 月 7 日

今年度の輸送対象物量は 400 万 m³としています。安全を第一に除去土壌等の輸送を行っていきます。

(1) 除去土壌等の輸送の進捗状況 (7/31 時点)

今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約 400 万 m ³	約 104.5 万 m ³	約 26.1 %

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約 1,400 万 m ³	約 366.9 万 m ³	約 26.2 %

(2) 令和元年度の進捗状況


○ 除去土壌等の輸送

(7 月 31 日までの搬出実績)

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 (m ³)	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定量 (m ³)	今年度の 搬出済量(m ³)	累積 搬出済量 (m ³)
浜通り	いわき市	50,000	10,000	20,631	76,570
	相馬市	39,000		18,209	51,470
	南相馬市	274,000	8,000	45,702	191,403
	広野町	67,000		24,558	70,012
	檜葉町	149,000		56,626	176,696
	富岡町	406,000		87,651	298,925
	川内村	96,000		15,711	74,402
	大熊町	342,000		52,986	237,091
	双葉町	312,000		0	152,573
	浪江町	353,000		107,554	273,285
	葛尾村	168,000		52,000	150,826
飯舘村	395,000		66,091	245,116	
中通り	福島市	198,000	78,000	94,761	211,721
	郡山市	153,000		82,442	280,854
	白河市	63,000		29,066	97,201
	須賀川市	53,000		15,867	64,872
	二本松市	113,000		27,048	125,313
	田村市	101,000		27,112	105,729
	伊達市	85,000	4,000	26,229	109,582
	本宮市	58,000		20,517	66,470
	桑折町	43,000		17,221	55,494

	国見町	39,000		13,769	42,284
	川俣町	163,000		62,015	145,607
	大玉村	26,000		8,821	34,082
	天栄村	34,000		5,503	31,831
	西郷村	125,000		43,766	123,949
	泉崎村	18,000		7,445	34,718
	矢吹町	10,000		6,921	28,622
	三春町	47,000		8,754	53,428
	合計	3,980,000	100,000	1,044,976	※3,669,406

2019年度の中間貯蔵施設への搬出状況(累計)

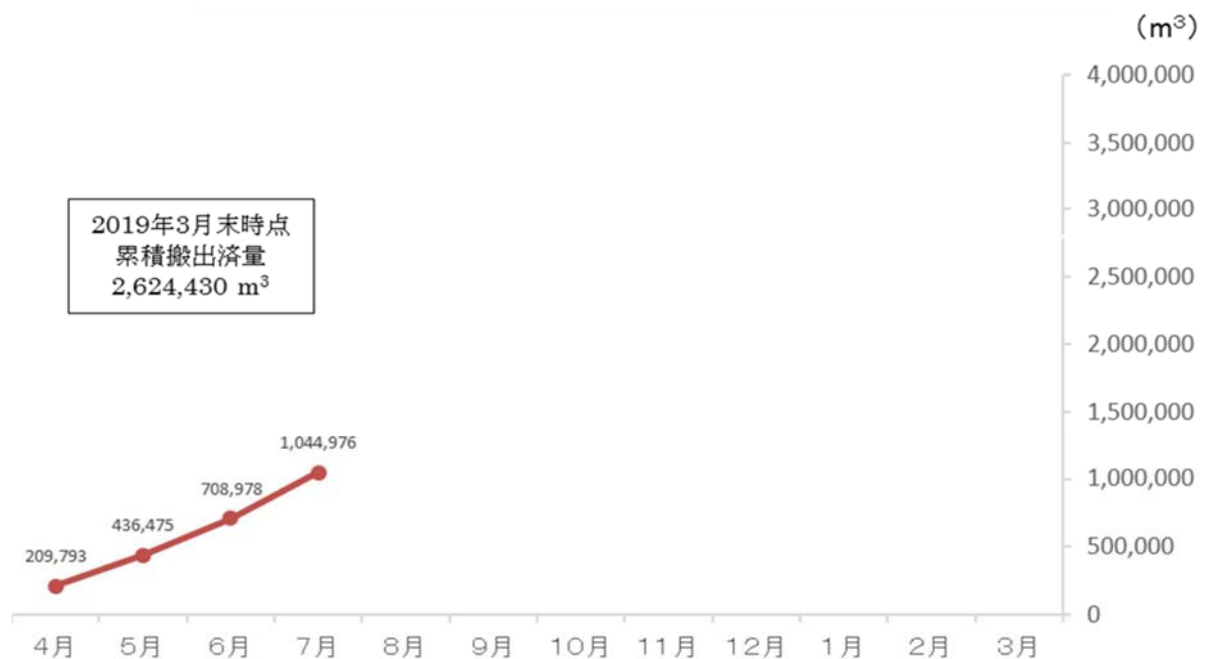

- ※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1 m³と換算しています。
- ※ 輸送対象物量1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬出済量（国直轄除染市町村：2019年2月末、市町村除染市町村：2018年12月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2019年2月末）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2019年2月末時点、市町村除染：2018年12月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2019年2月末時点、市町村除染：2018年12月末時点））の合計量。
- ※ 輸送対象物量1,400万m³には、10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
- ※ 累積搬出済量の合計値には、2019年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
