

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

令和元年9月6日

今年度の輸送対象物量は400万 m^3 としています。安全を第一に除去土壌等の輸送を行っていきます。

(1) 除去土壌等の輸送の進捗状況 (8/31 時点)

今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約400万 m^3	約131.4万 m^3	約32.9%

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約1,400万 m^3	約393.9万 m^3	約28.1%

(2) 令和元年度の進捗状況


○ 除去土壌等の輸送

(8月31日までの搬出実績)

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 (m^3)	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定量 (m^3)	今年度の 搬出済量(m^3)	累積 搬出済量 (m^3)
浜通り	いわき市	50,000	10,000	24,810	80,749
	相馬市	39,000		21,248	54,509
	南相馬市	274,000	8,000	59,704	205,405
	広野町	67,000		30,298	75,752
	檜葉町	149,000		67,429	187,499
	富岡町	406,000		111,380	322,654
	川内村	96,000		18,088	76,779
	大熊町	342,000		68,187	252,292
	双葉町	312,000		1,535	154,108
	浪江町	353,000		137,174	302,905
	葛尾村	168,000		67,487	166,313
飯舘村	395,000		89,729	268,754	
中通り	福島市	198,000	78,000	118,866	235,826
	郡山市	153,000		105,265	303,677
	白河市	63,000		35,566	103,701
	須賀川市	53,000		18,070	67,075
	二本松市	113,000		32,482	130,747
	田村市	101,000		33,814	112,431
	伊達市	85,000	4,000	33,156	116,509
	本宮市	58,000		26,077	72,030
	桑折町	43,000		18,705	56,978

	国見町	39,000		15,012	43,527
	川俣町	163,000		71,214	154,806
	大玉村	26,000		10,844	36,105
	天栄村	34,000		8,980	35,308
	西郷村	125,000		58,005	138,188
	泉崎村	18,000		8,425	35,698
	矢吹町	10,000		9,161	30,862
	三春町	47,000		14,024	58,698
	合計	3,980,000	100,000	1,314,735	※3,939,165

2019年度の中間貯蔵施設への搬出状況(累計)

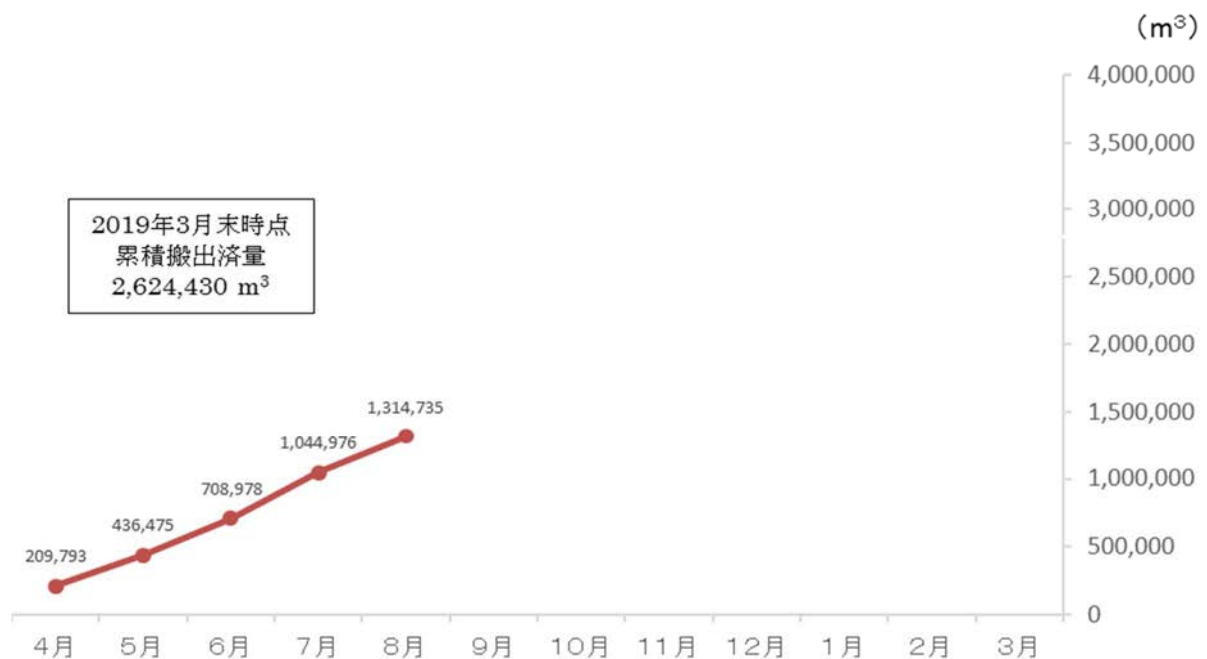

- ※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1 m³と換算しています。
- ※ 輸送対象物量1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬出済量（国直轄除染市町村：2019年5月末、市町村除染市町村：2019年3月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2019年2月末）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2019年5月末時点、市町村除染：2019年3月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2019年5月末時点、市町村除染：2019年3月末時点））の合計量。
- ※ 輸送対象物量1,400万m³には、10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
- ※ 累積搬出済量の合計値には、2019年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
