

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

令和元年11月8日

今年度の輸送対象物量は400万 m^3 としています。安全を第一に除去土壌等の輸送を行っていきます。

(1) 除去土壌等の輸送の進捗状況 (10/31 時点)

今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約400万 m^3	約198.4万 m^3	約49.6%

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約1,400万 m^3	約460.9万 m^3	約32.9%

(2) 令和元年度の進捗状況


○ 除去土壌等の輸送

(10月31日までの搬出実績)

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 (m^3)	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定量 (m^3)	今年度の 搬出済量(m^3)	累積 搬出済量 (m^3)
浜通り	いわき市	50,000	10,000	39,024	94,963
	相馬市	39,000		25,672	58,933
	南相馬市	274,000	8,000	110,274	255,975
	広野町	67,000		42,952	88,406
	檜葉町	149,000		84,655	204,725
	富岡町	406,000		176,271	387,545
	川内村	96,000		25,497	84,188
	大熊町	342,000		102,481	286,586
	双葉町	312,000		14,171	166,744
	浪江町	353,000		224,924	390,655
	葛尾村	168,000		107,519	206,345
飯舘村	395,000		147,579	326,604	
中通り	福島市	198,000	78,000	177,771	294,734
	郡山市	153,000		156,787	355,199
	白河市	63,000		46,976	115,111
	須賀川市	53,000		23,048	72,053
	二本松市	113,000		54,427	152,692
	田村市	101,000		40,834	119,451
	伊達市	85,000	4,000	46,350	129,703
	本宮市	58,000		36,881	82,834
	桑折町	43,000		23,965	62,238

	国見町	39,000		18,125	46,640
	川俣町	163,000		96,427	180,019
	大玉村	26,000		11,456	36,717
	天栄村	34,000		17,214	43,542
	西郷村	125,000		87,485	167,668
	泉崎村	18,000		12,444	39,717
	矢吹町	10,000		10,559	32,260
	三春町	47,000		22,407	67,081
	合計	3,980,000	100,000	1,984,175	※4,608,608

2019年度の中間貯蔵施設への搬出状況(累計)

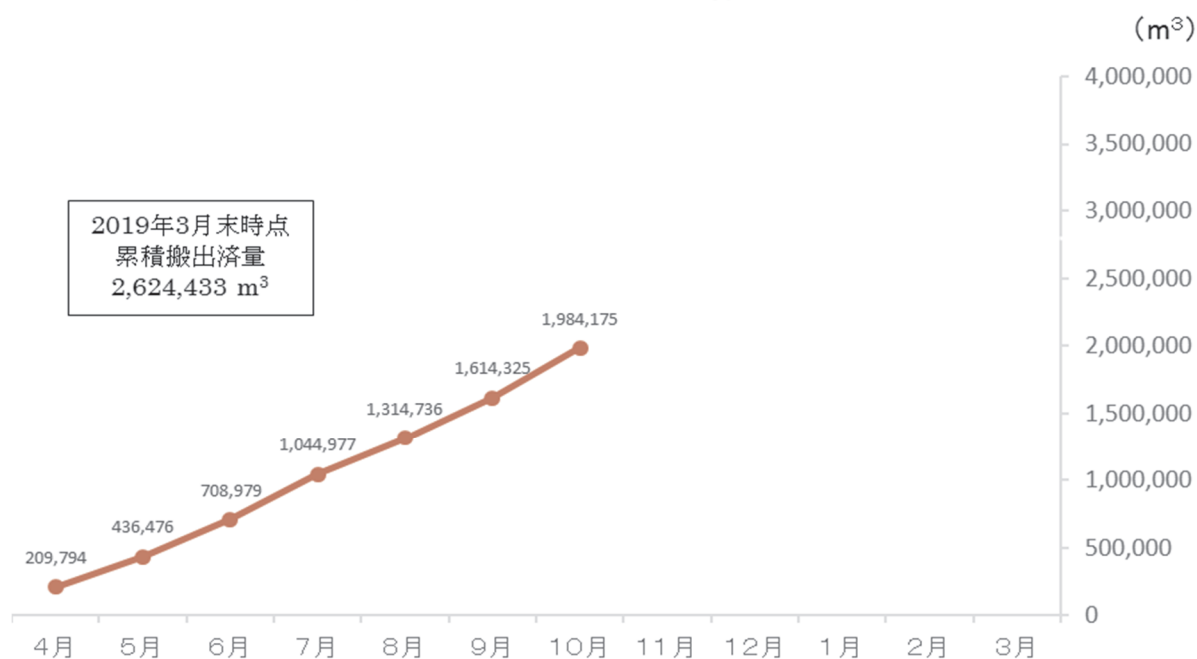

※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1 m³と換算しています。

※ 輸送対象物量1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬出済量(国直轄除染市町村：2019年8月末、市町村除染市町村：2019年6月末時点、両者混在市町村(南相馬市、川内村、田村市、川俣町)：2019年8月末)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染：2019年8月末時点、市町村除染：2019年6月末時点)及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量(国直轄除染：2019年8月末時点、市町村除染：2019年6月末時点))の合計量(2019年10月末集計)。10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した(発生することが見込まれる)除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2019年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
