

# 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

令和2年2月7日

今年度の輸送対象物量は400万 $\text{m}^3$ としています。安全を第一に除去土壌等の輸送を行っていきます。

## (1) 除去土壌等の輸送の進捗状況（1/31時点）

今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約400万 $\text{m}^3$	約319.5万 $\text{m}^3$	約79.9%

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約1,400万 $\text{m}^3$	約582.0万 $\text{m}^3$	約41.6%


## (2) 令和元年度の進捗状況


### ○ 除去土壌等の輸送

（1月31日までの搬出実績）

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 ( $\text{m}^3$ )	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定量 ( $\text{m}^3$ )	今年度の 搬出済量( $\text{m}^3$ )	累積 搬出済量 ( $\text{m}^3$ )
浜通り	いわき市	50,000	10,000	66,341	122,280
	相馬市	39,000		31,298	64,558
	南相馬市	274,000	8,000	269,744	415,445
	広野町	67,000		60,068	105,522
	檜葉町	149,000		113,538	233,608
	富岡町	406,000		302,330	513,604
	川内村	96,000		53,756	112,447
	大熊町	342,000		169,433	353,538
	双葉町	312,000		47,642	200,215
	浪江町	353,000		416,636	582,367
	葛尾村	168,000		149,084	247,910
	飯舘村	395,000		264,234	443,259
中通り	福島市	198,000	78,000	250,818	367,781
	郡山市	153,000		223,714	422,126
	白河市	63,000		57,624	125,759
	須賀川市	53,000		34,073	83,078
	二本松市	113,000		93,824	192,089
	田村市	101,000		65,237	143,854
	伊達市	85,000	4,000	71,277	154,630
	本宮市	58,000		48,403	94,356

	桑折町	43,000		39,368	77,641
	国見町	39,000		18,735	47,250
	川俣町	163,000		128,283	211,875
	大玉村	26,000		16,690	41,951
	天栄村	34,000		33,157	59,485
	西郷村	125,000		115,296	195,479
	泉崎村	18,000		17,575	44,848
	矢吹町	10,000		10,559	32,260
	三春町	47,000		26,347	71,021
	合計	3,980,000	100,000	3,195,083	※5,819,516

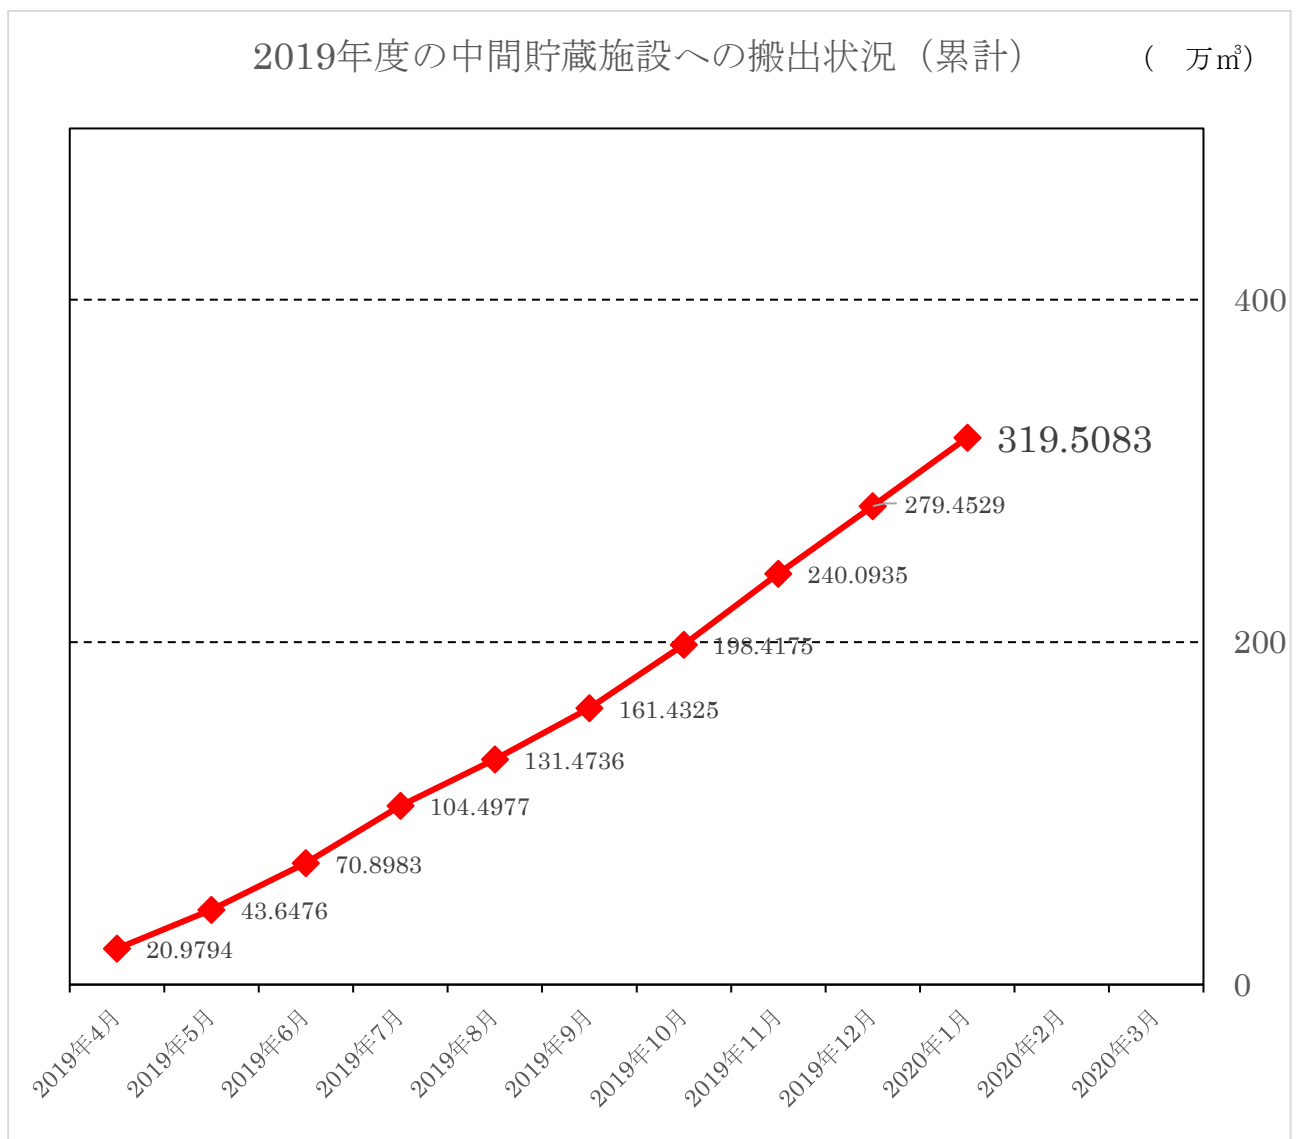

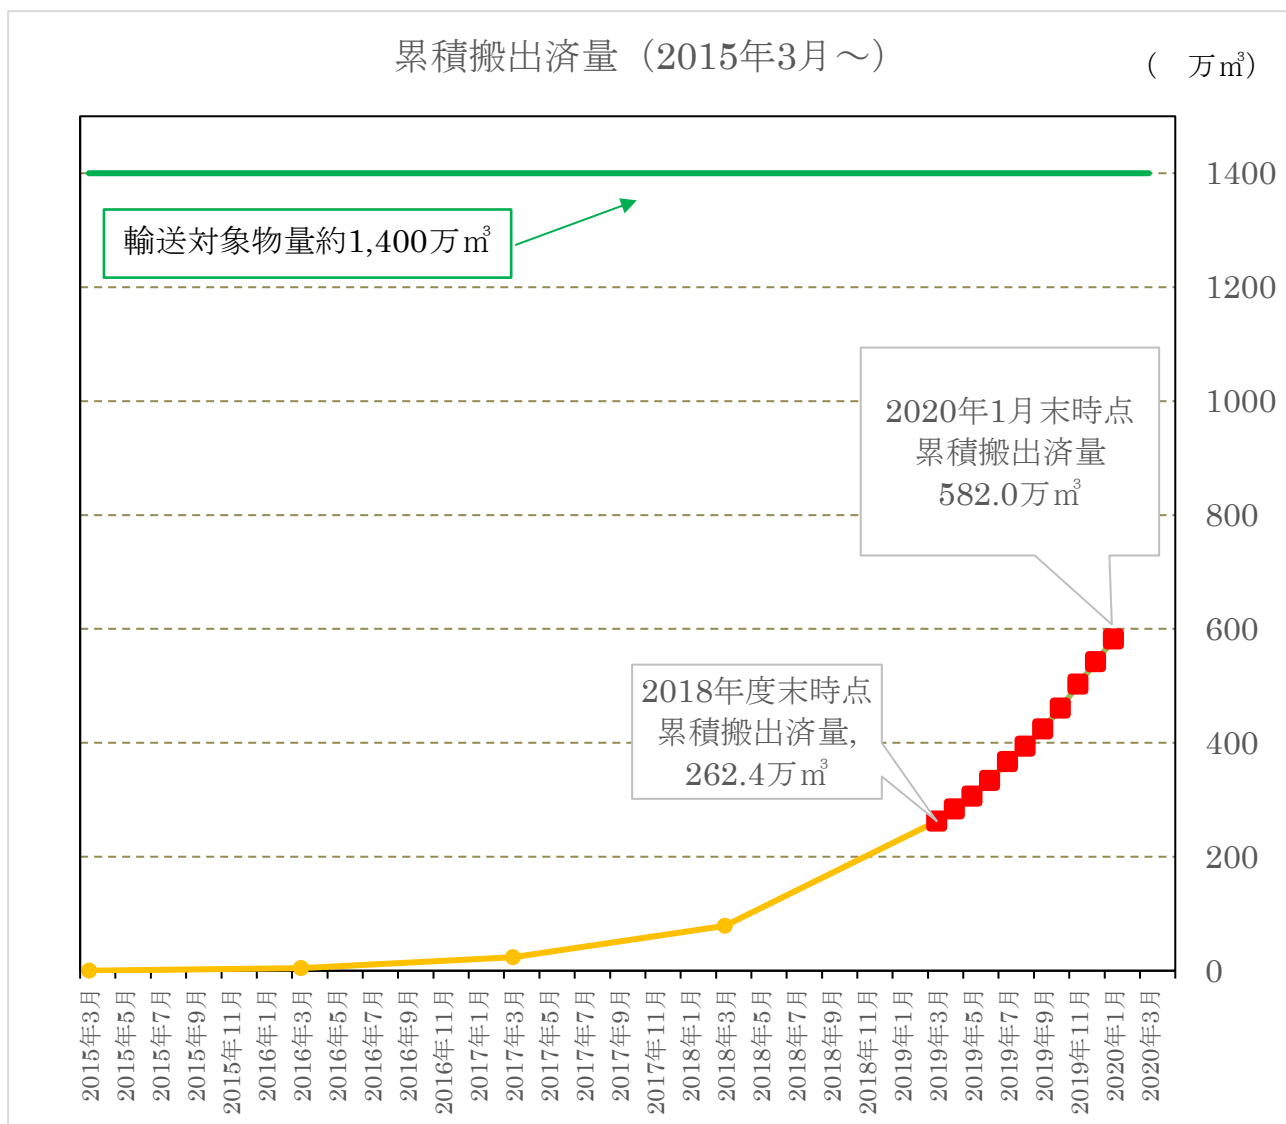

※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1  $\text{m}^3$ と換算しています。

※ 輸送対象物量 1,400 万 $\text{m}^3$ は、中間貯蔵施設への搬入済量（国直轄除染市町村：2019年8月末時点、市町村除染市町村：2019年6月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2019年8月末時点）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2019年8月末時点、市町村除染：2019年6月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2019年8月末時点、市町村除染：2019年6月末時点））の合計量（2019年10月末集計）。

10 万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2019年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
