

データでみる福島再生

最近の動き

○特定復興再生拠点区域の進捗状況

- ・3月末時点で、以下の工事を新規に契約しました。
 - 令和元年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去及び除染等工事（その3）
 - 令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去及び除染等工事（その3）
 - 令和元年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去及び除染等工事（その3）

○福島県内の除染仮置場等の状況

- ・仮置場等総数1,345箇所のうち、637箇所ですべて除去土壌等を保管中、708箇所ですべて搬出が完了し、411箇所の仮置場で原状回復が完了しました。

○中間貯蔵施設の整備の現状

- ・3月27日、大熊④工区の土壌貯蔵施設への貯蔵を開始しました。
これにより、整備していた全ての受入・分別施設（9施設）と土壌貯蔵施設（8工区）が運転を開始したことになります。
- ・3月30日、双葉町仮設灰処理施設（その1）で発生したばいじんを、双葉1工区の廃棄物貯蔵施設に搬入し、貯蔵を開始しました。
これにより、中間貯蔵施設における除去土壌と廃棄物の処理・貯蔵の全工程で運転を開始したことになります。
- ・除去土壌の分別処理を行い、3月末時点で、約348万 m^3 （輸送量ベース）の土壌を土壌貯蔵施設に貯蔵しました。

○中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

- ・2019年度は中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送を約405.9万 m^3 行いました。
輸送開始(2015年3月)からの累積は約668.3万 m^3 （全体の約48%）です。

○中間貯蔵施設用地の状況

- ・用地取得については、3月末時点で契約者数1,759人、面積約1,164haについて契約しております。

○国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

- ・災害廃棄物等の仮置場への搬入については、2月末時点で、約259万トンの搬入を完了しました（うち、約46万トンが焼却処理済、約161万トンが再生利用済）。
- ・被災家屋等について、2月末時点で、約16,600件の解体撤去申請を受付済みであり、約14,400件を解体撤去済みです。

○**国直轄による対策地域内における仮設焼却施設の設置状況**

- ・ 2月末時点で、約111万トン（除染廃棄物を含む）を各仮設焼却施設で処理しました。

○**特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況**

- ・ 3月末時点で、117,671袋を特定廃棄物埋立処分施設へ搬入しました。


○**放射線に関するリスクコミュニケーション活動状況**

- ・ 環境再生プラザで4件、その他で4件の活動を実施しました。

特定復興再生拠点区域整備の進捗状況

概要

- ・将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内について、福島復興再生特別措置法の改正(2017.5)により、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となりました。
- ・市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備（除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成し、同計画を内閣総理大臣が認定します。復興再生に向けて計画を推進しているところです（計画認定から5年を目途に避難指示解除を目指すこととなっています）。
- ・これまでに、以下6町村の計画が認定され、全ての町村において家屋等の解体・除染等を実施中です。
- ・令和2年3月に双葉町の一部（双葉駅周辺）、大熊町の一部（大野駅周辺）、富岡町の一部（夜ノ森駅周辺）で避難指示が解除されました。

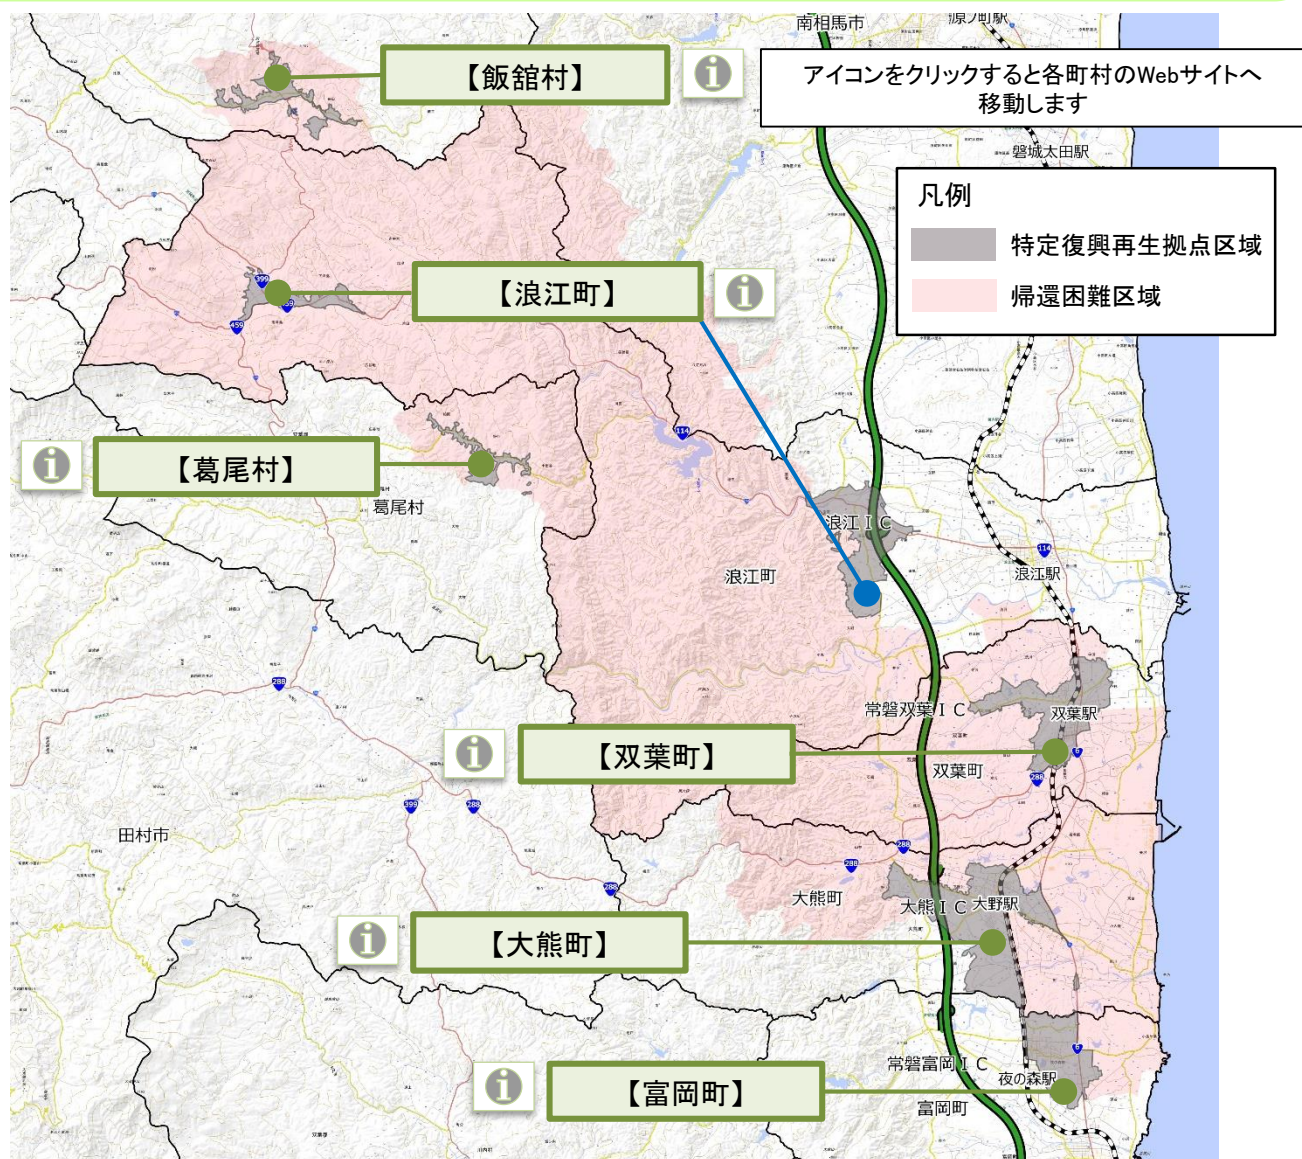

- ・特定復興再生拠点区域における家屋等の解体・除染等工事の発注状況は以下のとおりです。

	解体	除染	着工	工事中の主な地区
双葉町 (2017.9.15認定、 約555ha)	904件	約 260ha	2017. 12.25	双葉駅周辺、復興シンボル 軸、その他拠点区域全域
大熊町 (2017.11.10認定、 約860ha)	1,195件	約 630ha	2018. 3.9	大野駅周辺、下野上地区、 その他拠点区域全域
浪江町 (2017.12.22認定、 約661ha)	280件	約 410ha	2018. 5.30	室原、末森、津島地区
富岡町 (2018.3.9認定、 約390ha)	642件	約 230ha	2018. 7.6	夜の森駅周辺、その他拠点 区域全域
飯舘村 (2018.4.20認定、 約186ha)	72件	約 120ha	2018. 9.28	長泥地区
葛尾村 (2018.5.11認定、 約95ha)	33件	全域	2018. 11.20	野行地区

※解体件数、除染面積については、先行実施分を含みます。

※解体については、特定復興再生拠点区域全域で実施中です。


※土壌等の除染等の措置については、特定復興再生拠点計画、関係法令及び除染関係ガイドラインに従って、避難指示解除に必要な範囲を行います。

福島県内の除染仮置場等の状況

概要

- ・ 除染で取り除いた除去土壌等は、仮置場等の一時的な保管場所で適正に管理しています。
- ・ 保管をしている除去土壌等は、中間貯蔵施設又は仮設焼却施設等へ搬出し、搬出が完了した仮置場については、順次、原状回復工事を行い、返地を実施しています。

● 仮置場での保管～搬出～原状回復～返地までの流れ

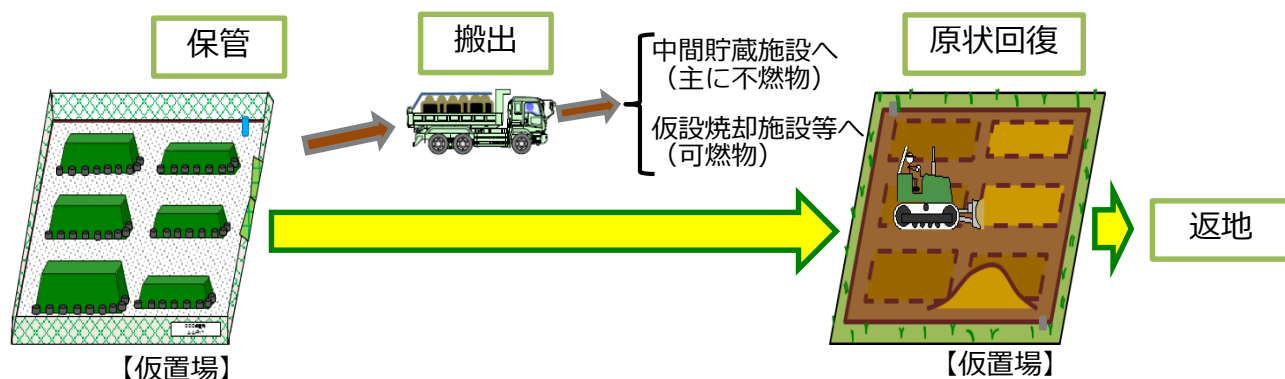

仮置場等の状況

・仮置場等総数1,345箇所のうち、637箇所で除去土壌等を保管中、708箇所で搬出が完了し、411箇所の仮置場で原状回復が完了しました。


直轄除染 2020年 2月末時点 市町村除染 2019年12月末時点	仮置場等の総数	うち 保管中	うち 搬出完了	うち 原状回復完了 (返地済み)
除染特別地域 (直轄除染)	329	158	171 (52%)	100 (30%)
汚染状況重点 調査地域等 (市町村除染)	1,016	479	537 (53%)	311 (31%)
合計	1,345	637	708 (53%)	411 (31%)

注1)
仮置場等：仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含みます。
注2)
保管中：除去土壌等が保管されている仮置場等を示します。
注3)
搬出完了：除去土壌等の搬出が完了した仮置場等を示します。
注4)
原状回復完了：原状回復等が完了した仮置場等を示します。
注5)
搬出完了及び原状回復完了の欄に記載の（ ）は、仮置場等の総数に対する割合を示します。

(出典) 汚染状況重点調査地域等（市町村除染）は、「市町村が設置する仮置場等の状況について（令和2年2月26日福島県生活環境部除染対策課 公表資料）」より環境省作成。

●保管中仮置場等の箇所数の推移


(2019年12月末時点)

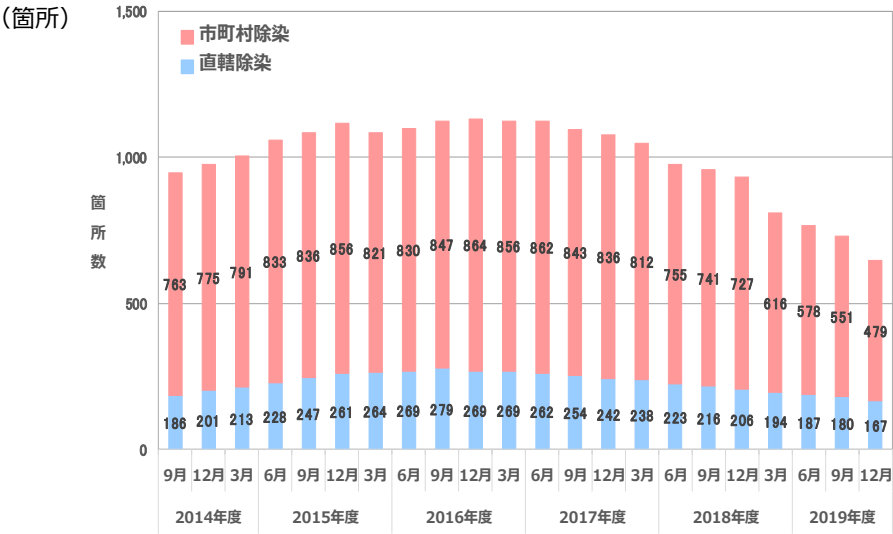

※仮置場の統合等により公表当時の数値とは異なります。
※市町村除染の2018年3月時点以前については、返地前の仮置場等数（「その他の仮置場」は除く）です。

●原状回復が完了した仮置場等の箇所数の推移

(2019年12月末時点)

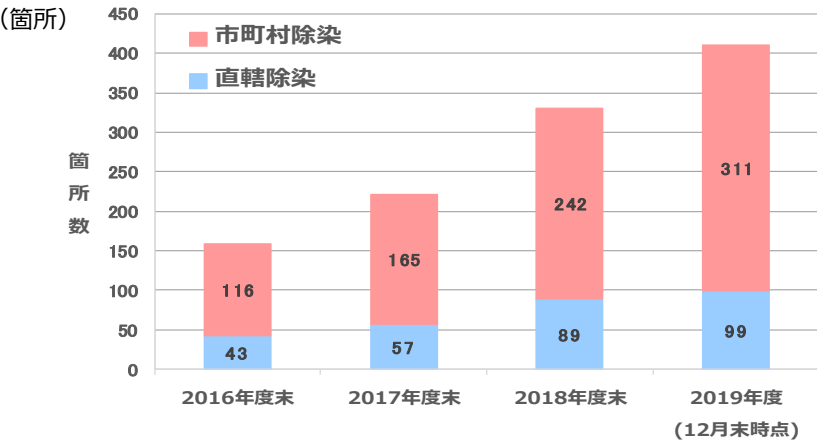


※2018年度までは各年度末(3月末時点)、2019年度は12月末時点の仮置場等の箇所数です。

除染特別地域（直轄除染）における仮置場等の状況

● 除染特別地域（直轄除染）の市町村別状況

市町村	仮置場等の総数	うち		
		保管中	搬出完了	原状回復完了
田村市	6	2	4	4
川内村	2	2	0	0
楢葉町	25	7	18	7
大熊町	18	5	13	11
川俣町	43	26	17	2
葛尾村	36	18	18	9
飯舘村	104	59	45	22
南相馬市	18	11	7	5
浪江町	44	18	26	21
富岡町	22	8	14	13
双葉町	11	2	9	6
合計	329	158	171	100

● 保管中仮置場等箇所数と保管物数の推移

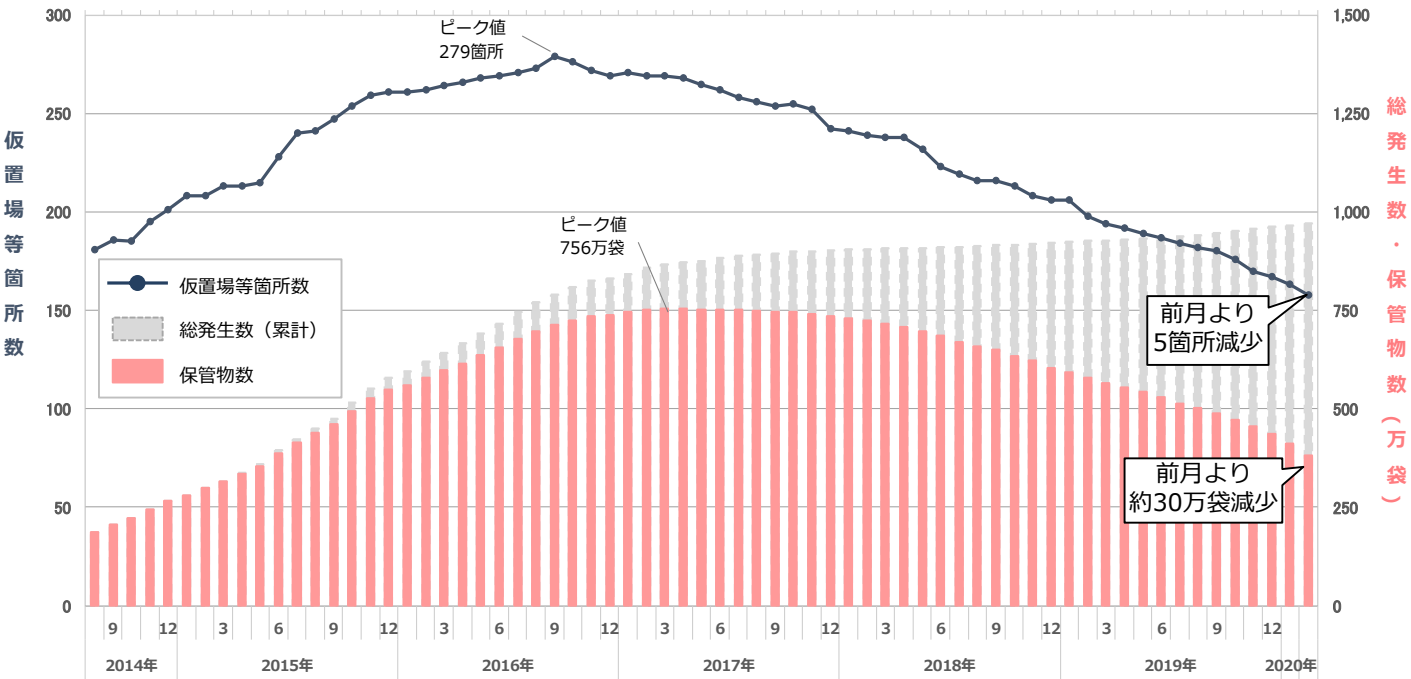

直近1年間の推移

	2019年										2020年	
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
仮置場等箇所数（箇所）	194	192	189	187	184	182	180	176	170	167	163	158
総発生数（累計）（万袋）	928	930	932	934	937	941	945	951	957	963	967	972
保管物数（万袋）	565	554	543	530	514	502	489	472	455	436	412	383

注1) 仮置場等箇所数：除去土壌等を保管している仮置場等の箇所数を示します。

注2) 保管物数：仮置場等で保管している数で、単位は「袋」で1袋当たりの保管物の体積は、おおむね1m³です。（ただし、保管物の体積減少により、1袋が1m³より小さくなる場合もあります）。

注3) 除去土壌等の総発生数約972万袋の内訳は、保管物数約383万袋、搬出済み数約589万袋です。（うち仮設焼却炉への搬出は約262万袋、中間貯蔵施設等への搬出は約327万袋）

※数値は四捨五入して表記しているため、合計値は表示上の数字の合計と一致するとは限りません。

<参考>

汚染状況重点調査地域等（市町村除染）における仮置場等の状況

方部	市町村	仮置場等の 総数	うち 保管中	うち 搬出完了	うち 返地済み
県北	福島市	45	41	4	1
	二本松市	353	162	191	181
	伊達市	121	55	66	13
	本宮市	26	20	6	1
	桑折町	38	15	23	6
	国見町	11	5	6	0
	川俣町	22	11	11	0
	大玉村	13	2	11	7
県中	郡山市	30	29	1	1
	須賀川市	84	55	29	29
	田村市	97	17	80	2
	鏡石町	4	0	4	3
	天栄村	14	2	12	3
	石川町	1	0	1	1
	玉川村	1	0	1	1
	平田村	1	0	1	1
	浅川町	0	0	0	0
	古殿町	1	0	1	0
	三春町	6	6	0	0
	小野町	3	0	3	3
県南	白河市	11	2	9	9
	西郷村	3	2	1	0
	泉崎村	6	2	4	0
	中島村	1	0	1	0
	矢吹町	4	0	4	1
	棚倉町	12	0	12	10
	矢祭町※	0	0	0	0
	埴町※	1	0	1	1
会津	鮫川村	1	0	1	1
	会津若松市	1	0	1	1
	猪苗代町	6	0	6	6
	会津坂下町※	1	0	1	1
	湯川村※	1	0	1	1
	柳津町※	0	0	0	0
	三島町※	0	0	0	0
	昭和村※	1	0	1	1
南会津	会津美里町※	1	0	1	0
	下郷町	1	0	1	1
相双	南会津町	0	0	0	0
	新地町	1	0	1	1
	相馬市	5	3	2	0
	南相馬市	37	32	5	2
	広野町	1	1	0	0
いわき	川内村	9	7	2	0
	いわき市	41	10	31	22
合計		1,016	479	537	311


（2019年12月末時点）

- 注1) 「市町村が設置する仮置場等の状況について（令和2年2月26日 福島県生活環境部除染対策課 公表資料）」より環境省が作成しています。
- 注2) 網掛けは、汚染状況重点調査地域に指定されていない市町村です。「※」は、指定解除された市町村です。
- 注3) 保管中 : 除去土壌等が保管されている仮置場等を示します。
- 注4) 搬出完了 : 除去土壌等の搬出が完了した仮置場等を示します。
- 注5) 返地済み : 原状回復等が完了し、所有者へ返地した仮置場等を示します。

中間貯蔵施設の整備の現状

概要

- 放射性物質汚染対処特措法等に基づき、福島県内の除染に伴い発生した放射性物質を含む土壌・廃棄物及び福島県内に保管されている10万ベクレル/kgを超える焼却灰等を最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として中間貯蔵施設を整備しています。
- 2016年11月に、大熊町・双葉町に受入・分別施設、土壌貯蔵施設の整備に着手しました。
- 2017年6月に除去土壌等の分別処理を開始し、2017年10月には土壌貯蔵施設への分別した土壌の貯蔵を開始しました（大熊町では2017年10月、双葉町では2017年12月から除去土壌の貯蔵開始）。
- 2020年3月27日、大熊④工区の土壌貯蔵施設への貯蔵を開始しました。
これにより、整備していた全ての受入・分別施設（9施設）と土壌貯蔵施設（8工区）が運転を開始したことになります。
- 2020年3月30日、双葉町仮設灰処理施設（その1）で発生したばいじんを、双葉1工区の廃棄物貯蔵施設に搬入し、貯蔵を開始しました。
これにより、中間貯蔵施設における除去土壌と廃棄物の処理・貯蔵の全工程で運転を開始したことになります。

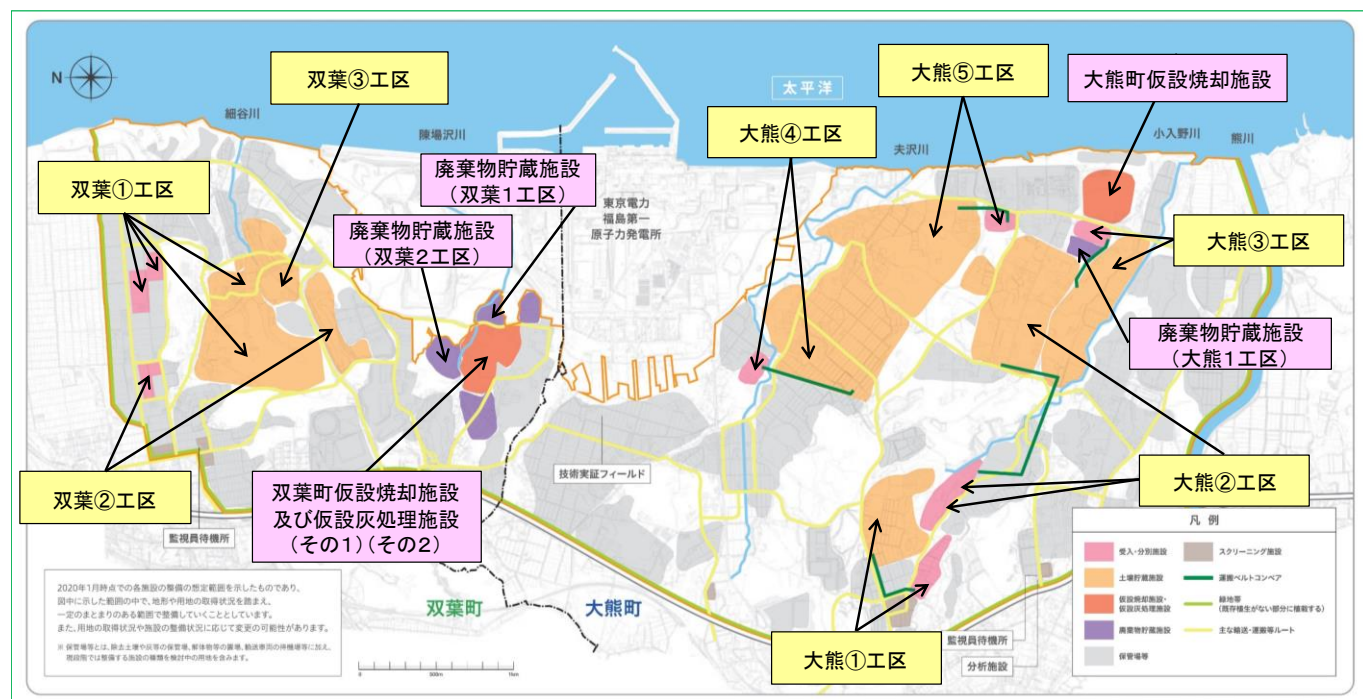

・除去土壌の分別処理を行い、3月末時点で、約348万 m^3 （輸送量ベース）の土壌を土壌貯蔵施設に貯蔵しました。

工区	大熊①工区	大熊②工区	大熊③工区	大熊④工区	大熊⑤工区	双葉①工区	双葉②工区	双葉③工区
受入・分別施設数※1	1	2	1	1	1	2	1	－
貯蔵容量※2	約100万 m^3	約330万 m^3	約210万 m^3	約140万 m^3	約200万 m^3	約140万 m^3	約90万 m^3	約80万 m^3
貯蔵量※2	51.9万 m^3	128.3万 m^3	53.0万 m^3	0.4万 m^3	48.4万 m^3	33.4万 m^3	28.7万 m^3	3.6万 m^3
着工	2017年9月着工	2016年11月着工	2017年11月着工	2018年10月着工	2018年10月着工	2016年11月着工	2018年1月着工	2018年9月着工
受入・分別施設スケジュール	2018年7月運転開始	2017年8月 2018年7月 運転開始	2018年7月 運転開始	2019年8月 運転開始	2019年8月 運転開始	2017年6月 2018年9月 運転開始	2019年2月 運転開始	(なし)
土壌貯蔵施設スケジュール	2018年7月 運転開始	2017年10月 運転開始	2018年10月 運転開始	2020年3月 運転開始	2019年4月 運転開始	2017年12月 運転開始	2019年5月 運転開始	2019年12月 運転開始
受注者	鹿島JV	清水JV	大林JV	清水JV	大林JV	前田JV	大成JV	安藤・間JV

大熊①工区



大熊②工区



大熊③工区



大熊④工区



大熊⑤工区



双葉①工区



双葉②工区



双葉③工区

(受入・分別施設は整備していない)



左の写真が受入・分別施設、右の写真が土壌貯蔵施設

※1 発注時の1施設当たりの処理能力は140t/時。双葉③工区は、受入・分別施設を整備していません。

※2 貯蔵容量及び貯蔵量は、仮置場等からの輸送量ベース（1袋＝1 m^3 で換算）。貯蔵容量は、用地確保状況等により変更となる可能性があります。

仮設焼却施設及び仮設灰処理施設の整備状況

2020年3月31日時点

・2020年3月に双葉町仮設焼却施設及び仮設灰処理施設が処理を開始しました。

施設	大熊町	双葉町（その1）	双葉町（その2）
規模	・仮設焼却施設：200 t / 日 × 1 炉（ストーカ炉）	・仮設焼却施設：150 t / 日 × 1 炉（シャフト炉） ・仮設灰処理施設：75 t / 日 × 2 炉（表面熔融炉）	・仮設焼却施設：200 t / 日 × 1 炉（ストーカ炉） ・仮設灰処理施設：75 t / 日 × 2 炉（コークスベット式灰 熔融炉）
敷地面積	約5.0ha	約5.7ha	約5.7ha
着工	2016年7月伐採・造成開始	2018年6月伐採・造成開始	2018年6月伐採・造成開始
建設工事 スケジュール	2016年12月開始	2019年1月開始	2019年1月開始
処理 スケジュール	2018年2月処理開始	2020年3月処理開始	2020年3月処理開始
受注者	三菱・鹿島JV	新日鉄・クボタ・大林組・TPT JV	JFE・前田JV
外観			

廃棄物貯蔵施設の整備状況

2020年3月31日時点

・2020年3月の仮設焼却施設及び仮設灰処理施設の稼働に伴い、灰処理ばいじんの廃棄物貯蔵施設への貯蔵を開始しました。

工区	大熊1工区	双葉1工区	双葉2工区
建築構造	鉄骨鉄筋コンクリート造＋ 鉄骨造（2棟）	鉄筋コンクリート造＋鉄骨造 ＋鉄骨鉄筋コンクリート造（1棟）	鉄骨鉄筋コンクリート造＋ 鉄骨造（1棟）
貯蔵容量	29,280個	14,678個	約30,000個
敷地面積	約2.4ha	約2.2ha	約3.7ha
着工	2018年7月 造成開始 2018年12月 建築開始	2018年6月 造成開始 2018年11月 建築開始	2019年12月 造成開始 2019年12月 建築開始
貯蔵 スケジュール	2020年4月 貯蔵開始予定	2020年3月 貯蔵開始	未定
受注者	鹿島建設	大林組	鹿島建設
外観			

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

概要

- 安全を第一に除去土壌等の輸送を行っています。
- 2015年3月より除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を開始しました。
- 除去土壌等の仮置場からの中間貯蔵施設への輸送は10tダンプトラックを基本に実施しています。
- 輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施しています。




輸送車両の走行状況

中間貯蔵施設からゲートを通して
退域する輸送車両


除去土壌等の輸送の進捗状況

・2020年3月末時点で、累積約**668.3万³m**（全体の約**48%**）の除去土壌等を中間貯蔵施設へ輸送しました。

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約 1,400万³m	約 668.3万³m	約 48%

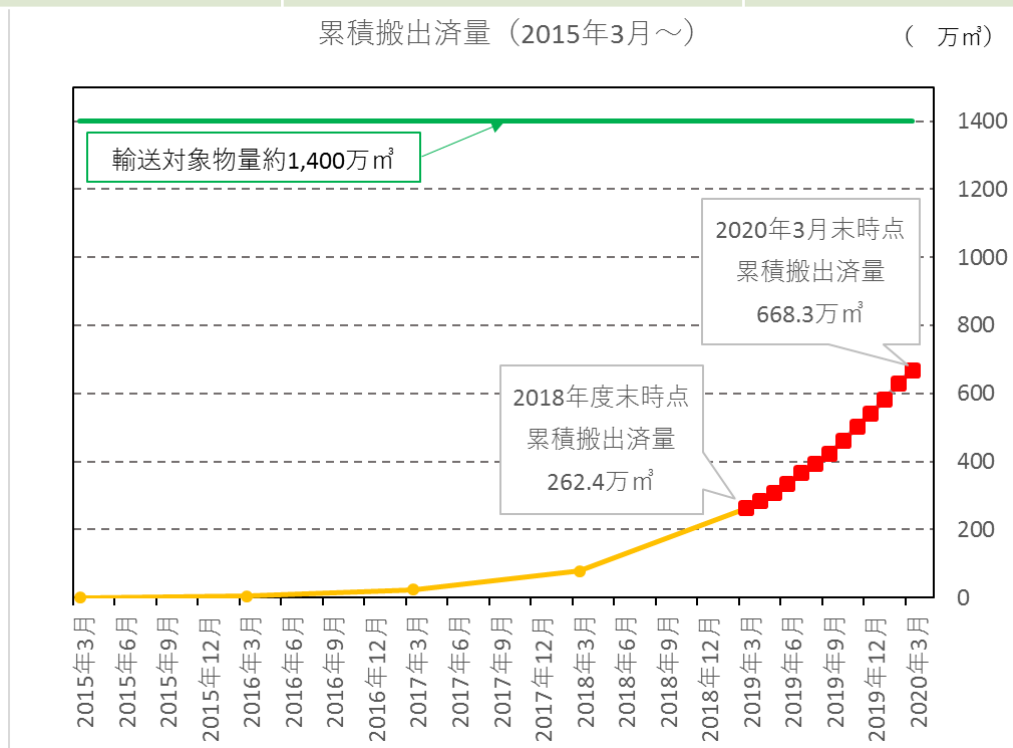

2019年度の輸送対象物量	2019年度搬出済量	2019年度進捗率
約 400万³m	約 405.9万³m	約 101.5%

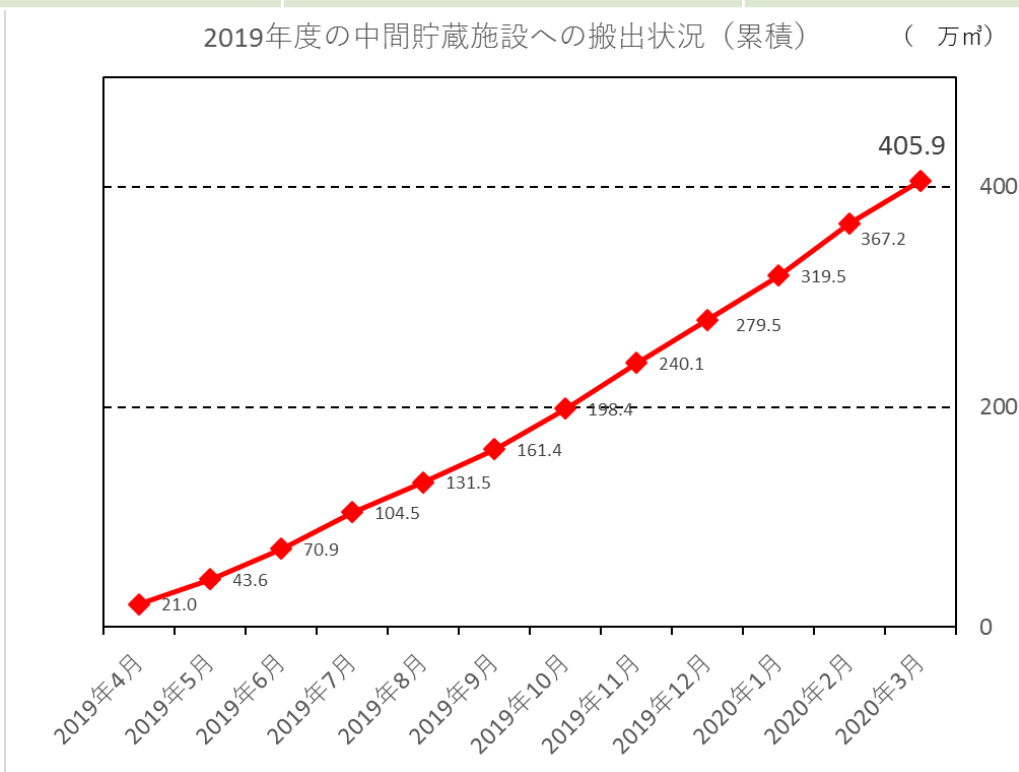

<参考>

各市町村ごとの除去土壌等の輸送

2020年3月31日時点の搬出実績

搬出市町村		2019年度 の搬出可能 量(m ³)	2019年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定 量(m ³)	2019年度の 搬出済量(m ³)	累積 搬出済量 (m ³)
浜通り	いわき市	50,000	10,000	72,221	128,160
	相馬市	39,000		31,535	64,796
	南相馬市	274,000	8,000	385,141	530,842
	広野町	67,000		66,112	111,566
	楡葉町	149,000		146,618	266,688
	富岡町	406,000		406,585	617,859
	川内村	96,000		74,357	133,048
	大熊町	342,000		222,249	406,354
	双葉町	312,000		80,784	233,357
	浪江町	353,000		606,804	772,535
	葛尾村	168,000		168,947	267,773
	飯舘村	395,000		332,357	511,382
中通り	福島市	198,000	78,000	289,924	406,887
	郡山市	153,000		250,883	449,295
	白河市	63,000		63,506	131,641
	須賀川市	53,000		48,005	97,010
	二本松市	113,000		117,818	216,083
	田村市	101,000		81,601	160,218
	伊達市	85,000	4,000	86,183	169,536
	本宮市	58,000		61,377	107,330
	桑折町	43,000		44,374	82,647
	国見町	39,000		18,735	47,250
	川俣町	163,000		152,101	235,693
	大玉村	26,000		19,718	44,979
	天栄村	34,000		33,653	59,981
	西郷村	125,000		142,630	222,813
	泉崎村	18,000		17,575	44,848
	矢吹町	10,000		10,559	32,260
	三春町	47,000		26,347	71,021
合計		3,980,000	100,000	4,058,699	※ 6,683,132

※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m³と換算しています。

※ 輸送対象物量約1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬入済量(国直轄除染市町村:2019年8月末時点、市町村除染市町村:2019年6月末時点、両者混在市町村(南相馬市、川内村、田村市、川俣町):2019年8月末時点)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点)及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点))の合計量(2019年10月末集計)。

10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した(発生することが見込まれる)除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2019年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。

中間貯蔵施設用地の状況

概要

- 中間貯蔵施設区域は約1,600haであり、予定地内の登記記録人数は2,360人となっています。
- 地権者との信頼関係はもとより、中間貯蔵施設事業への理解が何よりも重要であると考えており、引き続き、地権者への丁寧な説明を尽くしながら取り組みます。

中間貯蔵施設用地の状況について

2020年3月末時点

- 用地取得については、3月末時点で契約者数1,759人、面積約1,164haについて契約しております。

全体面積 約1,600ha	項 目	全体面積に対する 面積と割合	全体登記記録人数 (2,360人※1)に対する 人数と割合
	地権者連絡先把握済み	約1,560ha ※1 97.5%	約1,960人 ※1 83.1%
民有地 約1,270ha (約79%)	契約済	うち民有地 約1,122ha (+4.9ha)	計 約1,164ha (+7.2ha) 72.8%
公有地 約330ha (約21%)	その他の公有地	うち公有地 約42ha (+2.3ha)	約1,452ha (90.8%)
	次を含む。 ①道路・水路等のように今後も元々の機能を維持する町有地、県有地、国有地等 ②事業の進展を踏まえつつ、必要に応じて、中間貯蔵施設用地としての提供・契約を調整する町有地、県有地、国有地等	約288ha (18.0%)	<参考> 1,759人 ※2 (+7人) 74.5% 〔連絡先把握済みの1,960人に対する割合は、89.7%〕

※1 国、地方公共団体を含む。


※2 民有地1,757人、公有地2人。

(注)端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。

(注)契約済におけるカッコ内の数字は、前月末からの増加分を表す。

地権者の状況について

2020年3月末時点

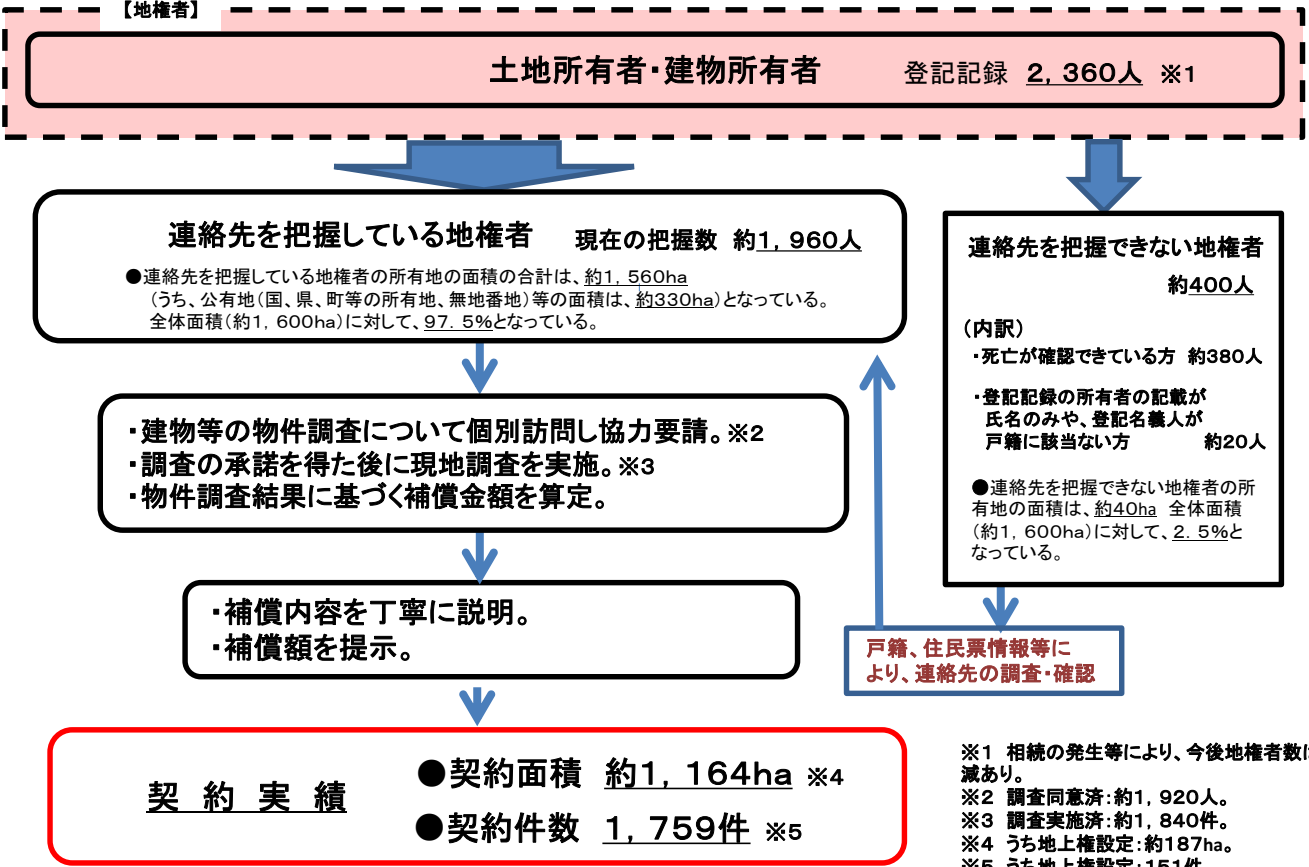

※1 相続の発生等により、今後地権者数は増減あり。
※2 調査同意済:約1,920人。
※3 調査実施済:約1,840件。
※4 うち地上権設定:約187ha。
※5 うち地上権設定:151件。

(注) 数値については概数であるため、合計と一致しない場合がある。

福島
再生。

国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

概要

- ・2016年3月に、帰還困難区域を除いて、津波がれきの撤去と仮置場への搬入を完了しています。
- ・被災家屋等の解体関連受付・調査を行い、順次解体撤去を実施中です。
- ・片付けごみの処理についてステーション回収や戸別回収訪問を実施しています。



大熊町の仮設焼却施設



被災家屋等の解体の様子

対策地域内廃棄物等の仮置場への搬入済量等

- ・災害廃棄物等の仮置場への搬入については、2月末時点で、約259万トンの搬入を完了しました（うち、約46万トンが焼却処理済、約161万トンが再生利用済）。

2020年2月末時点

仮置場搬入済量


(うち、焼却処理済量)

(うち、再生利用済量)

約259万トン

(約46万トン)

(約161万トン)

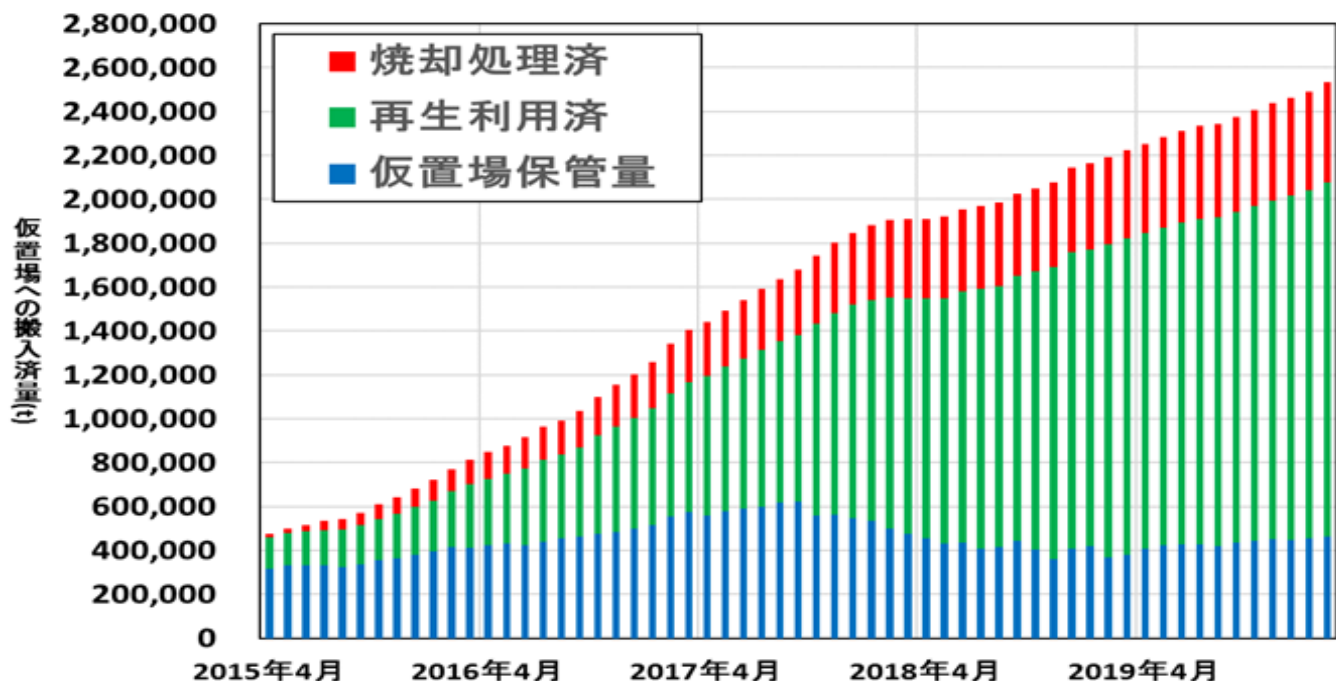

注) 仮置場へ搬入せずに処理する量も含む。

- 被災家屋について、2月末時点で、約16,600件の解体撤去申請を受付済みであり、約14,400件を解体撤去済みです。

市町村		解体受付 申請件数 ※	解体済件数	解体申請 受付状況
南相馬市		2,634	2,633	受付終了
浪江町		4,269	3,368	特定復興再生拠点 区域受付中
	特定復興再生拠点区域	266	142	
双葉町		894	617	受付中
	特定復興再生拠点区域	863	589	
大熊町		1,185	727	受付中
	特定復興再生拠点区域	1,072	627	
富岡町		3,584	3,113	特定復興再生拠点 区域受付中
	特定復興再生拠点区域	672	345	
楢葉町		1,557	1,557	完了
飯舘村		1,535	1,491	受付終了
	特定復興再生拠点区域	72	72	
川俣町		329	329	完了
葛尾村		480	476	受付終了
	特定復興再生拠点区域	43	39	
田村市		19	19	完了
川内村		102	102	完了
合計		16,588	14,432	


注：1）※当初申請数から取下げ件数を除いた件数です。
 2）特定復興再生拠点区域の件数は総数の内数です。



国直轄による対策地域内における仮設焼却施設の設置状況

概要

- ・ 9 市町村（11施設）において仮設焼却施設を設置しています。

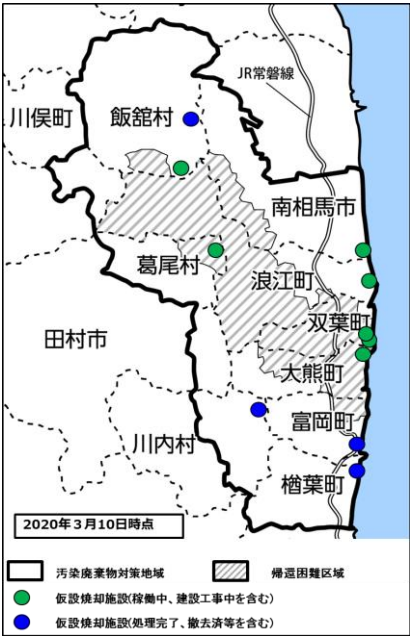

仮設焼却施設の進捗状況等

- ・ 2月末時点で、約111万トン（除染廃棄物を含む）を各仮設焼却施設で処理しました。
- ・ 各仮設焼却施設それぞれの進捗状況は下表のとおりです。

立地地区	進捗状況	処理能力	処理済量 (2020年2月末時点)
葛尾村	稼働中(2015年4月より)	200t/日	約118,000トン(約36,000トン)
浪江町	稼働中(2015年5月より)	300t/日	約235,000トン(約152,000トン)
飯舘村 (蔵平地区)	稼働中(2016年1月より)	240t/日	約210,000トン(約48,000トン)
大熊町	稼働中(2017年12月より)	200t/日	約55,000トン(約24,000トン)
双葉町	稼働中(2020年3月より)	350t/日	—
楢葉町	災害廃棄物等の処理完了	200t/日	約77,000トン(約32,000トン)
川内村		7t/日	約2,000トン(約2,000トン)
飯舘村 (小宮地区)		5t/日	約2,900トン(約2,900トン)
富岡町		500t/日	約155,000トン(約55,000トン)
南相馬市		400t/日	約214,000トン(約91,000トン)
川俣町	既存の処理施設で処理 (処理完了)	—	—
田村市		—	—

※処理済量については、除染廃棄物も含み、()内はうち災害廃棄物等の処理済量です。

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

概要

- ・福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物（指定廃棄物及び対策地域内廃棄物）について、既存の管理型処分場（旧フクシマエコテッククリーンセンター）を活用した埋立処分事業を実施。（10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入）
- ・2017年11月17日から特定廃棄物埋立処分施設への搬入を開始。



特定廃棄物埋立処分施設（2020年2月26日撮影）

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

- ・ 3月末時点で、117,671袋を特定廃棄物埋立処分施設へ搬入しました。


●最新の進捗状況

搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
3/25～3/31	713	117,671

●これまでの進捗状況

搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
2017年11月～2019年4月	68,873	68,873
2019年 5月	5,266	74,139
2019年 6月	6,274	80,413
2019年 7月	6,407	86,820
2019年 8月	4,478	91,298
2019年 9月	3,146	94,444
2019年 10月	3,551	97,995
2019年 11月	4,366	102,361
2019年 12月	3,885	106,246
2020年 1月	3,544	109,790
2020年 2月	3,956	113,746
2020年 3月	3,925	117,671

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

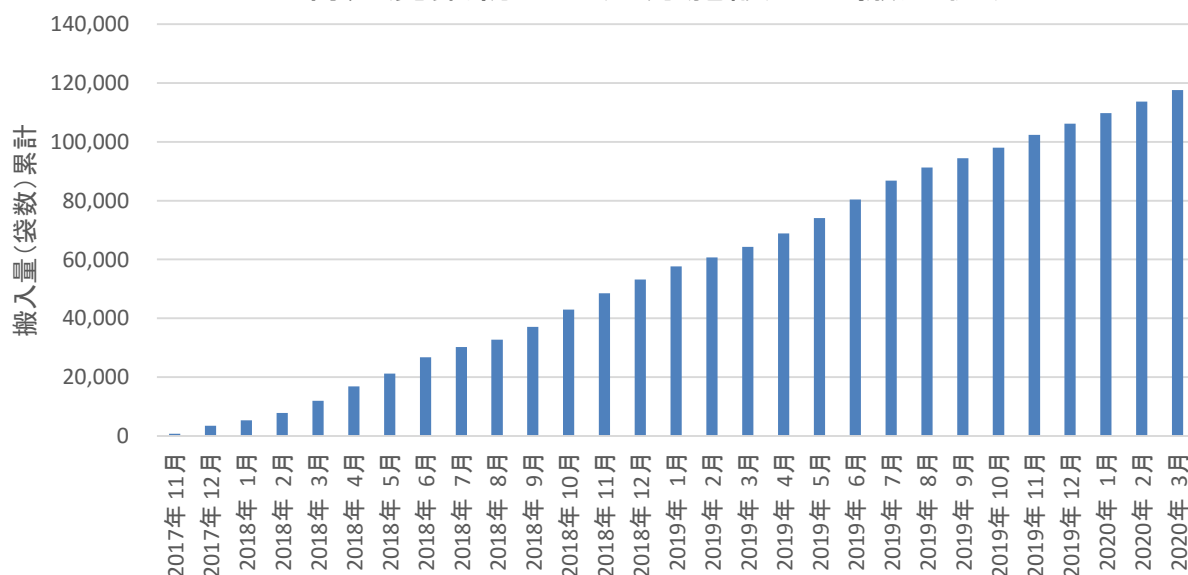

※搬入は平日のみ実施しています。 ※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

放射線に関わるリスクコミュニケーション活動状況

概要

- ・環境省では、環境中に放出された放射性物質対策を進めると同時に、放射線の不安や地域の環境再生の状況などに対して、分かりやすい情報を提供しています。
- ・環境再生プラザ、放射線リスクコミュニケーション相談員支援センターを主な拠点として活動しています。

これまでの進捗

3月31日時点

項 目		2019年度 3月分	2019年度 累 計
■相談員支援センター			
自治体職員や相談員等の活動の支援	研修会	0回	23回
	専門家派遣	0回	6回
住民の放射線に関する理解醸成の支援	住民セミナー	0回	61回
	車座意見交換会	0回	44回
■環境再生プラザ			
専門家派遣	自治体など	4件	42件
	小中学校など	0件	79件
	その他	0件	20件
移動展示		0件	44件
		0日	55日
■その他			
ホールボディカウンター（WBC）による線量測定		3日	84日
ガンマカメラ活用		1台日	150台日

今月の放射線に関するリスクコミュニケーション活動状況

- ・新型コロナウイルス感染拡大防止に関連して、予定されていた活動の調整等を進めています。
