

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

概要

- 安全を第一に除去土壌等の輸送を行っています。
- 2015年3月より除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を開始しました。
- 除去土壌等の仮置場からの中間貯蔵施設への輸送は10tダンプトラックを基本に実施しています。
- 輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施しています。




輸送車両の走行状況

中間貯蔵施設からゲートを通して
退域する輸送車両


除去土壌等の輸送の進捗状況

・2020年3月末時点で、累積約**668.3万³m**（全体の約**48%**）の除去土壌等を中間貯蔵施設へ輸送しました。

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約 1,400万³m	約 668.3万³m	約 48%

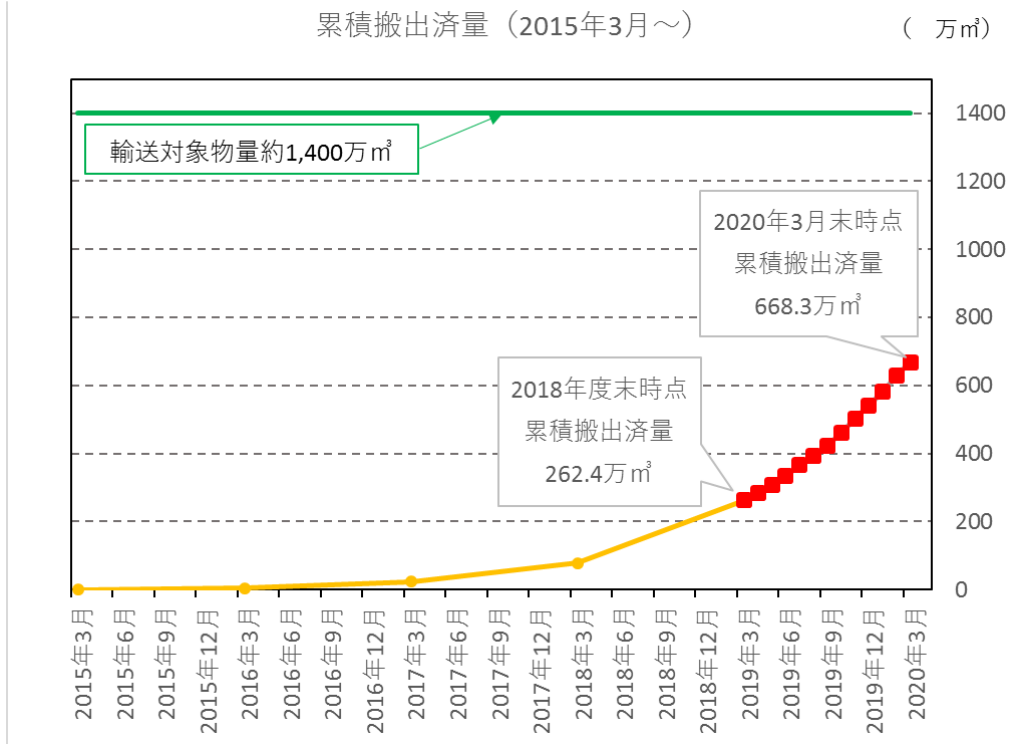

2019年度の輸送対象物量	2019年度搬出済量	2019年度進捗率
約 400万³m	約 405.9万³m	約 101.5%

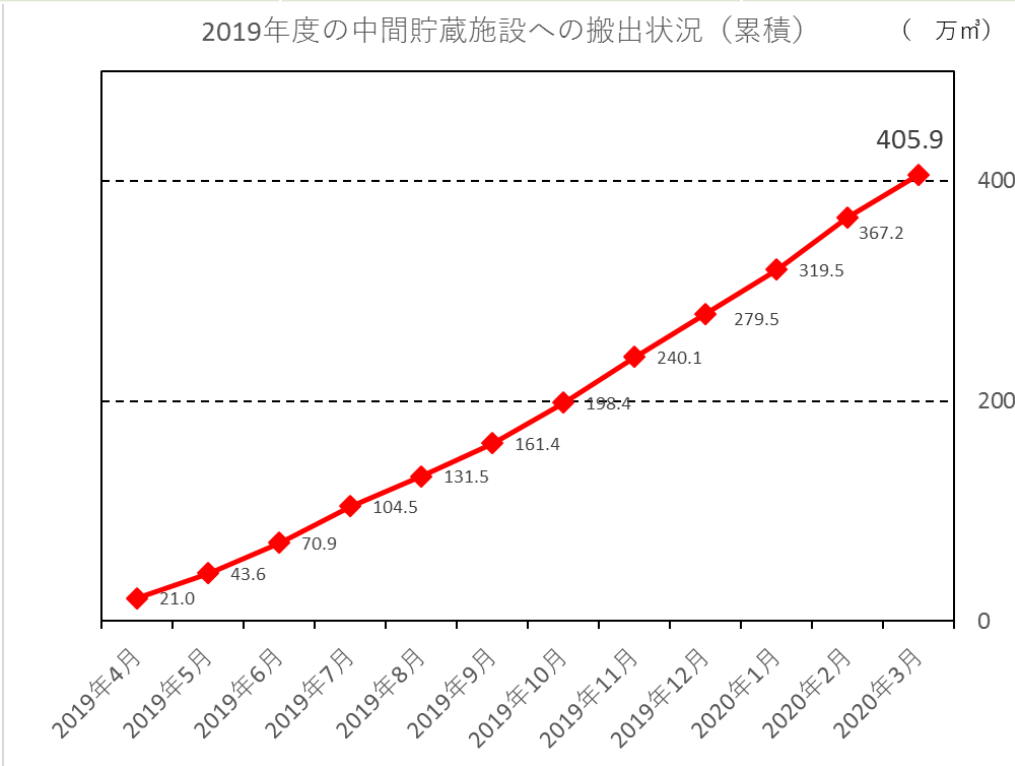

<参考>

各市町村ごとの除去土壌等の輸送

2020年3月31日時点の搬出実績

搬出市町村		2019年度の搬出可能量(m ³)	2019年度の学校等(現場保管)からの輸送予定量(m ³)	2019年度の搬出済量(m ³)	累積搬出済量(m ³)
浜通り	いわき市	50,000	10,000	72,221	128,160
	相馬市	39,000		31,535	64,796
	南相馬市	274,000	8,000	385,141	530,842
	広野町	67,000		66,112	111,566
	楡葉町	149,000		146,618	266,688
	富岡町	406,000		406,585	617,859
	川内村	96,000		74,357	133,048
	大熊町	342,000		222,249	406,354
	双葉町	312,000		80,784	233,357
	浪江町	353,000		606,804	772,535
	葛尾村	168,000		168,947	267,773
	飯舘村	395,000		332,357	511,382
中通り	福島市	198,000	78,000	289,924	406,887
	郡山市	153,000		250,883	449,295
	白河市	63,000		63,506	131,641
	須賀川市	53,000		48,005	97,010
	二本松市	113,000		117,818	216,083
	田村市	101,000		81,601	160,218
	伊達市	85,000	4,000	86,183	169,536
	本宮市	58,000		61,377	107,330
	桑折町	43,000		44,374	82,647
	国見町	39,000		18,735	47,250
	川俣町	163,000		152,101	235,693
	大玉村	26,000		19,718	44,979
	天栄村	34,000		33,653	59,981
	西郷村	125,000		142,630	222,813
	泉崎村	18,000		17,575	44,848
	矢吹町	10,000		10,559	32,260
	三春町	47,000		26,347	71,021
合計		3,980,000	100,000	4,058,699	※ 6,683,132

※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m³と換算しています。

※ 輸送対象物量約1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬入済量(国直轄除染市町村:2019年8月末時点、市町村除染市町村:2019年6月末時点、両者混在市町村(南相馬市、川内村、田村市、川俣町):2019年8月末時点)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点)及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点))の合計量(2019年10月末集計)。

10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した(発生することが見込まれる)除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2019年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
