

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

概要

- 安全を第一に除去土壌等の輸送を行っています。
- 2015年3月より除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を開始しました。
- 除去土壌等の仮置場からの中間貯蔵施設への輸送は10tダンプトラックを基本に実施しています。
- 輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施しています。



輸送車両の走行状況

中間貯蔵施設からゲートを通して
退域する輸送車両


除去土壌等の輸送の進捗状況

・2020年6月末時点で、累積約781万 m^3 （全体の約55.8%）の除去土壌等を中間貯蔵施設へ輸送しました。

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約1,400万 m^3	約781万 m^3	約55.8%

累積搬出済量（2015年3月～）

（万 m^3 ）

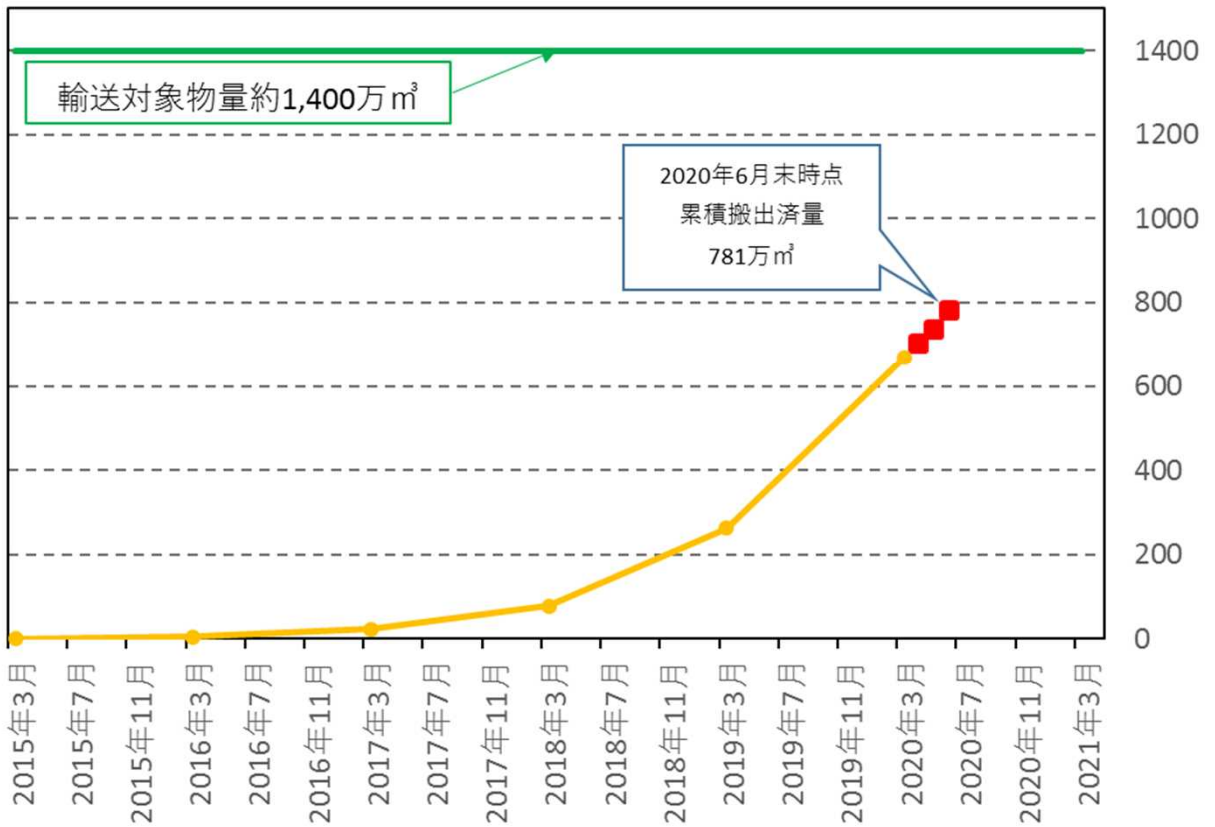

<参考>

各市町村ごとの除去土壌等の輸送

2020年6月30日時点の搬出実績

搬出市町村		今年度の搬出可能量(m ³)	今年度の学校等(現場保管)からの輸送予定量(m ³)	今年度の搬出済量(m ³)	累積搬出済量(m ³)
浜通り	いわき市	50,000	11,000	31,024	159,184
	相馬市	14,000		6,899	71,695
	南相馬市	274,000	8,000	93,744	624,586
	楡葉町	123,000		24,347	291,035
	富岡町	406,000		96,475	714,335
	川内村	66,000		26,962	160,010
	大熊町	342,000		32,021	438,375
	双葉町	312,000		43,304	276,661
	浪江町	144,000		171,214	943,749
	葛尾村	158,000		35,114	302,887
	飯館村	395,000		134,664	646,046
中通り	福島市	370,000		108,424	515,311
	郡山市	272,000		73,708	523,003
	白河市	90,000		23,092	154,733
	須賀川市	53,000		6,173	103,183
	二本松市	121,000		24,298	240,381
	田村市	35,000		8,496	168,714
	伊達市	65,000	2,000	19,179	188,715
	本宮市	72,000		14,855	122,185
	桑折町	21,000		7,813	90,460
	国見町	28,000		3,064	50,314
	川俣町	202,000		75,608	311,301
	天栄村	2,000		0	59,981
	西郷村	265,000		69,035	291,848
三春町	24,000		0	71,021	
合計		3,904,000	21,000	1,129,513	※ 7,812,646

※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m³と換算しています。

※ 輸送対象物量約1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬入済量(国直轄除染市町村:2019年8月末時点、市町村除染市町村:2019年6月末時点、両者混在市町村(南相馬市、川内村、田村市、川俣町):2019年8月末時点)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点)及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点))の合計量(2019年10月末集計)。

10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した(発生することが見込まれる)除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2020年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
