

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

概要

- 安全を第一に除去土壌等の輸送を行っています。
- 2015年3月より除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を開始しました。
- 除去土壌等の仮置場からの中間貯蔵施設への輸送は10tダンプトラックを基本に実施しています。
- 輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施しています。



輸送車両の走行状況

中間貯蔵施設からゲートを通して
退域する輸送車両


除去土壌等の輸送の進捗状況

・2020年8月末時点で、累積約855万 m^3 （全体の約61.1%）の除去土壌等を中間貯蔵施設へ輸送しました。

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約1,400万 m^3	約855万 m^3	約61.1%

累積搬出済量（2015年3月～）

（万 m^3 ）

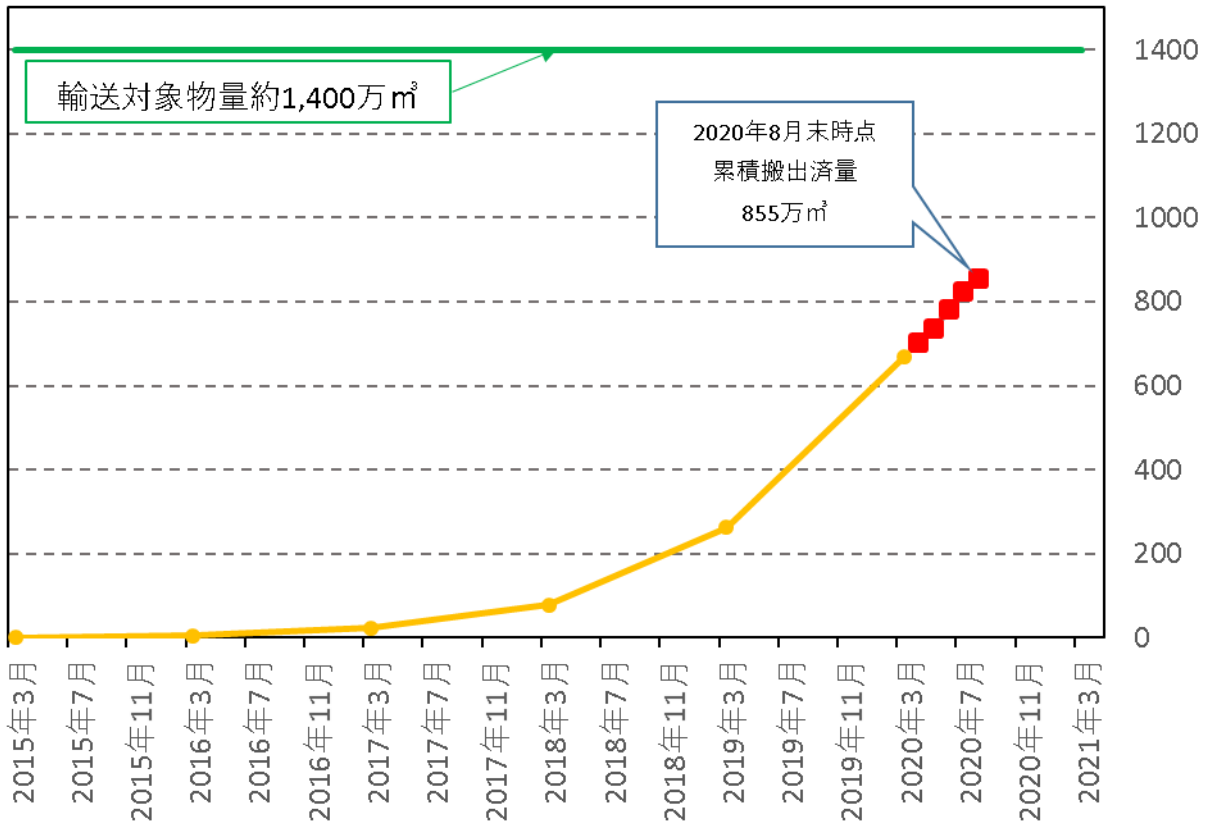

<参考>

各市町村ごとの除去土壌等の輸送

2020年8月31日時点の搬出実績

搬出市町村		今年度の搬出 可能量(m ³)	今年度の学校 等(現場保管) からの輸送予 定量(m ³)	今年度の搬出 済量(m ³)	累積搬出済量 (m ³)
浜通り	いわき市	50,000	11,000	52,410	180,570
	相馬市	14,000		11,269	76,065
	南相馬市	274,000	8,000	168,877	699,719
	楡葉町	123,000		48,021	314,709
	富岡町	406,000		192,779	810,639
	川内村	66,000		37,658	170,706
	大熊町	342,000		47,598	453,952
	双葉町	312,000		68,698	302,055
	浪江町	144,000		213,313	985,848
	葛尾村	158,000		61,269	329,042
	飯舘村	395,000		202,820	714,202
中通り	福島市	370,000		188,865	595,752
	郡山市	272,000		127,289	576,584
	白河市	90,000		42,844	174,485
	須賀川市	53,000		10,837	107,847
	二本松市	121,000		53,316	269,399
	田村市	35,000		14,073	174,291
	伊達市	65,000	2,000	31,854	201,390
	本宮市	72,000		28,768	136,098
	桑折町	21,000		12,905	95,552
	国見町	28,000		6,994	54,244
	川俣町	202,000		129,049	364,742
	天栄村	2,000		0	59,981
	西郷村	265,000		118,555	341,368
三春町	24,000		0	71,021	
合計		3,904,000	21,000	1,870,061	※ 8,553,194

※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m³と換算しています。

※ 輸送対象物量約1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬入済量(国直轄除染市町村:2019年8月末時点、市町村除染市町村:2019年6月末時点、両者混在市町村(南相馬市、川内村、田村市、川俣町):2019年8月末時点)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点)及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点))の合計量(2019年10月末集計)。

10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した(発生することが見込まれる)除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2020年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
