

## 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

## 概要

- 安全を第一に除去土壌等の輸送を行っています。
- 2015年3月より除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を開始しました。
- 除去土壌等の仮置場からの中間貯蔵施設への輸送は10tダンプトラックを基本に実施しています。
- 輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施しています。



輸送車両の走行状況

中間貯蔵施設からゲートを通して  
退域する輸送車両


## 除去土壌等の輸送の進捗状況

・2020年10月末時点で、累積約938万 $\text{m}^3$ （全体の約67%）の除去土壌等を中間貯蔵施設へ輸送しました。

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約1,400万 $\text{m}^3$	約938万 $\text{m}^3$	約67.0%

累積搬出済量（2015年3月～）

（万 $\text{m}^3$ ）

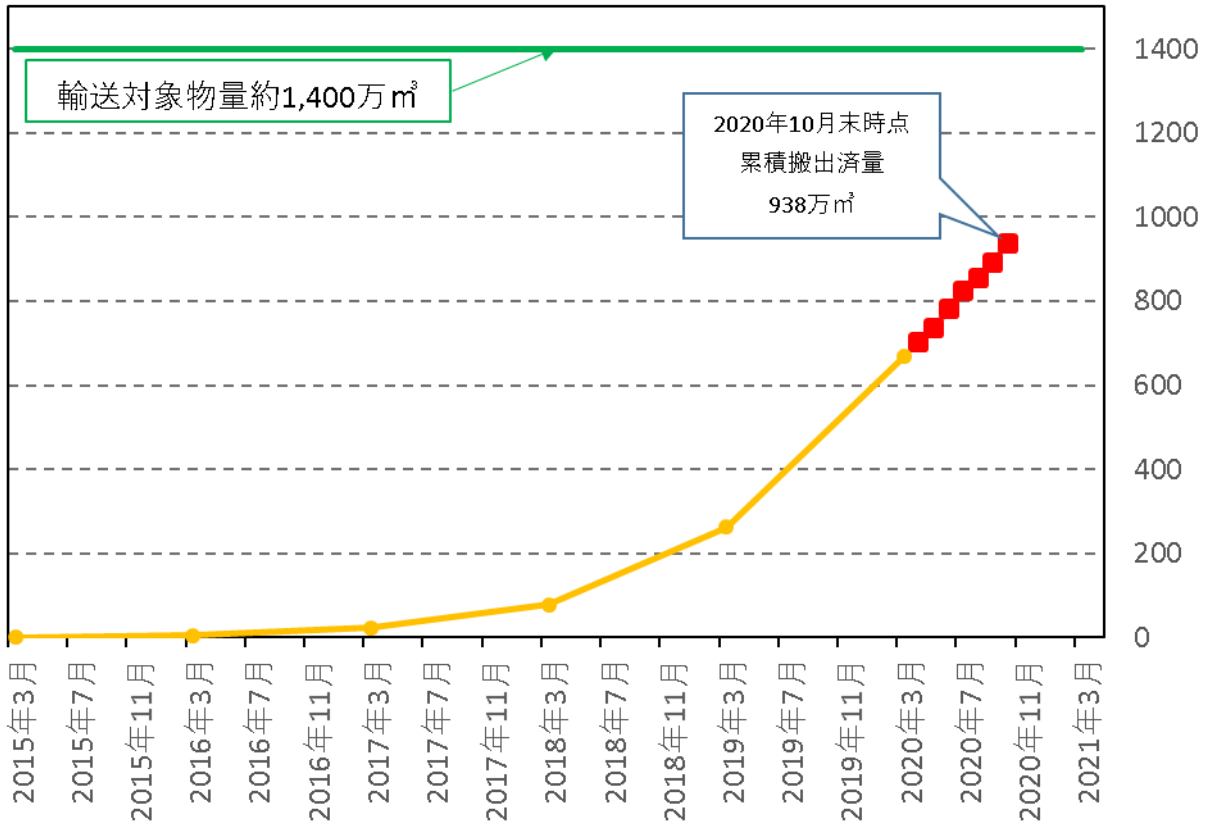

# <参考>

## 各市町村ごとの除去土壌等の輸送

2020年10月31日時点の搬出実績

搬出市町村		今年度の搬出可能量(m <sup>3</sup> )	今年度の学校等(現場保管)からの輸送予定量(m <sup>3</sup> )	今年度の搬出済量(m <sup>3</sup> )	累積搬出済量(m <sup>3</sup> )
浜通り	いわき市	50,000	11,000	65,604	193,764
	相馬市	14,000		13,402	78,198
	南相馬市	274,000	8,000	268,083	798,925
	楡葉町	123,000		77,089	343,777
	富岡町	406,000		303,609	921,469
	川内村	66,000		54,564	187,612
	大熊町	342,000		77,811	484,165
	双葉町	312,000		95,270	328,627
	浪江町	144,000		254,937	1,027,472
	葛尾村	158,000		102,898	370,671
	飯舘村	395,000		260,034	771,416
中通り	福島市	370,000		264,483	671,370
	郡山市	272,000		181,159	630,454
	白河市	90,000		62,771	194,412
	須賀川市	53,000		31,959	128,969
	二本松市	121,000		84,740	300,823
	田村市	35,000		21,325	181,543
	伊達市	65,000	2,000	56,718	226,254
	本宮市	72,000		45,417	152,747
	桑折町	21,000		17,635	100,282
	国見町	28,000		12,026	59,276
	川俣町	202,000		169,732	405,425
	天栄村	2,000		1,520	61,501
	西郷村	265,000		170,889	393,702
三春町	24,000		5,510	76,531	
合計		3,904,000	21,000	2,699,185	※ 9,382,318

※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m<sup>3</sup>と換算しています。

※ 輸送対象物量約1,400万m<sup>3</sup>は、中間貯蔵施設への搬入済量(国直轄除染市町村:2019年8月末時点、市町村除染市町村:2019年6月末時点、両者混在市町村(南相馬市、川内村、田村市、川俣町):2019年8月末時点)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点)及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点))の合計量(2019年10月末集計)。

10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した(発生することが見込まれる)除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2020年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
