



## 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

### 概要

- 安全を第一に除去土壌等の輸送を行っています。
- 2015年3月より除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を開始しました。
- 除去土壌等の仮置場からの中間貯蔵施設への輸送は10tダンプトラックを基本に実施しています。
- 輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施しています。



輸送車両の走行状況



中間貯蔵施設からゲートを通して  
退域する輸送車両


## 除去土壌等の輸送の進捗状況

・2021年7月末時点で、累積約1,140万 $\text{m}^3$ （全体の約81.5%）の除去土壌等を中間貯蔵施設へ輸送しました。

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約1,400万 $\text{m}^3$	約1,140万 $\text{m}^3$	約81.5%

累積搬出済量（2015年3月～）

（万 $\text{m}^3$ ）

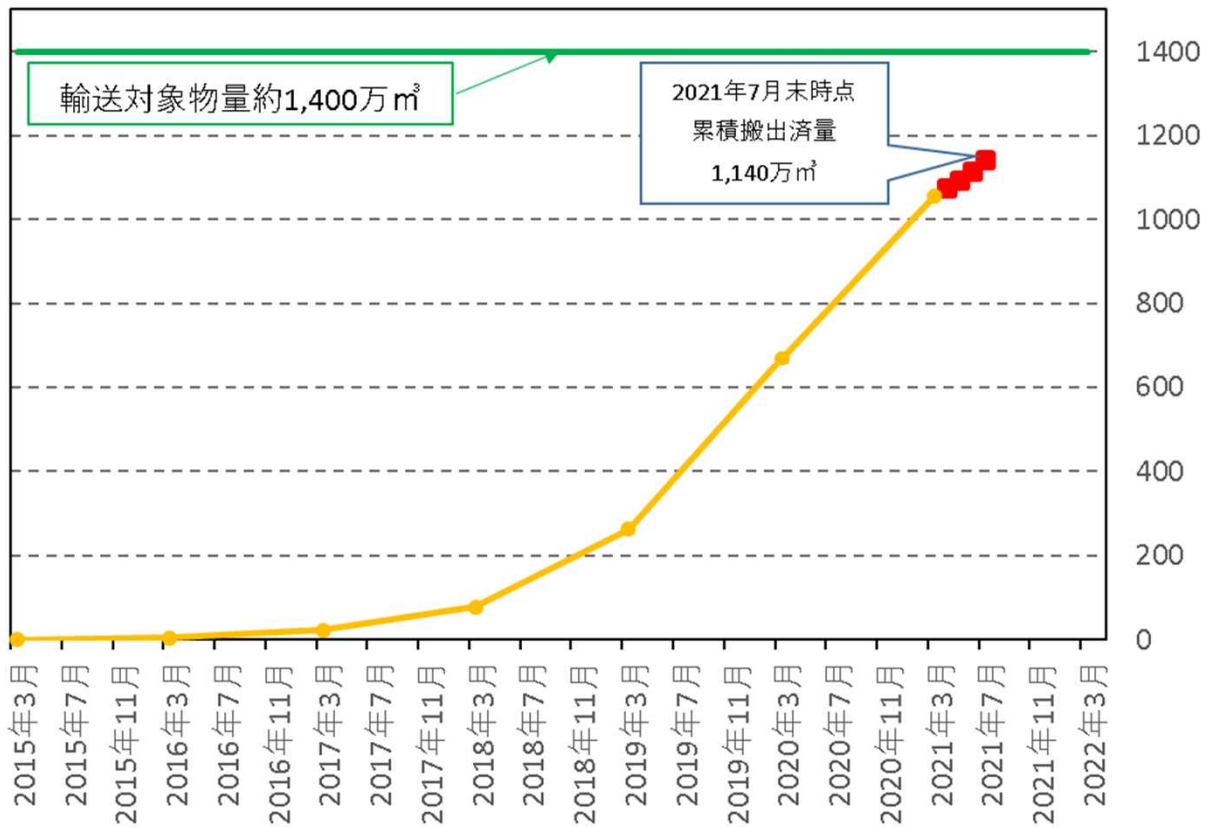

## <参考>

### 各市町村ごとの除去土壌等の輸送

2021年7月末時点の搬出実績

搬出市町村		今年度の搬出 可能量(m <sup>3</sup> )	今年度の搬出 済量(m <sup>3</sup> )	累積搬出済量 (m <sup>3</sup> )
浜通り	いわき市	23,000	12,309	207,894
	南相馬市	6,000	18,598	975,589
	富岡町	375,000	133,638	1,171,091
	大熊町	130,000	20,361	596,854
	双葉町	93,000	37,854	403,678
	浪江町	250,000	59,554	1,124,197
	葛尾村	63,000	44,840	454,595
	飯舘村	395,000	63,143	921,266
中通り	福島市	320,000	106,040	902,943
	郡山市	188,000	87,926	805,963
	白河市	70,000	16,198	236,726
	須賀川市	53,000	19,236	174,207
	二本松市	101,000	44,579	391,975
	伊達市	28,000	10,202	256,063
	本宮市	46,000	12,004	193,496
	川俣町	191,000	73,966	528,182
	西郷村	203,000	91,103	579,610
	泉崎村	1,000	0	44,848
合計		2,536,000	851,551	※ 11,403,883

※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m<sup>3</sup>と換算しています。

※ 輸送対象物量約1,400万m<sup>3</sup>は、中間貯蔵施設への搬入済量(国直轄除染市町村:2019年8月末時点、市町村除染市町村:2019年6月末時点、両者混在市町村(南相馬市、川内村、田村市、川俣町):2019年8月末時点)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点)及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点))の合計量(2019年10月末集計)。

10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した(発生することが見込まれる)除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2021年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
