



## 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

### 概要

- 安全を第一に除去土壌等の輸送を行っています。
- 2015年3月より除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を開始しました。
- 除去土壌等の仮置場からの中間貯蔵施設への輸送は10tダンプトラックを基本に実施しています。
- 輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施しています。



輸送車両の走行状況



中間貯蔵施設からゲートを通して  
退域する輸送車両


## 除去土壌等の輸送の進捗状況

・2021年11月末時点で、累積約1,228万 $\text{m}^3$ （全体の約87.7%）の除去土壌等を中間貯蔵施設へ輸送しました。

輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約1,400万 $\text{m}^3$	約1,228万 $\text{m}^3$	約87.7%

累積搬出済量（2015年3月～）

（万 $\text{m}^3$ ）

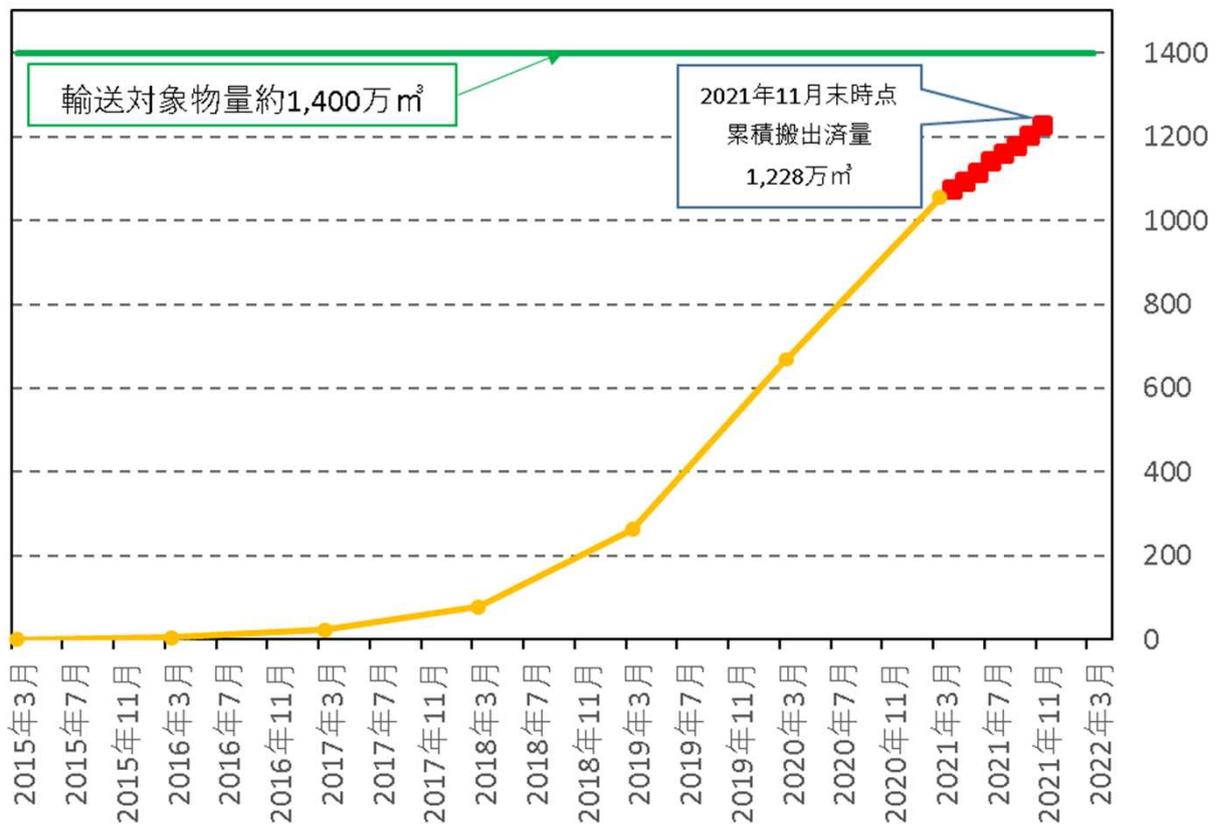

## <参考>

### 各市町村ごとの除去土壌等の輸送

2021年11月末時点の搬出実績

搬出市町村		今年度の搬出 可能量(m <sup>3</sup> )	今年度の搬出 済量(m <sup>3</sup> )	累積搬出済量 (m <sup>3</sup> )
浜通り	いわき市	23,000	15,434	211,019
	南相馬市	6,000	27,350	984,341
	富岡町	375,000	258,071	1,295,524
	大熊町	130,000	81,931	658,424
	双葉町	93,000	40,065	405,889
	浪江町	250,000	130,463	1,195,106
	葛尾村	63,000	62,102	471,857
	飯舘村	395,000	145,822	1,003,945
中通り	福島市	320,000	222,808	1,019,711
	郡山市	188,000	162,128	880,165
	白河市	70,000	72,619	293,147
	須賀川市	53,000	37,845	192,816
	二本松市	101,000	83,406	430,802
	伊達市	28,000	20,566	266,427
	本宮市	46,000	25,296	206,788
	川俣町	191,000	151,875	606,091
	西郷村	203,000	190,176	678,683
泉崎村	1,000	0	44,848	
合計		2,536,000	1,727,957	※ 12,280,289

※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m<sup>3</sup>と換算しています。

※ 輸送対象物量約1,400万m<sup>3</sup>は、中間貯蔵施設への搬入済量(国直轄除染市町村:2019年8月末時点、市町村除染市町村:2019年6月末時点、両者混在市町村(南相馬市、川内村、田村市、川俣町):2019年8月末時点)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点)及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点))の合計量(2019年10月末集計)。

10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した(発生することが見込まれる)除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2021年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
