

福島地方環境事務所の最近の動き
(今週の福島)

【最近の動きのポイント】

○ 除染・廃棄物対策関連

- ・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町及び飯舘村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です
- ・双葉町（中間貯蔵施設内）において、仮設焼却施設及び仮設灰処理施設の起工式を 11 月 15 日（木）に実施します

○ 中間貯蔵施設関連

- ・大熊工区 5 カ所目となる土壌貯蔵施設等工事（大熊⑤工区）に大熊町夫沢地区で着手しました（10/29）

< 除去土壌等の輸送の進捗状況 >

今年度の輸送対象物量	今年度搬入済量（10/30 時点）	今年度進捗率
約 180 万 m ³	約 78.7 万 m ³	約 43.7%
累積の輸送対象物量	累積搬入済量（10/30 時点）	累積進捗率
約 1,400 万 m ³	約 154.5 万 m ³	約 11.0%

○ リスクコミュニケーション等関連

- ・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です
- ・新宿御苑（東京都新宿区）において、福島環境回復を PR するイベント「新宿御苑ふくしま菊フェスタ」を開催します（11/10～11）。二本松市の菊人形の展示や特産品の紹介、楡葉町で収穫した新米のプレゼントなど様々な企画を用意しています

I. 除染・廃棄物対策関連

1 特定復興再生拠点区域の解体・除染について

帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋等の解体・除染を実施しています。

○ 最近の動き

- ・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町及び飯舘村において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です。

詳細は別添 1-1、1-2、3 のとおり

2 避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について

帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。

各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。

仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。

○ 最近の動き

双葉町で発生した可燃性の除染廃棄物・災害廃棄物等と中間貯蔵施設内に搬入した可燃性除染廃棄物を焼却処理する仮設処理施設（中間貯蔵施設）について、建設に必要な準備が整ったことから、起工式を実施します（11/15）。

本事業は、中間貯蔵施設内の双葉町細谷地区に仮設焼却施設を建設し、双葉町で発生した可燃性の除染廃棄物・災害廃棄物等と中間貯蔵施設内に搬入した可燃性除染廃棄物を焼却処理するものです。また、本施設内で発生する焼却残さ及び中間貯蔵施設内に搬入した焼却残さについても、仮設灰処理施設を建設し、減容化処理することにより、焼却残さのさらなる減容化を行います。

- 除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1-1、1-2 のとおり

- 特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 4 のとおり

Ⅱ. 中間貯蔵施設関連

中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。

(1) 最近の動き

○ 大熊工区5カ所目となる土壌貯蔵施設等工事（大熊⑤工区）に大熊町夫沢地区で着手しました（10/29）。

○ 除去土壌等の輸送の進捗状況

今年度の輸送対象物量	今年度搬入済量（10/30 時点）	今年度進捗率
約 180 万 m ³	約 78.7 万 m ³	約 43.7%
累積の輸送対象物量	累積搬入済量（10/30 時点）	累積進捗率
約 1,400 万 m ³	約 154.5 万 m ³	約 11.0%

(2) 平成 30 年度の進捗状況

○ 除去土壌等の輸送

（10 月 30 日までの搬入実績）

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 (m ³)	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定量 (m ³)	今年度の 搬入済量(m ³)	累積 搬入済量 (m ³)
浜通り	いわき市	22,200	7,800	13,660	36,058
	相馬市	16,100	－	－	16,851
	南相馬市	113,200	－	34,671	62,733
	広野町	31,900	－	4,359	13,919
	檜葉町	72,400	－	35,313	60,769
	富岡町	162,400	－	66,335	109,784
	川内村	42,400	－	39,142	53,697
	大熊町	147,000	－	56,482	107,846
	双葉町	132,700	－	20,739	67,658
	浪江町	130,300	－	27,475	63,953
	葛尾村	71,400	－	47,228	63,755
	飯舘村	151,600	－	82,507	110,798
中通り	福島市	78,700	20,000	27,482	52,357
	郡山市	67,200	20,900	74,476	137,843
	白河市	33,800	100	27,177	51,638
	須賀川市	22,000	3,600	16,730	31,655
	二本松市	50,000	－	26,794	70,575
	田村市	47,800	300	26,208	52,698
	伊達市	62,600	6,000	28,826	49,744
	本宮市	20,600	－	13,313	36,598
	桑折町	19,200	－	2,350	18,984

	国見町	16,300	-	6,948	18,292
	川俣町	71,600	-	33,734	56,013
	大玉村	13,700	-	8,478	17,743
	鏡石町	0	300	323	7,853
	天栄村	16,100	-	5,681	15,352
	西郷村	54,900	-	36,203	57,287
	泉崎村	15,200	-	7,366	17,797
	中島村	6,400	-	5,827	14,054
	矢吹町	13,900	-	7,279	16,876
	三春町	24,400	-	3,454	17,643
	合計	1,728,000	59,000	786,560	1,545,225※

※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1 m³と換算しています。

※ 中間貯蔵施設への搬入済量（2018年5月末時点）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018年5月末時点、市町村除染：2018年3月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018年5月末時点、市町村除染：2018年3月末時点））の合計量。

※ 10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬入済量の合計値には、2018年3月末時点で搬入が完了している市町村の搬入量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬入済量の合計とは数字が一致しません。

○ 中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等

こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
<http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba>

○ 中間貯蔵施設に係る工事等について
 工事等の一覧は別添2のとおり

Ⅲ. 放射線健康リスクコミュニケーション等関連

①自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。

（１）最近の動き

○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。

○ 放射線を可視化するガンマカメラを活用した、住民向けリスクコミュニケーション支援事業を実施中です。

- 富岡町において、富岡町社会福祉協議会を通じて住民の方を対象に小山浄水場見学をし、車座意見交換会を実施しました（10/29）。
- 葛尾村において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施します（11/3）。
- 新宿御苑（東京都新宿区）において開催中（11/1～15）の「新宿御苑 菊花壇展」にあわせて、福島県及び二本松市と協力して、福島環境回復をPRするイベント「新宿御苑ふくしま菊フェスタ」を行います。
 - ・日 時：11月10日（土）～11日（日）9:00～16:00
 - ・場 所：新宿御苑インフォメーションセンター前
 - ・その他：本イベントは無料です

詳細は、別添5のとおり

<http://josen.env.go.jp/plaza/info/event/201811.html>

（2）これまでの実施状況

（11月2日時点）

項 目		実施回数	
		H29 年度	今年度
① 自治体職員や相談員等の活動の支援	（ア）職員向け研修会	77 回	29 回
	（イ）専門家派遣	47 回	12 回
② 住民の放射線に関する理解醸成の支援	（ア）住民セミナー	72 回	25 回
	（イ）車座意見交換会	62 回	35 回
	（ウ）個人線量測定の支援（WBC）	83 日	56 日
	（エ）リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）による活動		
	（オ）ガンマカメラ活用リスクコミュニケーション支援事業	184 台・日	126 台・日
③ 環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）	（ア）専門家派遣	142 件	87 件
	（イ）移動展示	42 件 [55 日]	28 件 [42 日]

除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧
(除染特別地域、汚染廃棄物対策地域)

市町村	工事名
南相馬市	○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事 (H30/2/13～) ※H30. 3 月に着工 ○平成 30 年度南相馬市建物解体等撤去工事 (H30/8/8～) ※H30. 9 月に着工
浪江町	○平成 29 年度 (平成 28 年度繰越) 浪江町フォローアップ除染等工事 (H29/9/25～) ※H30. 10 月に完了 ○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事 (H30/5/15～) ※H30. 7 月に着工 <u>○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 1) (H30/6/20～)</u> ※H30. 8 月に着工 ○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事 (H30/1/25～) ※H30. 3 月に着工 ○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事 (H30/4/11～) ※H30. 6 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請 (特定復興再生拠点区域) を受付中
双葉町	<u>○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 1) (H29/12/4～)</u> ※H29. 12 月に着工 <u>○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 2) (H30/1/10～)</u> ※H30. 2 月に着工 ○平成 29 年度双葉町建物解体等撤去工事 (その 2) (H30/2/8～) ※H30. 10 月に完了 ○被災家屋等の解体撤去申請を受付中
大熊町	○平成 30 年度 (平成 29 年度繰越) 大熊町仮置場復旧等工事 (H30/7/19～) ※H30. 8 月に着工 <u>○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 1) (H30/1/25～)</u> ※H30. 3 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

市町村	工事名
富岡町	○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他) (H29/5/22～) ※H29. 6 月に着工 ○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町フォローアップ除染等工事 (H29/9/26～) ※H29. 10 月に着工 ○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び <u>除染等工事(その1)(H30/8/7～)</u> ※H30. 8 月に着工 ○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事(その2)(H29/12/27～) ※H30. 3 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付中
檜葉町	○平成 29 年度檜葉町仮置場復旧等工事(H29/4/19～) ※H29. 5 月に着工 ○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)檜葉町仮置場復旧等工事(H30/7/5～) ※H30. 8 月に着工 ○平成 30 年度檜葉町建物解体等撤去工事(H30/7/9～) ※H30. 7 月に着工
飯舘村	○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)飯舘村仮置場復旧等工事(H30/4/10～) ※H30. 4 月に着工 ○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び <u>除染等工事(H30/9/4～)</u> ※H30. 9 月に着工 ○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事(H30/4/13～) ※H30. 6 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付終了
川俣町	○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29～) ※H30. 6 月に着工 ○平成 30 年度川俣町建物解体等撤去工事(公共特殊建物)(H30/7/26～) ※H30. 10 月に着工
葛尾村	○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事(その2) (H30/6/20～) ※H30. 7 月に着工 ○平成 30 年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去 等及び除染等工事(H30/10/5～) ※着工準備中 ○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付中

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

各市町村における被災家屋等の解体進捗状況

(平成30年10月末時点)

平成30年11月2日

市町村	解体受付 申請件数 ※	解体済件数	解体申請 受付状況
南相馬市	2,635	2,619	受付終了
浪江町	3,832	2,255	特定復興再生拠点区域 受付中
特定復興再生拠点区域	80	0	
双葉町	515	90	受付中
特定復興再生拠点区域	486	62	
大熊町	710	182	受付中
特定復興再生拠点区域	615	101	
富岡町	3,149	2,405	特定復興再生 拠点区域受付中
特定復興再生拠点区域	324	138	
楡葉町	1,577	1,463	受付終了
飯舘村	1,489	1,099	受付終了
特定復興再生拠点区域	66	0	
川俣町	329	327	受付終了
葛尾村	443	364	特定復興再生 拠点区域受付中
特定復興再生拠点区域	17	0	
田村市	19	19	受付終了
川内村	102	102	受付終了


注：１）※当初申請数から取下げ件数を除いた件数

２）特定復興再生拠点区域の件数は総数の内数

中間貯蔵施設に係る工事等の一覧

	工事名
土壌貯蔵施設等	○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（双葉町）（H28/6/14～） ※H28. 11 月に着工、H29. 12 月貯蔵開始
	○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（大熊町）（H28/6/14～） ※H28. 11 月に着工、H29. 10 月貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～） ※H29. 10 月に着工、H30. 9 月貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/18～） ※H30. 1 月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～） ※H29. 11 月に着工、H30. 7 月貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～） ※H29. 9 月に着工、H30. 7 月貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 3 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/18～） ※H29. 11 月に着工、H30. 10 月貯蔵開始
	○平成 30 年度中間貯蔵（双葉 3 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/6～） ※H30. 9 月に着工
	○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 4 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/5～） ※今年度中に着工予定
	○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 5 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/10～） ※H30. 10 月 29 日に着工
廃棄物関連施設	○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 1 業務（H30/3/1～） ※今年度中に着工予定、H31 年度内に稼働予定
	○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 2 業務（H30/3/1～） ※今年度中に着工予定、H31 年度内に稼働予定
	○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/9～） ※H30. 6 月に着工、H31 年度内に稼働予定
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/8～） ※H30. 7 月に着工、H31 年度内に稼働予定

	工事名
その他 施設等	○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町） （H29/12/23～）
	○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町）（H30/1/19～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事（H30/7/19～）
	○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/8/24～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町） （H30/10/25～）

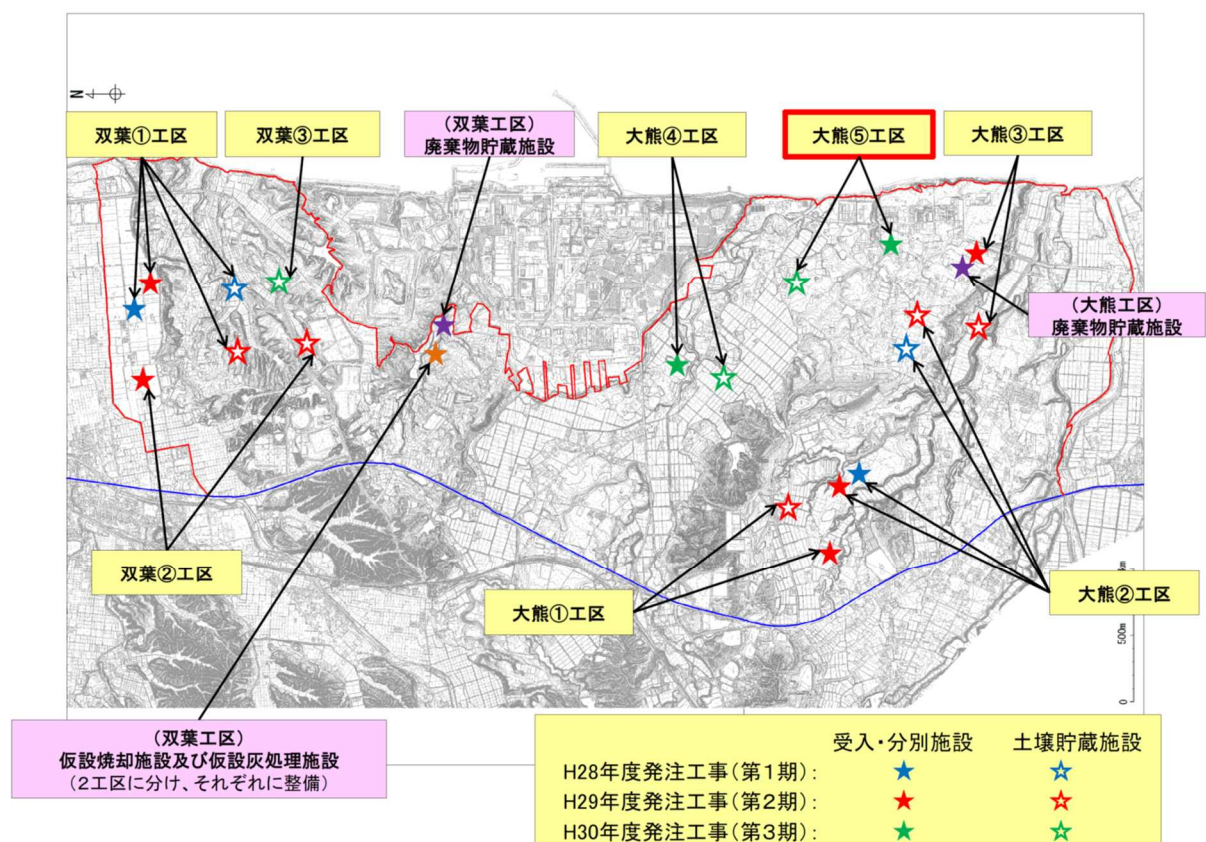


特定復興再生拠点区域整備の状況 (2018年11月2日時点)

別添 3

- 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
- 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備（除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から5年を目途に避難指示解除を目指す）。
- これまでに、以下6町村の計画が認定され、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村で解体・除染等工事に着工。


双葉町(2017.9.15認定、約560ha)

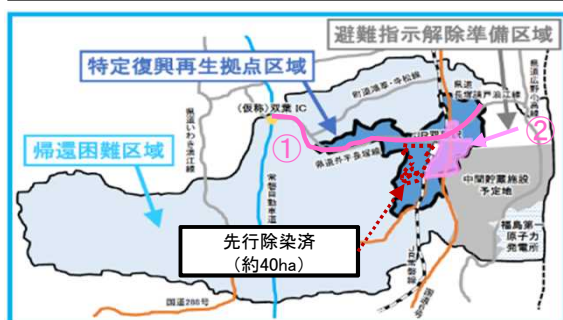

【工事状況】

- ①復興シンボル軸解体・除染等工事
(解体55件、除染約7ha) : 12月25日着工
- ②駅東等解体・除染等工事
(解体640件、除染約90ha) : 実施中

大熊町(2017.11.10認定、約860ha)

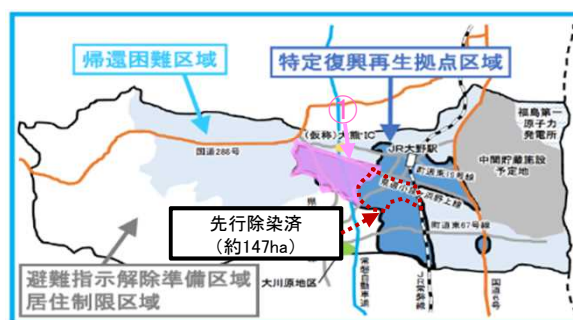

【工事状況】

- ①下野上地区の西エリアを中心とした解体・除染等工事
(解体460件、除染約160ha) : 3月9日着工

浪江町(2017.12.22認定、約660ha)



【工事状況】

- ①一部道路の除染等工事(除染約4ha) : 完了
- ②3地区における解体・除染等工事
(解体60件、除染約30ha) : 実施中


富岡町(2018.3.9認定、約390ha)



【工事状況】

- ①夜ノ森駅周辺の除染等工事(除染約0.3ha) : 完了
- ②拠点北エリアの解体・除染等工事
(解体300件、除染約80ha) : 実施中

飯舘村(2018.4.20認定、約186ha)

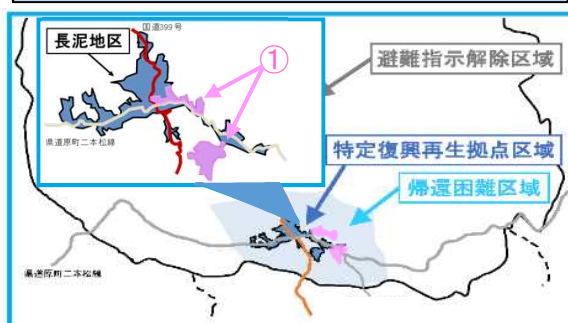

【工事状況】

- ①長泥地区の居住促進ゾーンを中心とした解体・除染等工事
(解体20件、除染約30ha) : 9月28日着工

葛尾村(2018.5.11認定、約95ha)



【工事状況】解体・除染等工事について調整中

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

平成 30 年 11 月 2 日

【最新の進捗状況】


搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
10/24～10/30	1,432	42,682

※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】

搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
平成 29 年 11 月	707	707
平成 29 年 12 月	2,746	3,453
平成 30 年 1 月	1,866	5,319
平成 30 年 2 月	2,523	7,842
平成 30 年 3 月	4,060	11,902
平成 30 年 4 月	4,965	16,867
平成 30 年 5 月	4,287	21,154
平成 30 年 6 月	5,615	26,769
平成 30 年 7 月	3,445	30,214
平成 30 年 8 月	2,504	32,718
平成 30 年 9 月	4,410	37,128
平成 30 年 10 月 (30 日まで)	5,554	42,682

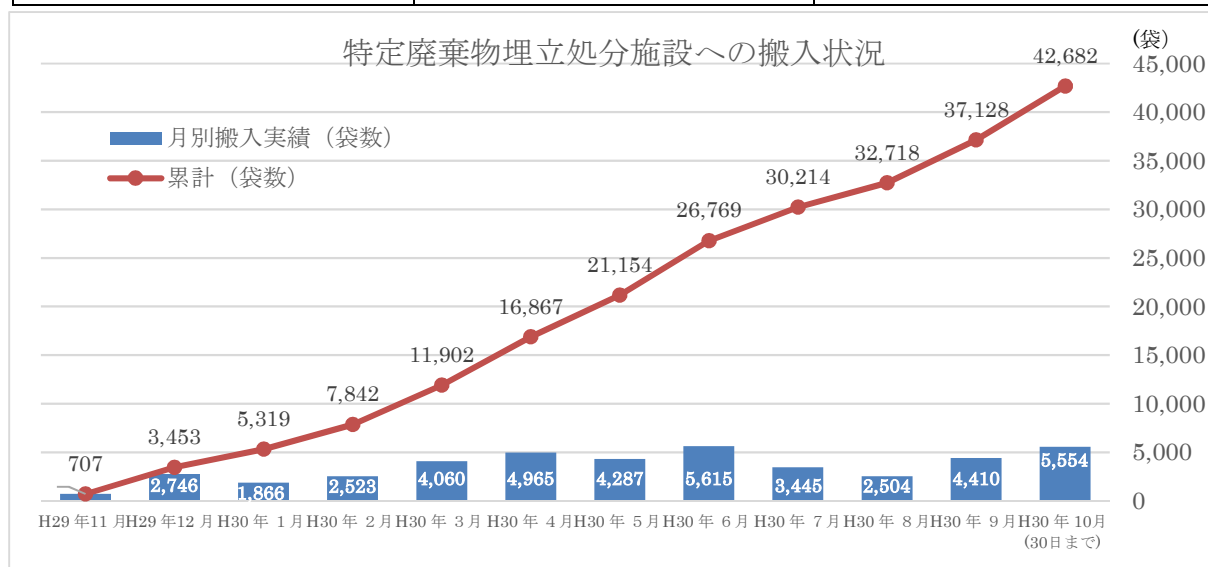

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。

http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/

新宿御苑 ふくしま菊フェスタ

**Fukushima Chrysanthemum Exhibition
in Shinjuku Gyoen National Garden**

日時 11月10日(土)～11日(日)9:00～16:00

場所 新宿御苑インフォメーションセンター前

無料

● 福島県二本松の職人が丹精込めて作り上げた“菊人形”



福島県二本松市では藩政時代より菊の愛好者が多く、昭和初期から菊人形が街に飾られていました。その後、昭和30年から趣向を変え、福島県立霞ヶ城公園で「菊の祭典 二本松の菊人形」が開催されるようになりました。今回、新宿御苑菊花壇展に合わせて、特別に制作された“菊人形”をぜひご覧ください！

ー ピックアップ情報 ー

二本松の菊人形のことをもっと知りたい方はこちら！

● 菊人形などの詳しい説明を聞くことができます。

1日3回
11:00 / 13:00 / 15:00

場所：菊人形の前に
お集まりください。

※英語での説明もごさいます。

● 二本松市の特産品をご紹介します！



二本松市の隠れた逸品やこだわりの銘品などが勢ぞろい！

淡い甘味と小豆の風味がおいしい二本松名物「玉羊羹」や地元でも人気の「二本松の和菓子・洋菓子」をはじめ、菊人形グッズ(ぬいぐるみ・Tシャツ・ランチバッグ・缶バッジ・ステッカー)など、さまざまな物産品を豊富に取り揃えております。

● 菊花茶の試飲体験



写真提供：ピクス

ほんのりとした菊の香りがする花茶をお楽しみください。

※写真はイメージです。

※数に限りがございますので、無くなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。

● 福島県双葉郡 復興応援&チャレンジ！

楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町の魅力と復興に向けた思いをご紹介します。今年とれたての新米がもらえるクイズラリーも開催します！



<主催・協力>

主催：環境省、環境再生プラザ(環境省・福島県共同運営)

協力：二本松市

<お問い合わせ先> 環境再生プラザ


Tel: 024-529-5668 Mail: josen-plaza@env.go.jp

〒960-8031 福島県福島市栄町1-31-1F

皇室ゆかりの **新宿御苑**

菊花壇展

平成30年11月1日(木)～15日(木)



- 会場：新宿御苑内日本庭園
- 開催時間：9:00～16:00(閉園は16:30)
- 会期中は休園日なし
- 新宿御苑入園料：大人200円、小・中学生50円(11月3日無料開園日)
- お問い合わせ：03-3350-0151(新宿御苑サービスセンター)
<http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen>

アクセス

【新宿門まで】・JR「新宿駅」から徒歩10分・東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」から徒歩5分・都営新宿線、東京メトロ副都心線・丸ノ内線「新宿三丁目駅」から徒歩5分
【大木戸門まで】・東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」から徒歩5分
【千駄ヶ谷門まで】・JR「千駄ヶ谷駅」から徒歩5分・都営 大江戸線「国立競技場駅」から徒歩5分
