

福島地方環境事務所の最近の動き
(今週の福島)

【最近の動きのポイント】

- ・ 仮置場、特定復興再生拠点区域及び中間貯蔵施設について、報道機関への公開を行いました (2/21)

○ 除染・廃棄物対策関連

- ・ 双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です
- ・ 双葉町において双葉町体育館の建物部分解体工事が完了しました (2/14)

○ 中間貯蔵施設関連

- ・ 28 市町村から平成 30 年度の輸送を実施中です

< 除去土壌等の輸送の進捗状況 (2/19 時点) >

今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約 180 万 m ³	約 157.4 万 m ³	約 87.4%
累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約 1,400 万 m ³	約 235.9 万 m ³	約 16.8%

○ リスクコミュニケーション等関連

- ・ 自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です
- ・ 環境再生プラザでは「くるまぎカフェ ふくしま“みち”さがし 2019」を実施します (参加者募集中) (2/23)

0. 福島地方環境事務所

- 仮置場における除去土壌等の搬出状況、特定復興再生拠点区域の整備状況及び中間貯蔵施設の整備状況について、2月21日（木）に報道機関への公開を行いました。

I. 除染・廃棄物対策関連

1 特定復興再生拠点区域の解体・除染について

帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋等の解体・除染を実施しています。

- 最近の動き
 - ・ 双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です。
詳細は別添1、3のとおり
 - ・ 双葉町において双葉町体育館の建物部分解体工事が完了しました（2/14）。
これは、双葉町から建物解体申請を受けて実施しているもので、昨年12月6日から工事を進め、今般、建物部分解体作業が完了したものです。
別添4のとおり

2 避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について

帰還困難区域を除き、3月に8県100市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。

各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。

仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。

- 除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添1のとおり
- 特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添5のとおり

Ⅱ. 中間貯蔵施設関連

中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。

(1) 最近の動き

○ 28 市町村から平成 30 年度の輸送を実施中です。

○ 除去土壌等の輸送の進捗状況 (2/19 時点)

今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約 180 万 m ³	約 157.4 万 m ³	約 87.4%
累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約 1,400 万 m ³	約 235.9 万 m ³	約 16.8%


(2) 平成 30 年度の進捗状況

○ 除去土壌等の輸送

(2 月 19 日までの搬出実績)

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 (m ³)	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定量 (m ³)	今年度の 搬出済量(m ³)	累積 搬出済量 (m ³)
浜通り	いわき市	22,200	7,800	26,317	48,739
	相馬市	16,100	－	6,824	23,770
	南相馬市	113,200	－	91,341	121,066
	広野町	31,900	－	27,272	38,313
	楡葉町	72,400	－	75,116	114,838
	富岡町	162,400	－	144,503	187,952
	川内村	42,400	－	43,912	58,531
	大熊町	147,000	－	109,919	162,891
	双葉町	132,700	－	88,463	135,411
	浪江町	130,300	－	99,101	135,764
	葛尾村	71,400	－	73,365	89,894
	飯舘村	151,600	－	137,135	165,432
中通り	福島市	78,700	20,000	71,034	95,948
	郡山市	67,200	20,900	116,211	179,579
	白河市	33,800	100	38,100	62,661
	須賀川市	22,000	3,600	27,561	42,486
	二本松市	50,000	－	48,867	92,648
	田村市	47,800	300	47,542	76,617
	伊達市	62,600	6,000	56,663	77,605
	本宮市	20,600	－	20,162	43,447
	桑折町	19,200	－	15,944	32,625
	国見町	16,300	－	14,774	26,138
	川俣町	71,600	－	55,935	78,251

	大玉村	13,700	-	13,736	23,001
	鏡石町	0	300	323	7,980
	天栄村	16,100	-	14,249	23,958
	西郷村	54,900	-	54,163	75,252
	泉崎村	15,200	-	15,189	25,620
	中島村	6,400	-	5,845	14,150
	矢吹町	13,900	-	10,592	20,198
	三春町	24,400	-	23,364	40,982
	合計	1,728,000	59,000	1,573,522	2,358,897※

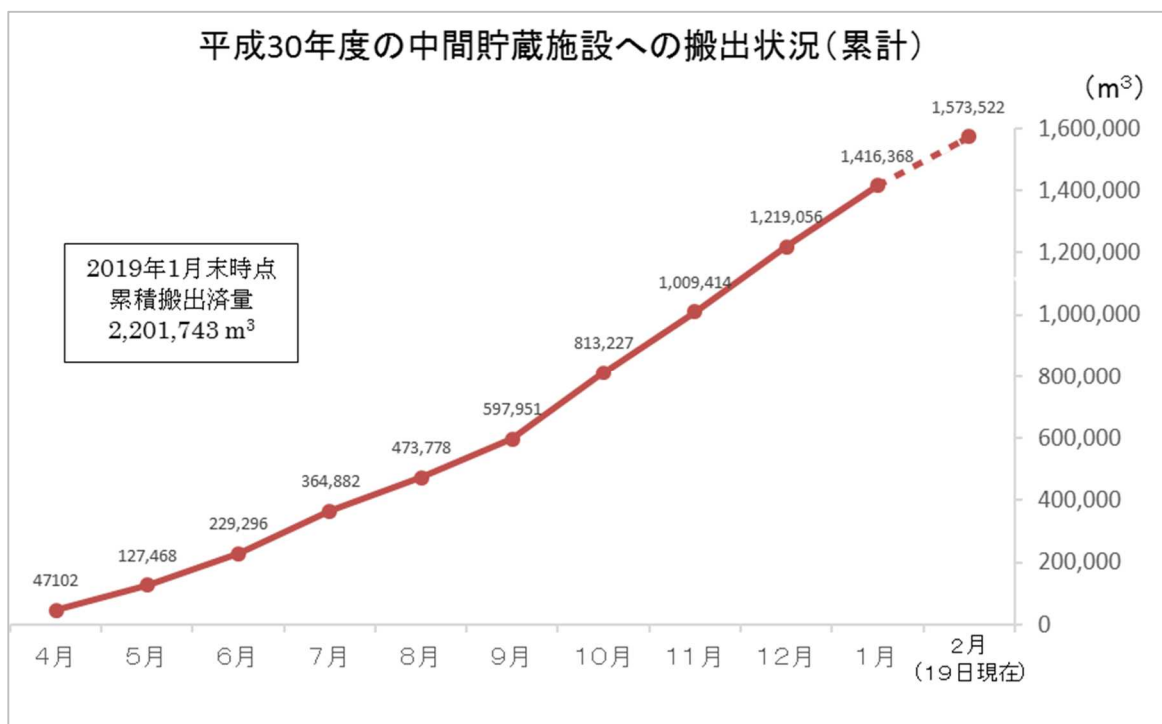

- ※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1 m³と換算しています。
- ※ 中間貯蔵施設への搬出済量（国直轄除染市町村：2018年8月末、市町村除染市町村：2018年6月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2018年8月末）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018年8月末時点、市町村除染：2018年6月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018年8月末時点、市町村除染：2018年6月末時点））の合計量。
- ※ 10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
- ※ 累積搬出済量の合計値には、2018年6月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。

- 中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
<http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba>
- 中間貯蔵施設に係る工事等について
工事等の一覧は別添 2 のとおり

Ⅲ. 放射線健康リスクコミュニケーション等関連

- ① 自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。

（１）最近の動き

- 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。
- 放射線を可視化するガンマカメラを活用した、住民向けリスクコミュニケーション支援事業を実施中です。
- 富岡町において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しています（2/20～23）。
- 震災後の福島で暮らす皆さんの不安や悩みになすびさんがお答えする「なすびのギモン パート 6」（第 1 回・第 2 回）が放送されました。
※放送された動画は、環境再生プラザのホームページでご覧いただけます。

<http://josen.env.go.jp/nasubinogimon/movie/>

（今後の放送予定）

第 3 回：平成 31 年 3 月 5 日（火）

第 4 回：平成 31 年 3 月 12 日（火）

- 環境再生プラザでは「くるまざカフェ ふくしま“みち”さがし 2019」開催します。参加者を募集中です（別添 6 のとおり）。

本イベントは、昨年 10 月および 11 月に実施した浜通り地方を訪ねる「ふくしま“みち”さがし」体験プログラムを通して感じた気付きを共有するトークセッションと来場されたみなさまと一緒に『未来に向かって、今できることは何か？』を考えるワークショップの 2 部構成となっています。

・日 時：2 月 23 日（土）13:00～16:30

・場 所：コラッセふくしま 4 F 多目的ホール（福島市三河南町 1 番 20 号）

http://josen.env.go.jp/plaza/about/communication/kurumaza/recruitment_190223/

(2) これまでの実施状況

(2月22日時点)

項 目		実施回数	
		H29 年度	今年度
① 自治体職員や相談員等の活動の支援	(ア) 職員向け研修会	77 回	35 回
	(イ) 専門家派遣	47 回	18 回
②住民の放射線に関する理解醸成の支援	(ア) 住民セミナー	72 回	37 回
	(イ) 車座意見交換会	62 回	53 回
	(ウ) 個人線量測定の実施(WBC)	83 日	82 日
	(エ) リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）による活動		
	(オ) ガンマカメラ活用リスクコミュニケーション支援事業	184 台・日	171 台・日
③環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）	(ア) 専門家派遣	142 件	143 件
	(イ) 移動展示	42 件 [55 日]	42 件 [58 日]

除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧
(除染特別地域、汚染廃棄物対策地域)

市町村	工事名
南相馬市	○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事 (H30/2/13～) ※H30. 3 月に着工 ○平成 30 年度南相馬市仮置場復旧等工事 (H31/1/23～) ※着工準備中 ○平成 30 年度南相馬市建物解体等撤去工事 (H30/8/8～) ※H30. 9 月に着工
浪江町	○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事 (H30/5/15～) ※H30. 7 月に着工 <u>○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 1) (H30/6/20～)</u> ※H30. 8 月に着工 <u>○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 2) (H31/1/29～)</u> ※着工準備中 ○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事 (H30/1/25～) ※H30. 3 月に着工 ○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事 (H30/4/11～) ※H30. 6 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請 (特定復興再生拠点区域) を受付中
双葉町	<u>○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 1) (H29/12/4～)</u> ※H29. 12 月に着工 <u>○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 2) (H30/1/10～)</u> ※H30. 2 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請を受付中
大熊町	○平成 30 年度 (平成 29 年度繰越) 大熊町仮置場復旧等工事 (H30/7/19～) ※H30. 8 月に着工 <u>○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 1) (H30/1/25～)</u> ※H30. 3 月に着工 <u>○平成 30 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 2) (H31/1/24～)</u> ※着工準備中 ○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事


市町村	工事名
富岡町	○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他) (H29/5/22～) ※H29.6 月に着工 ○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び <u>除染等工事(その 1)(H30/8/7～)</u> ※H30.8 月に着工 ○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事(その 2)(H29/12/27～) ※H30.3 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付中
檜葉町	○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)檜葉町仮置場復旧等工事(H30/7/5～) ※H30.8 月に着工 ○平成 30 年度檜葉町建物解体等撤去工事(H30/7/9～) ※H30.7 月に着工
飯舘村	○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)飯舘村仮置場復旧等工事(H30/4/10～) ※H30.4 月に着工 ○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び <u>除染等工事(H30/9/5～)</u> ※H30.9 月に着工 ○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事(H30/4/13～) ※H30.6 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付終了
川俣町	○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29～) ※H30.6 月に着工
葛尾村	○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事(その 2) (H30/6/20～) ※H30.7 月に着工 ○平成 30 年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去 等及び除染等工事(H30/10/9～) ※H30.11 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付中

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

中間貯蔵施設に係る工事等の一覧

	工事名
土壌貯蔵施設等	○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（双葉町）（H28/6/14～） ※H28.11 月に着工、H29.12 月貯蔵開始
	○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（大熊町）（H28/6/14～） ※H28.11 月に着工、H29.10 月貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～） ※H29.10 月に着工、H30.9 月貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/18～） ※H30.1 月に着工、来年度春に貯蔵開始見込み
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～） ※H29.11 月に着工、H30.7 月貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～） ※H29.9 月に着工、H30.7 月貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 3 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/18～） ※H29.11 月に着工、H30.10 月貯蔵開始
	○平成 30 年度中間貯蔵（双葉 3 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/6～） ※H30.9 月に着工
	○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 4 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/5～） ※H30.12 月に着工
	○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 5 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/10～） ※H30.10 月に着工
	○平成 30 年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事（双葉町）（H31/1/10～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事（大熊町）（H31/1/10～）
廃棄物関連施設	○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 1 業務（H30/3/1～） ※H31.1 月に着工、H31 年度内に稼働予定
	○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 2 業務（H30/3/1～） ※H31.1 月に着工、H31 年度内に稼働予定

	工事名
	○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/9～） ※H30.6 月に着工、H31 年度内に稼働予定
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/8～） ※H30.7 月に着工、H31 年度内に稼働予定
その他 施設等	○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町） （H29/12/23～）
	○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町）（H30/1/19～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事（H30/7/19～）
	○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/8/24～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町） （H30/10/25～）
	○平成 30 年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊町・双葉町） （H30/12/22～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事（双葉町）（H31/1/17～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事（大熊町）（H31/1/17～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（双葉町） （H31/1/19～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（大熊町） （H31/1/19～）

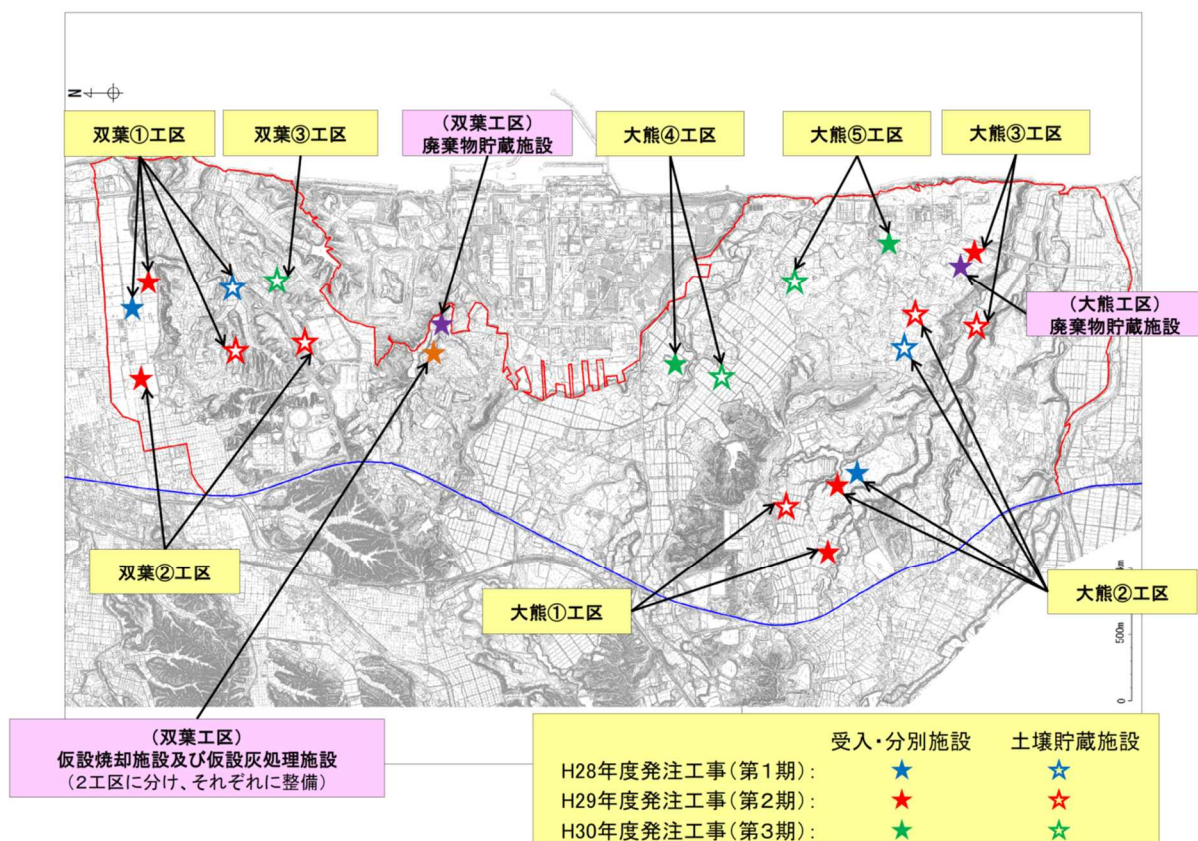


特定復興再生拠点区域整備の状況 (2019年2月22日時点)

別添 3

- 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
- 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備（除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から5年を目途に避難指示解除を目指す）。
- これまでに、以下6町村の計画が認定され、全ての町村において解体・除染等工事を実施中。


双葉町(2017.9.15認定、約560ha)

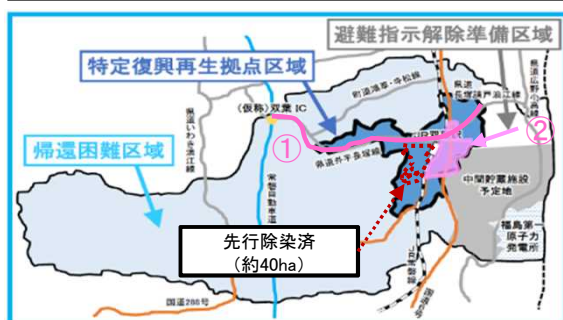

【工事状況】: 2017.12.25着工

- ①復興シンボル軸解体・除染等工事
(解体55件、除染約7ha): 実施中
- ②駅東等解体・除染等工事
(解体640件、除染約90ha): 実施中

大熊町(2017.11.10認定、約860ha)

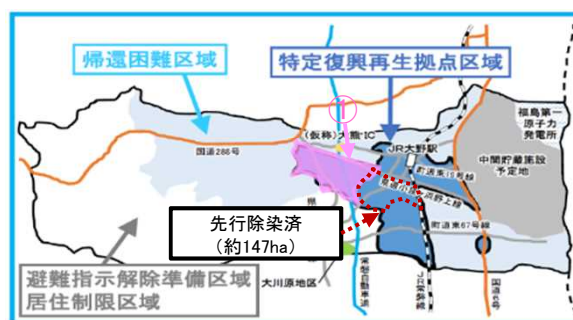

【工事状況】: 2018.3.9着工

- ①下野上地区の西エリアを中心とした解体・除染等工事
(解体460件、除染約160ha): 実施中

浪江町(2017.12.22認定、約660ha)



【工事状況】: 2018.5.30着工

- ①一部道路の除染等工事(除染約4ha): 完了
- ②3地区における解体・除染等工事
(解体60件、除染約30ha): 実施中


富岡町(2018.3.9認定、約390ha)



【工事状況】: 2018.7.6着工

- ①夜ノ森駅周辺の除染等工事(除染約0.3ha): 完了
- ②拠点北エリアの解体・除染等工事
(解体300件、除染約80ha): 実施中

飯舘村(2018.4.20認定、約190ha)

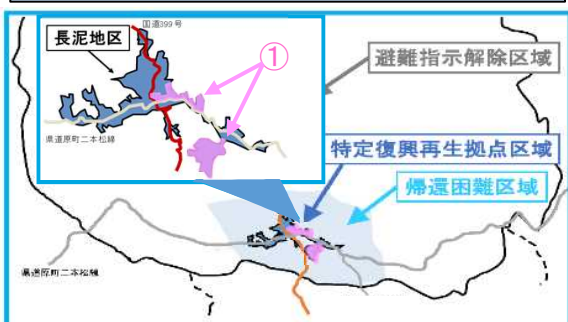

【工事状況】: 2018.9.28着工

- ①長泥地区の居住促進ゾーンを中心とした解体・除染等工事
(解体20件、除染約30ha): 実施中

葛尾村(2018.5.11認定、約95ha)



【工事状況】: 2018.11.20着工

- ①野行地区の解体・除染等工事
(解体10件、除染約0.5ha): 実施中

双葉町体育館(双葉町)の建物部分解体工事が完了しました

2018年12月6日に着手した双葉町復興再生拠点区域内に位置する双葉町体育館の建物部分解体工事を2019年2月14日に完了いたしました。

環境省では、今後も双葉町の復興に向け、双葉町復興再生拠点区域の建物解体及び除染工事に引き続き取り組んでまいります。



解体着手状況



建物部分解体完了

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

平成 31 年 2 月 22 日

【最新の進捗状況】


搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
2/13～2/19	917	59,651

※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】

搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
平成 29 年 11 月～平成 30 年 1 月	5,319	5,319
平成 30 年 2 月	2,523	7,842
平成 30 年 3 月	4,060	11,902
平成 30 年 4 月	4,965	16,867
平成 30 年 5 月	4,287	21,154
平成 30 年 6 月	5,615	26,769
平成 30 年 7 月	3,445	30,214
平成 30 年 8 月	2,504	32,718
平成 30 年 9 月	4,410	37,128
平成 30 年 10 月	5,804	42,932
平成 30 年 11 月	5,557	48,489
平成 30 年 12 月	4,723	53,212
平成 31 年 1 月	4,467	57,679
平成 31 年 2 月 (19 日まで)	1,972	59,651

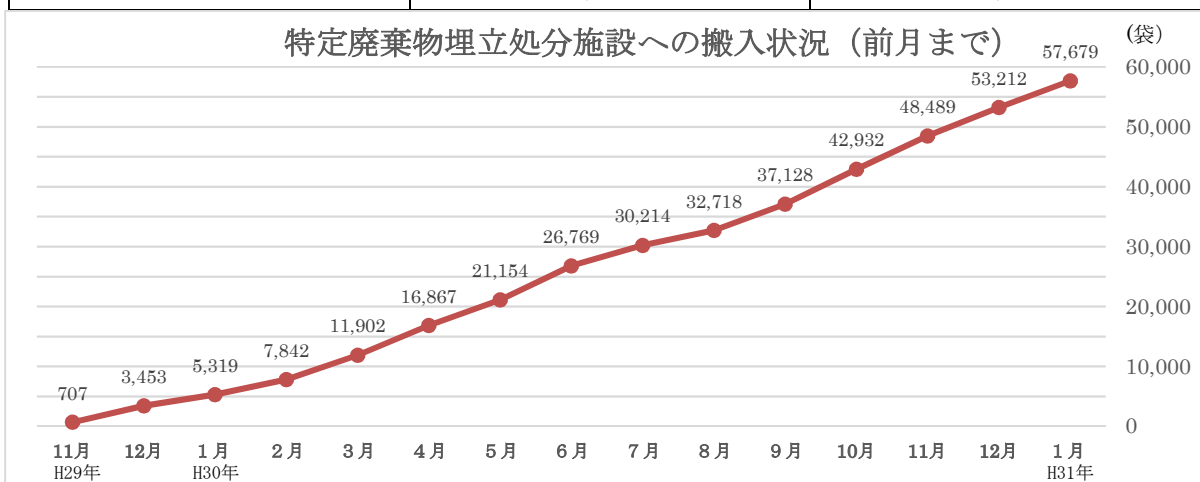

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。

http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/

参加者
募集中!

くるまざカフェ
ふくしま
みちさがし
2019

いま、そして未来へ、何ができるのか？
みんなで一緒に考えてみませんか

震災からまもなく8年が経過する福島。様々な地域・分野で一步步日常を取り戻す取り組みがなされています。
「ふくしま“みち”さがし」では、その地を訪れてきました。今回は、浜通りの浪江、富岡、楡葉の“みち”を探しました。

そこでの気づきを多くの方と共有し、これから進んでいく“みち”をみんなで考えていきます。

みんなで考えるイベントは、2015年から毎年実施しており今年で5回目になります。皆様のご参加をお待ちしています。

* “みち”とは、これまで知らなかったことの“未知”と、これからの福島の“道”の意味。くるまざカフェ企画は2013年よりはじまり、くる、まざる等の意味が込められています。

参加
無料

日時：2019年2月23日(土) 13:00～16:30 (開場12:30)

会場：コラッセふくしま 4F多目的ホール (福島県福島市三河南町1番20号)

プログラム 第一部 トークセッション

昨年の10月と11月に開催されたふくしま“みち”さがし体験プログラムを通して、
現地を巡り感じた気づきをみなさまと共有します。

テーマ① 「避難指示解除後の暮らしを知る」



ファシリテーター：

越智 小枝 さん

(東京慈恵会医科大学 臨床検査医学講座 講師)

スピーカー：

岡 洋子 さん(OCAFE) 石井 絹江 さん(石井農園) etc.

テーマ② 「地域産業の再生の可能性を考える」



ファシリテーター：

開沼 博 さん

(立命館大学 衣笠総合研究機構 准教授)

スピーカー：

佐々木 邦浩 さん(富岡町役場)
遠藤 秀文 さん(株式会社ふたば) etc.

プログラム 第二部 ワークショップ

4つのブースに分かれ、来場者のみなさまと一緒に、
「未来に向かって、今できることは何か？」を考えます。

お申込み (事前申込制)

お申込み先：環境再生プラザ(福島県・環境省共同運営)

TEL 024-529-5668

Mail josen-plaza@env.go.jp

◎お名前、お住まいの市町村、年齢をお知らせください。

詳細は、

くるまざカフェ

検索

主催：環境再生プラザ(福島県・環境省共同運営)
後援(予定)：福島民報社・福島民友新聞社・福島テレビ・福島中央テレビ・
福島放送・テレビユー福島・ラジオ福島・ふくしまFM
