

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

令和元年 12 月 6 日

今年度の輸送対象物量は 400 万 m³としています。安全を第一に除去土壌等の輸送を行っていきます。

(1) 除去土壌等の輸送の進捗状況 (11/30 時点)

今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約 400 万 m ³	約 240.1 万 m ³	約 60.0%

累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約 1,400 万 m ³	約 502.5 万 m ³	約 35.9 %

(2) 令和元年度の進捗状況


○ 除去土壌等の輸送

(11 月 30 日までの搬出実績)

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 (m ³)	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定量 (m ³)	今年度の 搬出済量(m ³)	累積 搬出済量 (m ³)
浜通り	いわき市	50,000	10,000	54,861	110,800
	相馬市	39,000		27,073	60,334
	南相馬市	274,000	8,000	160,525	306,226
	広野町	67,000		50,253	95,707
	檜葉町	149,000		95,305	215,375
	富岡町	406,000		219,503	430,777
	川内村	96,000		33,913	92,604
	大熊町	342,000		114,807	298,912
	双葉町	312,000		22,492	175,065
	浪江町	353,000		284,883	450,614
	葛尾村	168,000		123,034	221,860
飯舘村	395,000		187,898	366,923	
中通り	福島市	198,000	78,000	210,150	327,113
	郡山市	153,000		186,952	385,364
	白河市	63,000		50,756	118,891
	須賀川市	53,000		24,803	73,808
	二本松市	113,000		70,697	168,962
	田村市	101,000		48,508	127,125
	伊達市	85,000	4,000	55,052	138,405
	本宮市	58,000		41,308	87,261
桑折町	43,000		27,454	65,727	

	国見町	39,000		18,735	47,250
	川俣町	163,000		108,409	192,001
	大玉村	26,000		12,752	38,013
	天栄村	34,000		25,004	51,332
	西郷村	125,000		96,342	176,525
	泉崎村	18,000		14,884	42,157
	矢吹町	10,000		10,559	32,260
	三春町	47,000		24,023	68,697
	合計	3,980,000	100,000	2,400,935	※5,025,368

2019年度の中間貯蔵施設への搬出状況(累計)

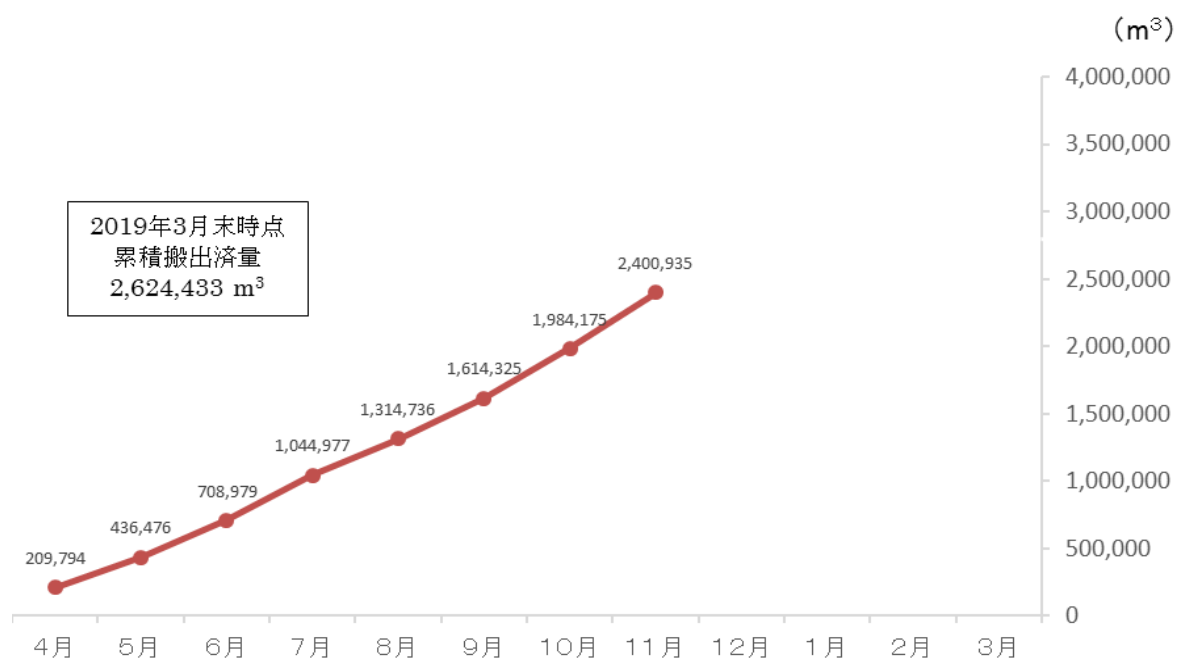

※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m³と換算しています。

※ 輸送対象物量1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬入済量(国直轄除染市町村:2019年8月末時点、市町村除染市町村:2019年6月末時点、両者混在市町村(南相馬市、川内村、田村市、川俣町):2019年8月末時点)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点)及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点))の合計量(2019年10月末集計)。

10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した(発生することが見込まれる)除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2019年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
