

再福
生島

国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

概要

- ・ 2016年3月に、帰還困難区域を除いて、津波がれきの撤去と仮置場への搬入を完了しています。
- ・ 被災家屋等の解体関連受付・調査を行い、順次解体撤去を実施中です。
- ・ 片付けごみの処理についてステーション回収や戸別回収訪問を実施しています。



大熊町の仮設焼却施設




被災家屋等の解体の様子

対策地域内廃棄物等の仮置場への搬入済量等

- ・ 災害廃棄物等の仮置場への搬入については、5月末時点で、約305万トンの搬入を完了しました（うち、約53万トンが焼却処理済、約191万トンが再生利用済）。

2021年5月末時点

仮置場搬入済量	(うち、焼却処理済量)	(うち、再生利用済量)
約305万トン	(約53万トン)	(約191万トン)

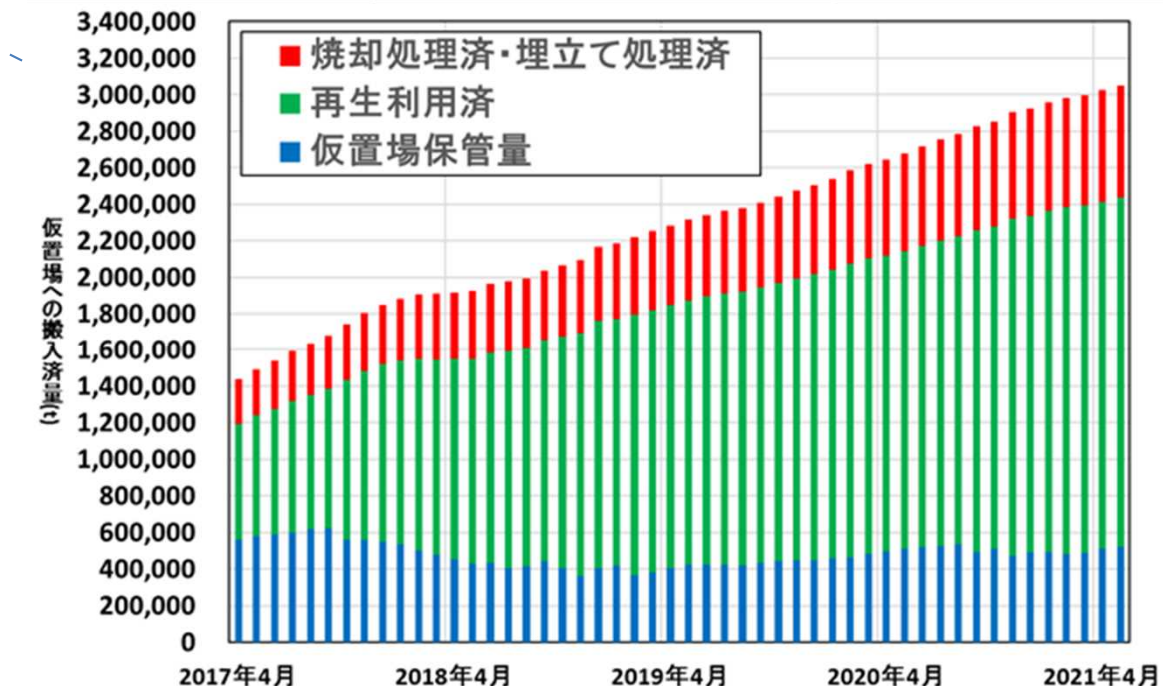

注) 仮置場へ搬入せずに処理する量も含む。

各市町村における被災家屋等の解体進捗状況

2021年5月末時点

- 被災家屋について、5月末時点で、約17,300件の解体撤去申請を受付済みであり、約16,600件を解体撤去済みです。

市町村	解体受付 申請件数 ※	解体済件数	解体申請 受付状況
南相馬市	2,634	2,634	完了
浪江町	4,422	4,239	特定復興再生拠点 区域受付中
特定復興再生拠点区域	418	274	
双葉町	1,072	874	特定復興再生拠点 区域受付中
特定復興再生拠点区域	1,028	839	
大熊町	1,463	1,221	特定復興再生拠点 区域受付中
特定復興再生拠点区域	1,333	1,096	
富岡町	3,672	3,563	特定復興再生拠点 区域受付中
特定復興再生拠点区域	787	678	
楡葉町	1,557	1,557	完了
飯舘村	1,550	1,549	受付終了
特定復興再生拠点区域	90	89	
川俣町	329	329	完了
葛尾村	484	484	完了
特定復興再生拠点区域	47	47	
田村市	19	19	完了
川内村	102	102	完了
合計	17,304	16,571	

注：1) ※当初申請数から取り下げ件数を除いた件数です。
2) 特定復興再生拠点区域の件数は総数の内数です。
