



中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

概要

- 安全を第一に除去土壌等の輸送を行っています。
- 2015年3月より除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を開始しました。
- 除去土壌等の仮置場からの中間貯蔵施設への輸送は10tダンプトラックを基本に実施しています。
- 輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施しています。



輸送車両の走行状況



中間貯蔵施設からゲートを通して
退域する輸送車両


除去土壌等の輸送の進捗状況

・2021年12月末時点で、累積約1,246万 m^3 （全体の約89.0%）の除去土壌等を中間貯蔵施設へ輸送しました。

輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約1,400万 m^3	約1,246万 m^3	約89.0%

累積搬出済量（2015年3月～）

（万 m^3 ）

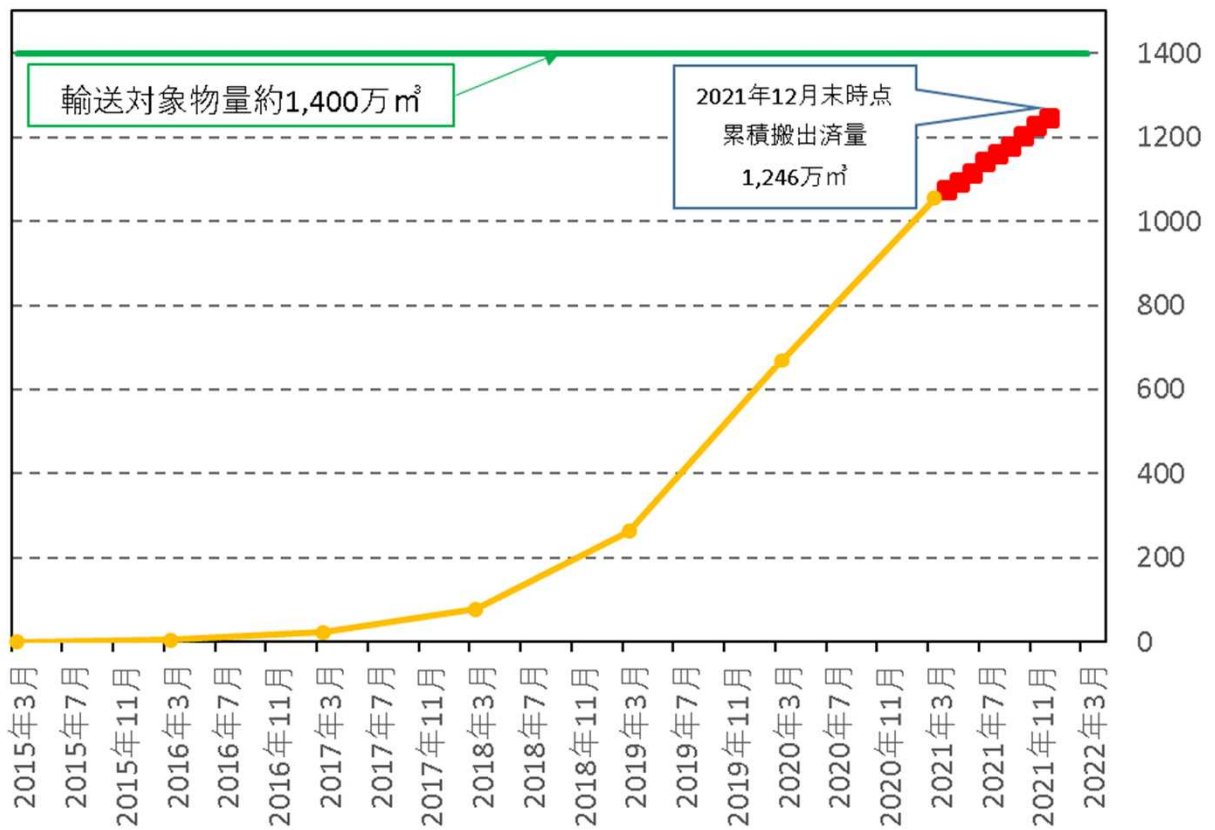

<参考>

各市町村ごとの除去土壌等の輸送

2021年12月末時点の搬出実績

市町村		今年度の搬出 予定量(m ³)	今年度の搬出 済量(m ³)	累積搬出済量 (m ³)
浜通り	いわき市	23,000	17,677	213,262
	南相馬市	6,000	31,606	988,597
	富岡町	375,000	285,407	1,322,860
	大熊町	130,000	91,866	668,359
	双葉町	93,000	40,065	405,889
	浪江町	250,000	149,134	1,213,777
	葛尾村	63,000	63,927	473,682
	飯舘村	395,000	168,444	1,026,567
中通り	福島市	320,000	256,380	1,053,283
	郡山市	188,000	174,762	892,799
	白河市	70,000	74,367	294,895
	須賀川市	53,000	40,751	195,722
	二本松市	101,000	91,583	438,979
	伊達市	28,000	23,732	269,593
	本宮市	46,000	27,864	209,356
	川俣町	191,000	164,742	618,958
	西郷村	203,000	200,089	688,596
	泉崎村	1,000	1,177	46,025
合計		2,536,000	1,903,573	※ 12,455,905

※ フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m³と換算しています。

※ 輸送対象物量約1,400万m³は、中間貯蔵施設への搬入済量(国直轄除染市町村:2019年8月末時点、市町村除染市町村:2019年6月末時点、両者混在市町村(南相馬市、川内村、田村市、川俣町):2019年8月末時点)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点)及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量(国直轄除染:2019年8月末時点、市町村除染:2019年6月末時点))の合計量(2019年10月末集計)。

10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した(発生することが見込まれる)除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬出済量の合計値には、2021年3月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
