



データでみる福島再生

最近の動き

○除染等工事の進捗状況

- ・特定帰還居住区域では、大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、南相馬市において除染・解体を実施しています。2026年7月末時点で、約784haの除染を完了しました。

○除染仮置場等の状況（福島県内）

- ・仮置場等総数1,372箇所のうち、10箇所で除去土壌等を保管中、1,362箇所で搬出が完了し、1,314箇所の仮置場で原状回復が完了しました。

○中間貯蔵施設の整備の現状

- ・除去土壌の分別処理を行い、8月末時点で、約1,201万 m^3 （輸送量ベース）の土壌を土壌貯蔵施設に貯蔵しました。
- ・廃棄物の焼却及び焼却灰の灰処理を行い、8月末時点で、灰処理ばいじんを封入した鋼製角形容器38,193個を廃棄物貯蔵施設に貯蔵しました。

○中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

- ・2026年8月末時点で、約1,447万 m^3 の除去土壌等（帰還困難区域を含む）を中間貯蔵施設へ搬入しました。

○中間貯蔵施設用地の状況

- ・用地取得については、8月末時点で契約者数1,990人、面積約1,321haについて契約しております。

○国直轄による特定廃棄物の処理進捗状況

- ・特定帰還居住区域の解体申請を受付中（4町）です。
- ・被災家屋等について、7月末時点で、約19,700件の解体申請を受付済であり、約18,900件を解体済です。
- ・対策地域内廃棄物等の処理について、7月末時点で約33万トンが埋立処分済、約62万トンが焼却処理済です。
- ・福島県内の指定廃棄物については、6月末時点で約50万トンを特定廃棄物埋立処分施設等で処分、中間貯蔵施設で保管または仮設減容化施設で処理等しています。

○国直轄による対策地域内における仮設焼却施設の焼却処理状況

- ・7月末時点で、約163万トン（除染廃棄物を含む）を各仮設焼却施設で処理しました。

○クリーンセンターふたばの埋立状況

- ・7月末時点で、40,049袋をクリーンセンターふたばに埋め立てました。

○特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

- ・8月末時点で、296,999袋を特定廃棄物埋立処分施設へ埋め立てしました。
- ・特定廃棄物埋立処分施設への特定廃棄物の埋立ては、2023年10月31日が最終埋立日となり、無事終了しました。

○放射線に関するリスクコミュニケーション活動状況（8月実施）

- ・放射線リスクコミュニケーション相談員支援センターにおいて、専門家派遣を1回、車座意見交換会を4回、放射線教育の支援を2回実施しました。
- ・環境再生プラザにおいて、専門家派遣を2回、移動展示を1回（1日）実施しました。
- ・内部被ばく検査（WBC）を1回（1日）実施しました。

○帰還困難区域等における鳥獣の捕獲状況

- ・2026年度の捕獲数は、8月末現在でイノシシ261頭、アライグマ313頭、ハクビシン55頭となっています。

特定復興再生拠点区域
及び特定帰還居住区域の進捗状況

概要

特定復興再生拠点区域


2017年の福島復興再生特別措置法改正により、市町村長が、帰還困難区域の中に、住民・移住者の生活及び地域経済再建の拠点（新しいまちづくり）となる「特定復興再生拠点区域」（拠点区域）を設定できる制度が創設されました。

計画が認定された6町村において除染や家屋解体とインフラ整備を集中的に進め、2023年11月までに全ての特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されました。

特定帰還居住区域

2023年の福島復興再生特別措置法改正により、市町村長が、拠点区域外において、避難指示解除による住民の帰還と帰還後の生活再建を目指す「特定帰還居住区域」を設定できる制度が創設されました。

計画が認定された6市町村において除染や家屋解体、インフラ整備を進めています。

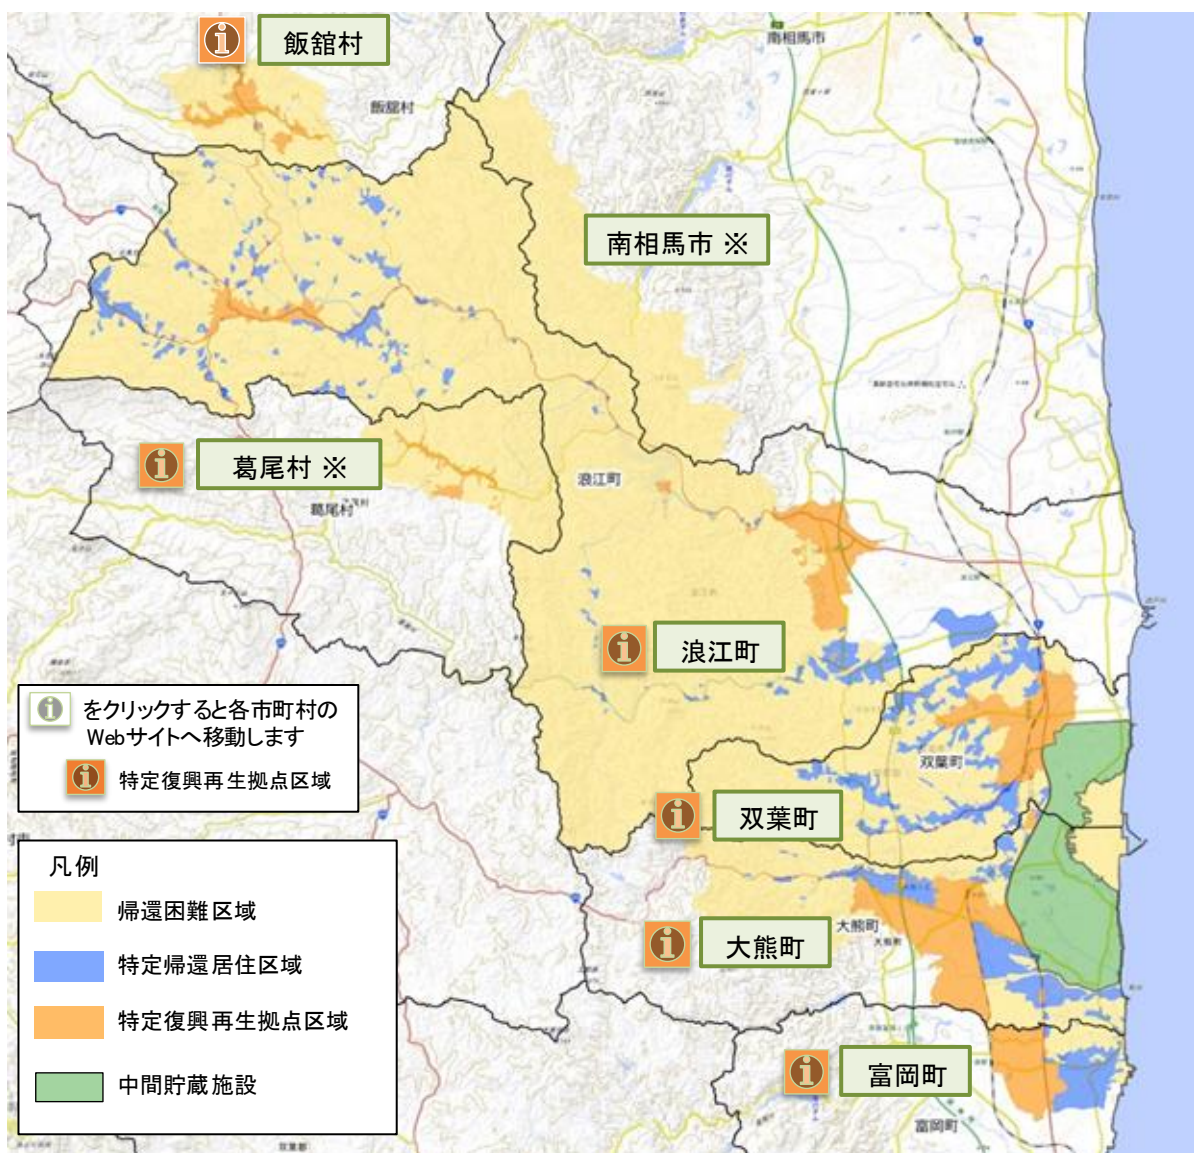

※南相馬市、葛尾村の特定帰還居住区域復興再生計画に基づく区域図は個人宅の特定につながるため非公開。

特定復興再生拠点区域

除染工事は概ね完了しています。引き続き残る区域の除染に取り組んでいます。

町村名	認定日	着工日	避難指示 解除日	除染対象面積 (ha)	除染完了面積 (ha)
双葉町	2017. 9.15	2017.12.25	2022.8.30	451	441
大熊町	2017.11.10	2018. 3. 9	2022.6.30	753	740
浪江町	2017.12.22	2018. 5.30	2023.3.31	493	489
富岡町	2018. 3. 9	2018. 7. 6	2023.4.1 〔点・線拠点〕 2023.11.30	319	312
飯舘村	2018. 4.20	2018. 9.28	2023.5.1	114	114
葛尾村	2018. 5.11	2018.11.20	2022.6.12	79	79
合 計				2,208	2,174

※除染対象面積は、特定復興再生拠点区域のうち、仮置場、生活圏から20m以上離れた森林等を除く面積です。
※四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。
※数値は速報値のため、今後更新する場合があります。

特定帰還居住区域

除染工事の進捗状況は以下のとおりです。引き続き除染工事を進めていきます。

市町村名	認定日	着工日	計画期間	除染対象面積 (ha)	除染完了面積 (ha)
大熊町	2023. 9.29	2023.12.20	2029.12.31まで	471	216
	2024.2.2 (変更)				
	2026.3.24 (変更)				
双葉町	2023.9.29	2023.12.20	2029.12.31まで	530	85
	2024.4.23 (変更)				
	2026.2.13 (変更)				
浪江町	2024.1.16	2024.6.20	2029.12.31まで	828	394
	2025.3.18 (変更)				
富岡町	2024.2.16	2024.9.5	2029.12.31まで	155	90
	2026.2.13 (変更)				
南相馬市	2025.3.18	2026.4.6	2029.12.31まで	4	0
葛尾村	2025.7.29	未定	2029.12.31まで	6	着工前
	2026.3.24 (変更)				
合 計				1,994	784

※除染対象面積は、特定帰還居住区域のうち、仮置場、生活圏から20m以上離れた森林等を除く面積です。
※四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。
※数値は速報値のため、今後更新する場合があります。


福島県内の除染仮置場等の状況

概要

- ・ 除染で取り除いた除去土壌等は、仮置場等の一時的な保管場所で適正に管理しています。
- ・ 保管をしている除去土壌等は、中間貯蔵施設又は仮設焼却施設等へ搬出します。
- ・ 搬出が完了した仮置場については、順次、遮へい土のう等の搬出・活用を始め、原状回復工事を行った後に、土地所有者へ返地します。

● 仮置場等での搬出～原状回復～返地までの流れ


保管

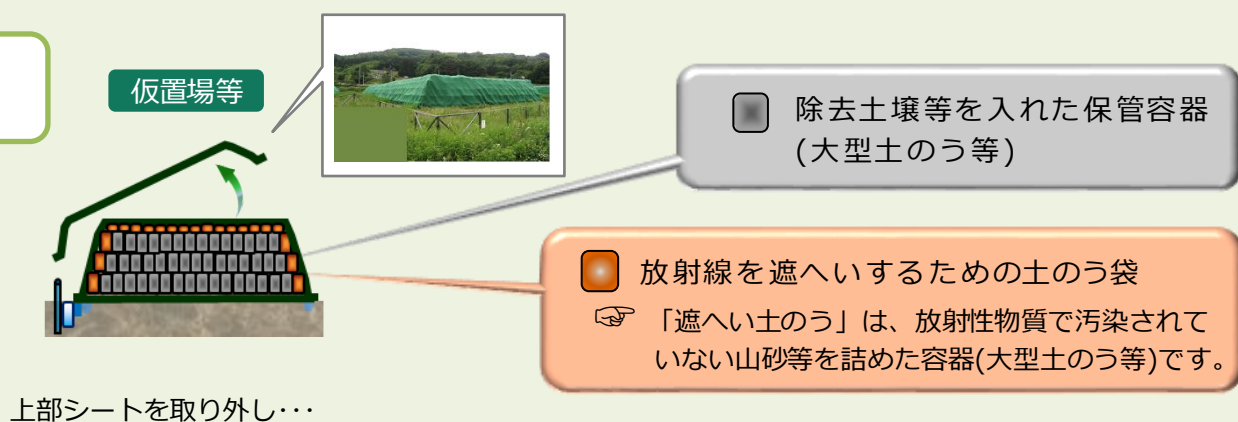

搬出



原状回復

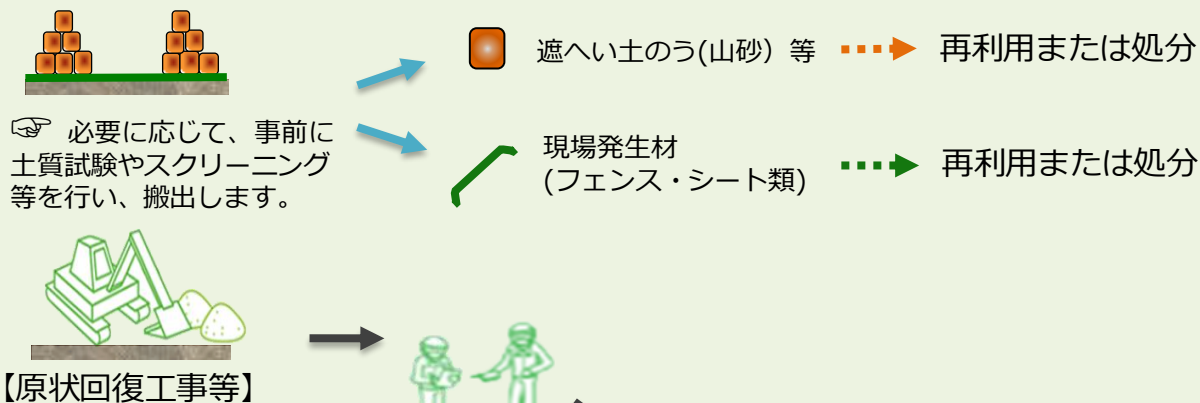

返地

原状回復工事後の状態確認や、放射線量の計測をします。

【土地所有者へ返地】

【営農再開など】



仮置場等の状況

- ・仮置場等総数1,372箇所のうち、10箇所ですべて除去土壌等を保管中、1,362箇所ですべて搬出が完了し、1,314箇所の仮置場で原状回復が完了しました。

（直轄除染 2026年 7月末時点 市町村除染 2026年 7月末時点）	仮置場等の総数	うち 保管中	うち 搬出完了	うち 原状回復完了 （返地済み）
除染特別地域 （直轄除染）	331	10	321 （97.0%）	278 （84.0%）
汚染状況重点 調査地域等 （市町村除染）	1,041	0	1,041 （100.0%）	1,036 （99.5%）
合計	1,372	10	1,362 （99.3%）	1,314 （95.8%）

注1)

仮置場等：仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含みます。

注2)

保管中：除去土壌等が保管されている仮置場等を示します。

注3)

搬出完了：除去土壌等の搬出が完了した仮置場等を示します。

注4)

原状回復完了：原状回復等が完了した仮置場等を示します。

注5)


搬出完了及び原状回復完了の欄に記載の（ %）は、仮置場等の総数に対する割合を示します。

(出典) 汚染状況重点調査地域等（市町村除染）は、「市町村が設置する仮置場等の状況について（2026年8月26日福島県生活環境部中間貯蔵・除染対策課 HP更新）」より環境省作成。

●保管中仮置場等の箇所数の推移

(2026年7月末時点)

(箇所)

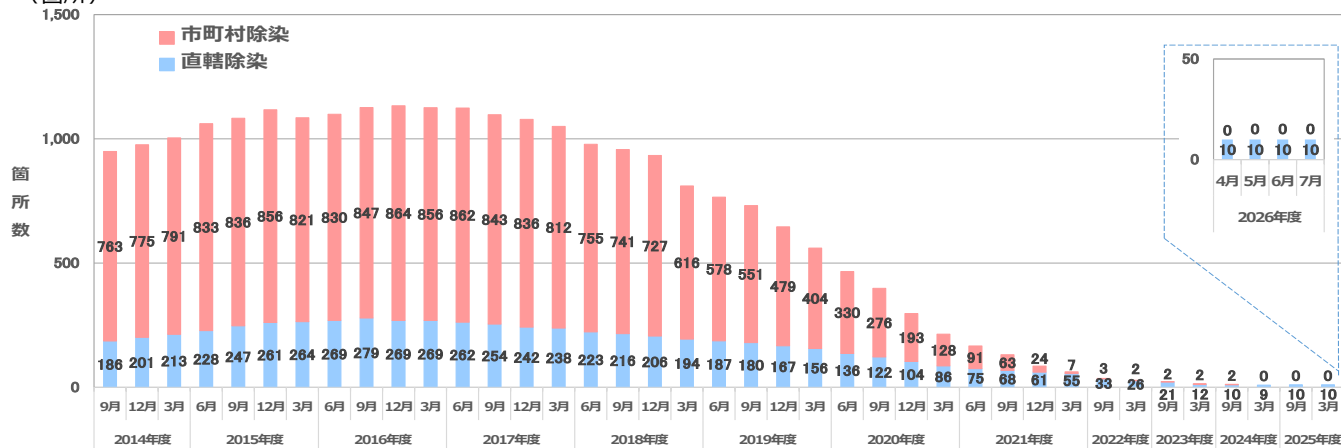


※仮置場の統合等により公表当時の数値とは異なります。

※市町村除染の2018年3月時点以前については、返地前の仮置場等数（「その他の仮置場」は除く）です。

●原状回復が完了した仮置場等の箇所数の推移

(2026年7月末時点)

(箇所)

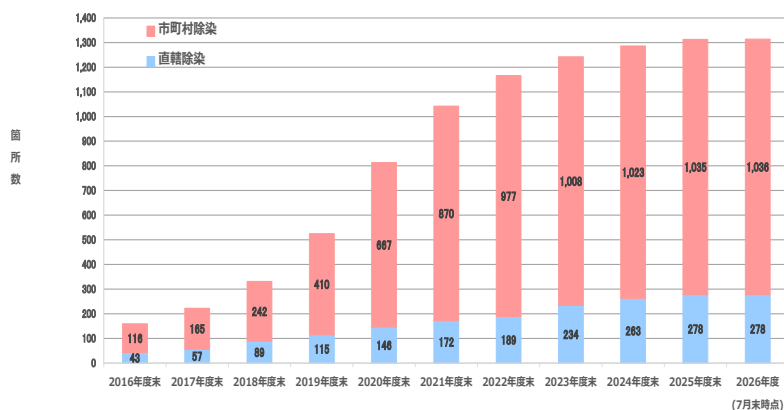


除染特別地域（直轄除染）における仮置場等の状況

●除染特別地域（直轄除染）の市町村別状況

市町村	仮置場等の総数	うち 保管中	うち 搬出完了	うち 原状回復完了
田村市	6	0	6	6
川内村	2	0	2	2
檜葉町	25	0	25	23
大熊町	18	2	16	15
川俣町	43	0	43	37
葛尾村	36	0	36	35
飯舘村	104	1	103	85
南相馬市	18	0	18	12
浪江町	46	4	42	40
富岡町	22	2	20	14
双葉町	11	1	10	9
合計	331	10	321	278

注1） 網掛けは、除染特別地域の指定を解除された市町村です。

●保管中仮置場等箇所数と保管物数の推移

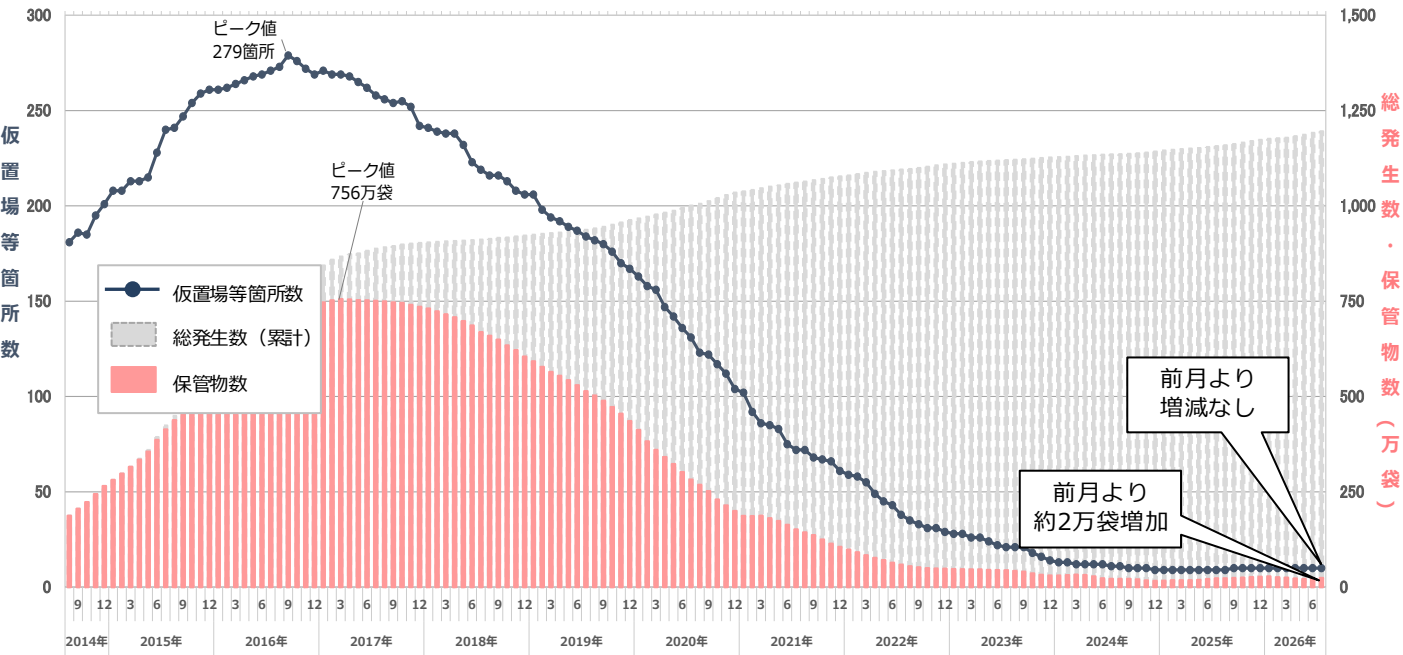

直近1年間の推移

	2025年					2026年						
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
仮置場等箇所数（箇所）	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
総発生数（累計）（万袋）	1,159	1,162	1,166	1,170	1,173	1,176	1,177	1,179	1,183	1,187	1,191	1,196
保管物数（万袋）	23	24	25	26	27	28	26	25	23	22	23	24

注1） 仮置場等箇所数: 除去土壌等を保管している仮置場等の箇所数を示します。

注2） 保管物数 : 仮置場等で保管している数で、単位は「袋」で1袋当たりの保管物の体積は、おおむね1 m³です。
（ただし、保管物の体積減少により、1袋が1 m³より小さくなる場合もあります）

注3） 除去土壌等の総発生数約1,196万袋の内訳は、保管物数約24万袋、搬出済み数 約1,171万袋です。
（うち仮設焼却炉への搬出は約319万袋、中間貯蔵施設等への搬出は約852万袋）
※数値は四捨五入して表記しているため、合計値は表示上の数字の合計と一致するとは限りません。

<参考>

汚染状況重点調査地域等（市町村除染）における仮置場等の状況

方部	市町村	仮置場等の 総数	うち 保管中	うち 搬出完了	うち 返地済み
県北	福島市※	46	0	46	46
	二本松市※	353	0	353	353
	伊達市※	120	0	120	120
	本宮市※	25	0	25	23
	桑折町※	38	0	38	38
	国見町※	11	0	11	11
	川俣町	22	0	22	22
県中	大玉村※	13	0	13	13
	郡山市※	35	0	35	35
	須賀川市※	100	0	100	100
	田村市※	100	0	100	100
	鏡石町※	4	0	4	4
	天栄村※	14	0	14	14
	石川町※	1	0	1	1
	玉川村※	1	0	1	1
	平田村※	1	0	1	1
	浅川町※	0	0	0	0
	古殿町※	1	0	1	1
	三春町※	6	0	6	6
県南	小野町※	3	0	3	3
	白河市※	11	0	11	11
	西郷村※	3	0	3	1
	泉崎村※	6	0	6	6
	中島村※	1	0	1	1
	矢吹町※	4	0	4	4
	棚倉町※	12	0	12	12
	矢祭町※	0	0	0	0
会津	埴町※	1	0	1	1
	鮫川村※	1	0	1	1
	会津若松市	1	0	1	1
	猪苗代町	6	0	6	6
	会津坂下町※	1	0	1	1
	湯川村※	1	0	1	1
	柳津町※	0	0	0	0
	三島町※	0	0	0	0
南会津	昭和村※	1	0	1	1
	会津美里町※	1	0	1	1
相双	下郷町	1	0	1	1
	南会津町	0	0	0	0
	新地町※	1	0	1	1
	相馬市※	5	0	5	5
	南相馬市	38	0	38	37
いわき	広野町	1	0	1	1
	川内村	10	0	10	10
合計		1,041	0	1,041	1,036

（2026年7月末時点）

注1) 「市町村が設置する仮置場等の状況について（2026年8月26日 福島県生活環境部中間貯蔵・除染対策課 HP更新）」より環境省が作成しています。

注2) 網掛けは、汚染状況重点調査地域に指定されていない市町村です。「※」は、指定解除された市町村です。

注3) 保管中 : 除去土壌等が保管されている仮置場等を示します。


注4) 搬出完了 : 除去土壌等の搬出が完了した仮置場等を示します。

注5) 返地済み : 原状回復等が完了し、所有者へ返地した仮置場等を示します。

中間貯蔵施設の整備の現状

概要


- 福島県内の除染に伴い発生した放射性物質を含む土壌・廃棄物及び福島県内に保管されている10万ベクレル/kgを超える焼却灰等を最終処分するまでの間、適切に管理する施設として中間貯蔵施設を整備しています。
- 2016年11月に、大熊町・双葉町において、受入・分別施設、土壌貯蔵施設の整備に着手しました。
- 2017年6月に除去土壌等の分別処理を開始し、分別した土壌について、大熊町では2017年10月、双葉町では2017年12月から土壌貯蔵施設への貯蔵を開始しました。
- 特定帰還居住区域等の除染に伴い発生する除去土壌等に対応するため、新たに受入・分別施設（大熊町・双葉町各1基）の整備を進めています。

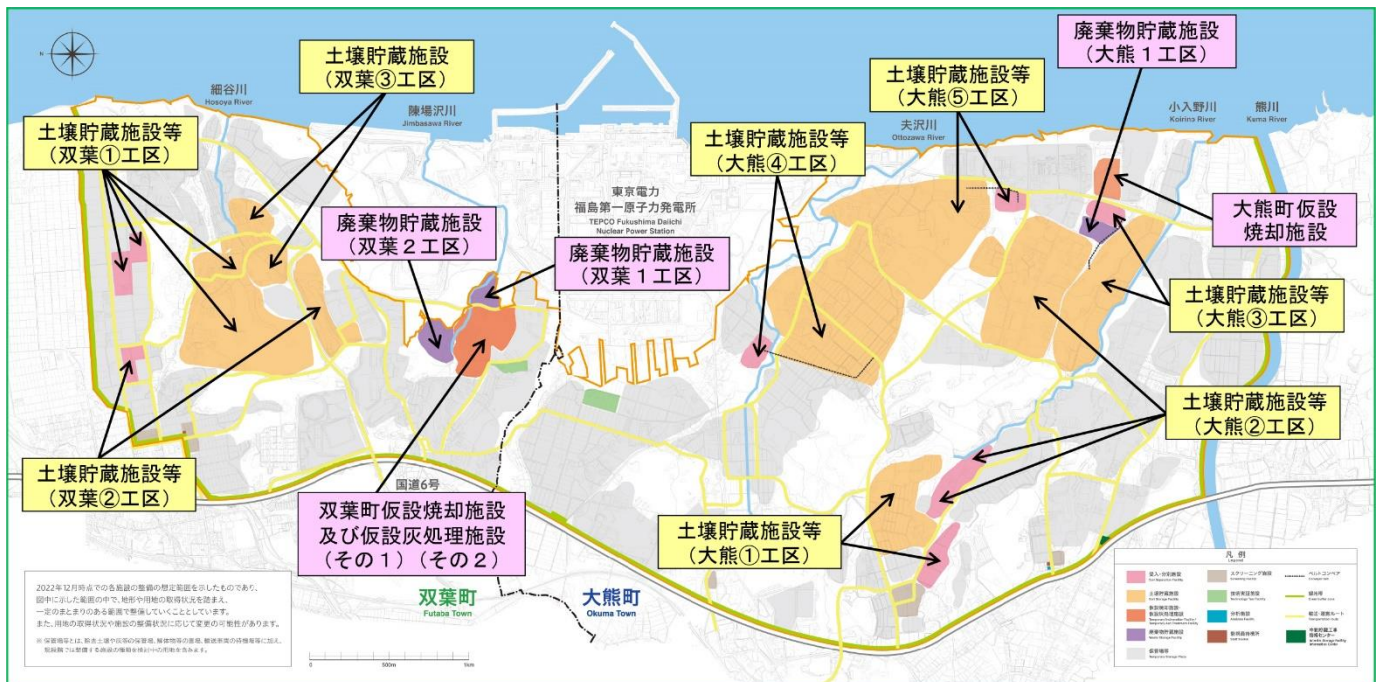

・除去土壌の分別処理を行い、8月末時点で、約1,201万³m（輸送量ベース）の土壌を土壌貯蔵施設に貯蔵しました。

工区	大熊①工区	大熊②工区	大熊③工区	大熊④工区	大熊⑤工区	双葉①工区	双葉②工区	双葉③工区
貯蔵容量※1	約103万 ³ m	約297万 ³ m※2	約167万 ³ m※2,3	約180万 ³ m	約269万 ³ m※2,3	約105万 ³ m※2,3	約85万 ³ m	約77万 ³ m※2,3
貯蔵量※1	約103万 ³ m	約289万 ³ m	約167万 ³ m	約171万 ³ m	約221万 ³ m	約102万 ³ m	約85万 ³ m	約63万 ³ m
土壌貯蔵施設スケジュール	2018年7月 貯蔵開始 2023年1月 貯蔵完了	2017年10月 貯蔵開始 (暫定キャッピング中)	2018年10月 貯蔵開始 (暫定キャッピング中)	2020年3月 貯蔵開始 (暫定キャッピング中)	2019年4月 貯蔵開始 (暫定キャッピング中)	2017年12月 貯蔵開始 (暫定キャッピング中)	2019年5月 貯蔵開始 2022年9月 貯蔵完了	2019年12月 貯蔵開始 (暫定キャッピング中)

※1 貯蔵容量及び貯蔵量は、仮置場等からの輸送量ベース（1袋＝1³mで換算）であり締め固め前。
※2 今後、必要に応じ堰堤を造成し、容量を増やす予定の工区。
※3 ※2のうち現行工事において堰堤の造成を行う工区。

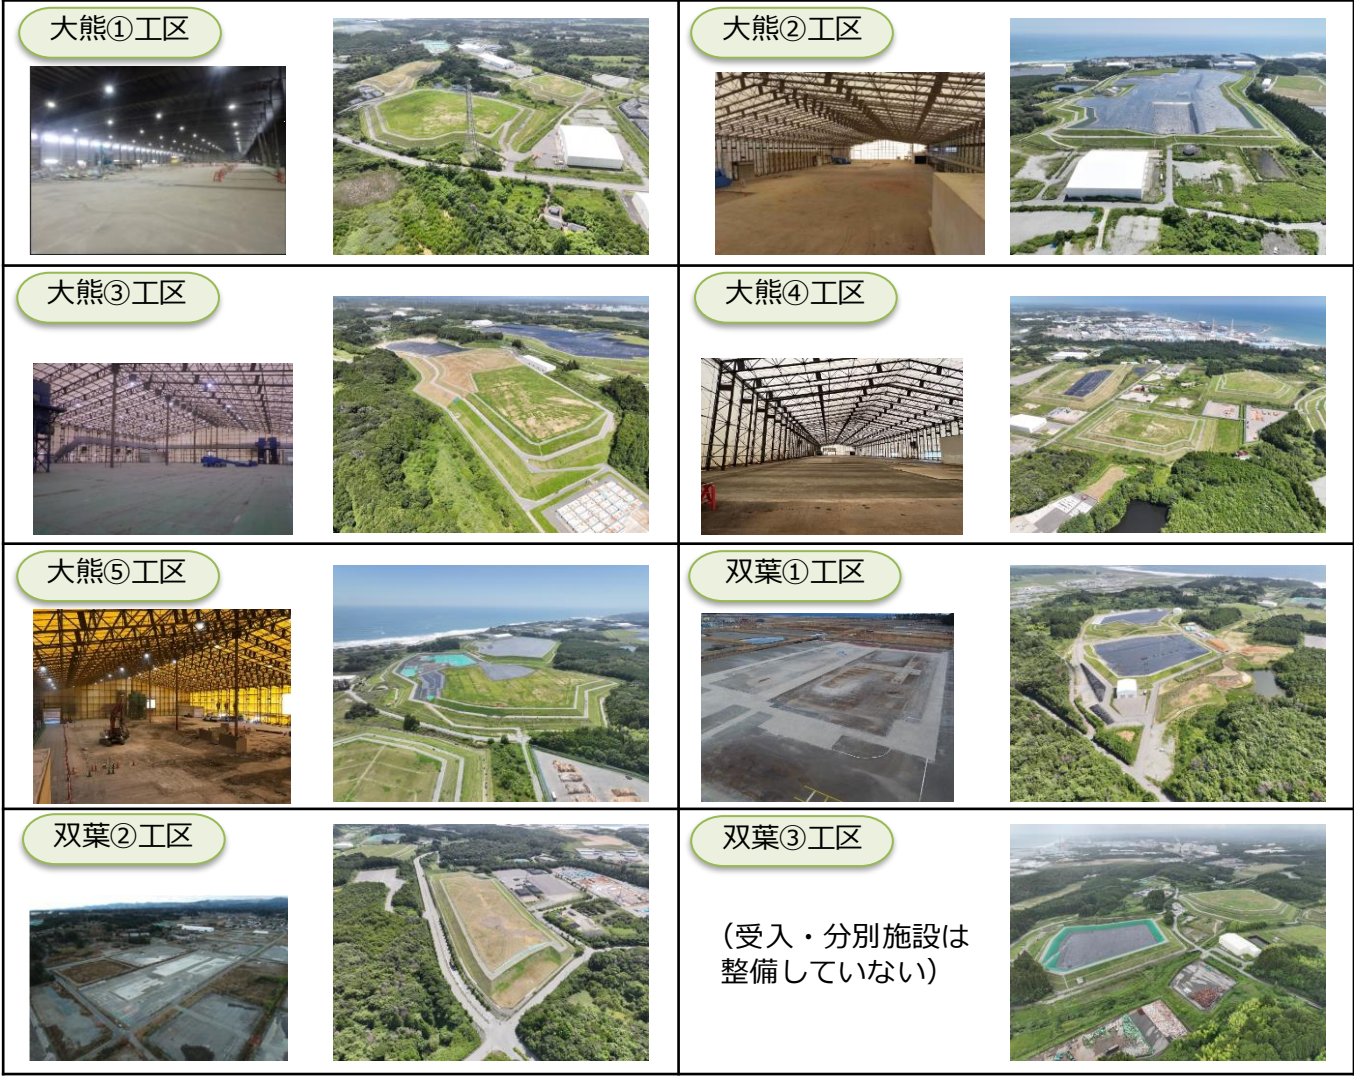

左の写真が受入・分別施設、右の写真が土壌貯蔵施設

仮設焼却施設及び仮設灰処理施設の整備状況

2026年8月31日時点

・仮設焼却施設及び仮設灰処理施設で処理を行っています。

施設	大熊町	双葉町（その1）	双葉町（その2）
規模	・ 仮設焼却施設： 200 t／日 × 1 炉 （ストーカ炉）	・ 仮設焼却施設： 150 t／日 × 1 炉 （シャフト炉） ・ 仮設灰処理施設： 75 t／日 × 2 炉 （表面熔融炉）	・ 仮設焼却施設： 200 t／日 × 1 炉 （ストーカ炉） ・ 仮設灰処理施設： 75 t／日 × 2 炉 （コークスベッド式灰熔融炉）
業務用地面積	約5.0ha	約5.7ha	約6.8ha
処理開始	2018年 2月	2020年 3月	2020年 3月
受注者	三菱・鹿島JV	新日鉄・クボタ・大林・TPT JV	JFE・前田JV
外観			

廃棄物貯蔵施設の整備状況

2026年8月31日時点

・ 8月末時点で、灰処理ばいじんを封入した鋼製角形容器38,193個を廃棄物貯蔵施設に貯蔵しました。

工区	大熊1工区	双葉1工区	双葉2工区
主な建築構造	鉄骨鉄筋コンクリート造（2棟）	鉄骨鉄筋コンクリート造（1棟）	鉄骨鉄筋コンクリート造（1棟）
貯蔵容量※	29,280個	14,678個	30,028個
貯蔵量※	15,940個	14,678個	7,575個
敷地面積	約2.4ha	約2.2ha	約3.7ha
着工	2018年7月 造成開始 2018年12月 建築開始	2018年6月 造成開始 2018年11月 建築開始	2019年12月 造成開始 2019年12月 建築開始
貯蔵スケジュール	2020年4月 貯蔵開始	2020年 3月 貯蔵開始 2024年12月 貯蔵完了	2023年12月 貯蔵開始
施設整備受注者	鹿島建設	大林組	鹿島建設
定置・維持管理受注者	新日鉄・クボタ・大林・TPT JV	JESCO	新日鉄・クボタ・大林・TPT JV
外観			

※ 貯蔵容量及び貯蔵量は、鋼製角形容器（内寸 約1.3m(幅)×約1.3m(奥行)×約1.1m(高さ)）の個数。

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

概要


- 2015年3月より除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を開始しました。
- 除去土壌等の仮置場からの中間貯蔵施設への輸送は10tダンプトラックを基本に実施しています。
- 輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施しています。
- 2026年8月末時点で、累積約1,447万 m^3 の除去土壌等（帰還困難区域を含む）を中間貯蔵施設へ搬入しました。



輸送車両の走行状況



中間貯蔵施設からの退域前にスクリーニングをする輸送車両

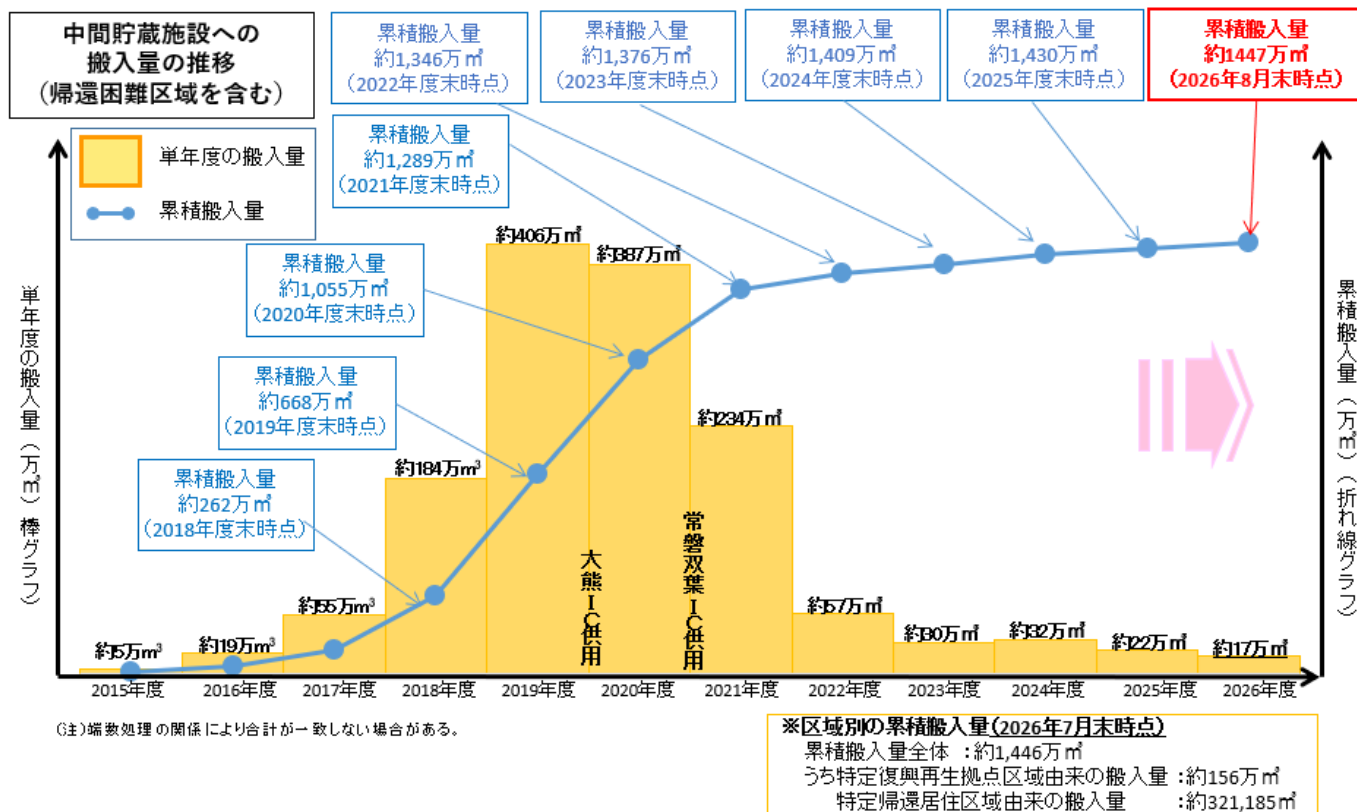

<参考>

2026年度の市町村毎の中間貯蔵施設への搬入量（帰還困難区域を含む）※1,2

2026年8月末時点の実績

市町村		今年度の 搬入予定量 (m ³)	今年度の搬入量 (m ³) ※3	累積搬入量 (m ³) ※3
浜通り	南相馬市	3,000	0	1,044,802
	富岡町	10,000	0	1,489,788
	大熊町	182,000	92,841	1,038,928
	双葉町	144,000	34,377	537,087
	浪江町	89,000	39,204	1,718,351
	飯舘村	20,000	0	1,573,969
	合計	448,000	166,422	14,467,804 ※4

- ※1 搬入量については、フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m³と換算しています。
- ※2 可燃物の搬入については、主に減容化後の焼却灰の量を計上しています。
- ※3 仮置場を介さない搬入（直送）量（速報値）を含んでいます。
- ※4 累積搬入量の合計については、「輸送が終了した市町村」の「累積搬入量」を含んでいます（下表）。

輸送が終了した市町村 ※5

市町村	累積搬入量 (m ³)	市町村	累積搬入量 (m ³)	市町村	累積搬入量 (m ³)
会津若松市	1,183 ※6	泉崎村	46,025	広野町	111,566
白河市	294,895	中島村	14,150	川内村	199,362
相馬市	79,702	矢吹町	32,260	葛尾村	473,794
田村市	190,269	棚倉町	10,990	新地町	7,690
伊達市	270,646	矢祭町	140	いわき市	215,903
桑折町	103,629	塙町	737	須賀川市	204,844
国見町	68,183	鮫川村	296	本宮市	232,376
大玉村	44,979	石川町	2,386	川俣町	638,736
鏡石町	7,980	玉川村	1,208	福島市	1,126,212
天栄村	62,172	平田村	374	郡山市	918,273
猪苗代町	241	浅川町	287	二本松市	459,541
会津坂下町	1,903	古殿町	1,352	檜葉町	391,969
湯川村	4,433	三春町	92,053	西郷村	748,210
会津美里町	2,993	小野町	937		

- ※5 輸送が終了した市町村についても、今後輸送が必要となるものが生じた場合には輸送することとしています。
- ※6 会津若松市からの累積搬入量は、南会津町、昭和村、下郷町、柳津町、三島町の累積搬入量を含みます。



中間貯蔵施設用地の状況

概要

- 中間貯蔵施設区域は約1,600haであり、区域内の登記記録人数は2,360人となっています。
- 地権者との信頼関係はもとより、中間貯蔵施設事業への理解が何よりも重要であると考えており、引き続き、地権者への丁寧な説明を尽くしながら用地取得に取り組めます。

中間貯蔵施設用地の状況について

2026年8月末時点

- 用地取得については、8月末時点で契約者数1,990人、面積約1,321haについて契約しております。

中間貯蔵施設用地の状況について


2026年8月末時点

全体面積 約1,600ha	項 目	全体面積に対する 面積と割合	全体登記記録人数 (2,360人※1)に対する 人数と割合
	地権者連絡先把握済み	約1,590ha ※1 99.4%	約2,180人 ※1 92.4%
民有地 約1,270ha (約79%)	民有地 約1,220ha(±0.0ha) 96.1% ※3	計 約1,321ha (±0.0ha) 82.6%	計 1,990人 (±0人) 84.3% ※2
公有地 約330ha (約21%)	公有地 約101ha(±0.0ha) 30.7% ※4	その他の公有地 約229ha 14.3%	＜参考＞ 約1,550ha (96.9%) 〔連絡先把握済みの2,180人に対する割合は、91.3%〕

次を含む。
①道路・水路等のように今後も元々の機能を維持する町有地、県有地、国有地等
②事業の進展を踏まえつつ、必要に応じて、中間貯蔵施設用地としての提供・契約を調整する町有地、県有地、国有地等

※1 国、地方公共団体を含む。
※2 民有地1,987人、公有地3人。
※3 民有地(約1,270ha)に対する割合。
※4 公有地(約330ha)に対する割合。

(注) 端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。また、契約済におけるカッコ内の数字は、前月末からの増加分を表す。

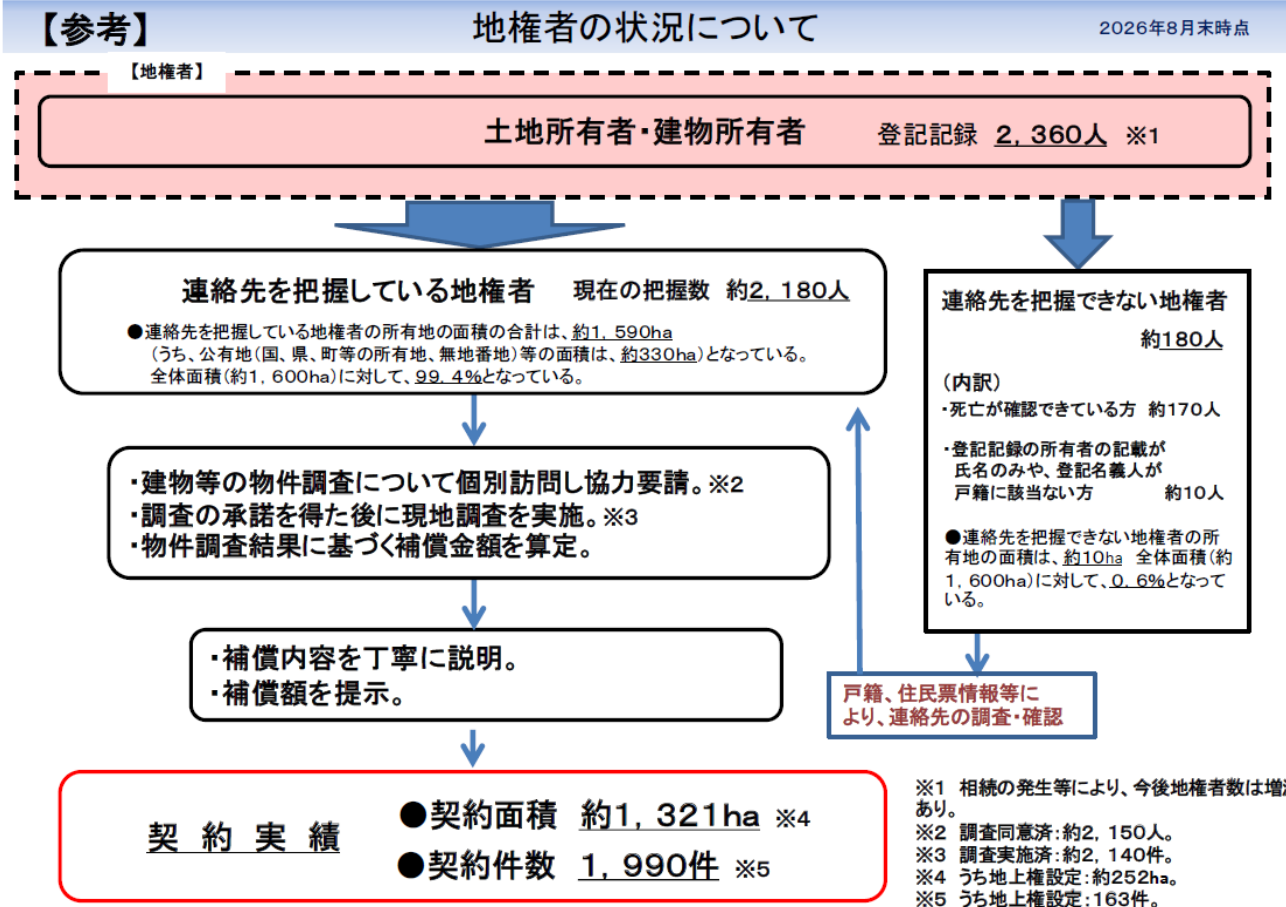

(注) 数値については概数であるため、合計と一致しない場合がある。



国直轄による特定廃棄物の処理進捗状況

概要

- ・ 特定帰還居住区域の解体申請を受付中(4町)です。
- ・ 被災家屋等の解体関連の受付・調査を行い、順次解体を実施中です。
- ・ 片付けごみの処理についてステーション回収や戸別回収訪問を実施しています。
- ・ 対策地域内廃棄物等の処理については、7月末時点で、約33万トンが埋立処分済、約62万トンが焼却処理済です。
- ・ 6月末時点で約50万トンの福島県内の指定廃棄物を、特定廃棄物埋立処分施設等で処分、中間貯蔵施設で保管または仮設減容化施設で処理等しています。



大熊町の仮設焼却施設



被災家屋等の解体の様子

<参考> 特定廃棄物（対策地域内廃棄物＋指定廃棄物）

特定廃棄物

国が処理責任を負う以下の二つの廃棄物で構成されます

対策地域内廃棄物

放射性物質汚染対処特措法に基づき、環境大臣が、国がその地域内にある廃棄物の収集・運搬・保管及び処分を実施する必要があると指定した汚染廃棄物対策地域内の廃棄物。

放射性物質汚染対処特措法に基づき、国が処理します。

指定廃棄物

事故由来放射性物質による汚染状態が8,000Bq/kgを超えると認められ、環境大臣の指定を受けた廃棄物。

放射性物質汚染対処特措法に基づき、国が処理します。

・被災家屋について、7月末時点で、約19,700件の解体撤去申請を受付済であり、約18,900件を解体撤去済です。

市町村		解体申請 受付件数	解体済件数	解体申請 受付状況
南相馬市		2,635	2,635	完了
	特定帰還居住区域	1	1	
浪江町		5,004	4,765	特定復興再生拠点区域： 受付終了 特定帰還居住区域： 受付中
	特定復興再生拠点区域	703	668	
	特定帰還居住区域	298	94	
双葉町		1,597	1,325	特定復興再生拠点区域： 受付終了 特定帰還居住区域： 受付中
	特定復興再生拠点区域	1,297	1,236	
	特定帰還居住区域	258	47	
大熊町		2,337	2,066	特定復興再生拠点区域： 受付終了 特定帰還居住区域： 受付中
	特定復興再生拠点区域	1,899	1,854	
	特定帰還居住区域	309	83	
富岡町		4,080	4,019	特定復興再生拠点区域： 受付終了 特定帰還居住区域： 受付中
	特定復興再生拠点区域	1,117	1,091	
	特定帰還居住区域	84	49	
楢葉町		1,558	1,558	完了
飯舘村		1,550	1,550	完了
	特定復興再生拠点区域	90	90	
川俣町		329	329	完了
葛尾村		484	484	完了
	特定復興再生拠点区域	47	47	
田村市		19	19	完了
川内村		102	102	完了
合計		19,695	18,852	
		特定復興再生拠点区域	5,153	4,986
		特定帰還居住区域	950	274

注：1）解体申請受付件数は、当初申請数から取下げ件数を除いた件数です。
2）解体完了件数は、上屋解体の後、基礎解体、整地まで完了した件数です。
（2026年3月末時点集計から。2026年2月末時点集計までは上屋解体済の件数です。）
3）特定復興再生拠点区域、特定帰還居住区域の件数は総数の内数です。
4）数値は速報値のため、今後更新する場合があります。

各市町村における被災家屋等の解体完了件数（年度別）

2026年3月末時点

市町村	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	累計
南相馬市	59	67	374	750	710	656	10	7	1						2,634
浪江町		10	47	138	739	945	795	800	731	120	133	88	39	165	4,750
双葉町					9	12	268	352	216	127	98	94	33	79	1,288
大熊町					49	107	213	405	388	260	190	120	177	114	2,023
富岡町		6	44	456	712	919	539	479	385	90	102	125	71	61	3,989
楢葉町		8	105	605	361	350	128								1,557
飯舘村			1	74	504	414	269	247	40		1				1,550
川俣町		1		37	227	62	2								329
葛尾村				49	293	13	81	40	8						484
田村市			19												19
川内村			36	66											102
合計	59	92	626	2,175	3,604	3,478	2,305	2,330	1,769	597	524	427	320	419	18,725

※2024年度工事までは上屋解体済の件数を集計し、2025年度工事からは上屋解体の後、基礎解体、整地まで完了した件数を集計しています。



国直轄による対策地域内における仮設焼却施設の焼却処理状況

概要

- 9 市町村（12施設）において仮設焼却施設を設置しました。
- 現在、2町（3施設）で焼却処理を実施中です。



仮設焼却施設の進捗状況等

- 7月末時点で、約163万トン（除染廃棄物を含む）を各仮設焼却施設で処理しました。
- 各仮設焼却施設それぞれの進捗状況は下表のとおりです。

立地地区	進捗状況	処理能力	処理済量 (2026年7月末時点)
大熊町	稼働中(2017年12月より)	200トン/日	約135,000トン(約68,000トン)
双葉町その1	稼働中(2020年3月より)	150トン/日	約170,000トン(約26,000トン)
双葉町その2	稼働中(2020年4月より)	200トン/日	約95,000トン(約11,000トン)
浪江町	運営終了(2025年2月)	300トン/日	約349,000トン(約219,000トン)
葛尾村	運営終了(2021年3月)	200トン/日	約131,000トン(約37,000トン)
飯舘村 (蕨平地区)	運営終了(2021年2月)	240トン/日	約257,000トン(約54,000トン)
南相馬市2	運営終了(2020年3月)	200トン/日	約65,000トン(約1,000トン)
南相馬市1	運営終了(2019年6月)	200トン/日	約149,000トン(約90,000トン)
楡葉町	運営終了(2019年3月)	200トン/日	約77,000トン(約32,000トン)
富岡町	運営終了(2018年8月)	500トン/日	約155,000トン(約55,000トン)
飯舘村 (小宮地区)	運営終了(2017年3月)	5トン/日	約2,900トン(約2,900トン)
川内村	運営終了(2016年2月)	7トン/日	約2,000トン(約2,000トン)


※処理済量については、除染廃棄物も含み、()内はうち災害廃棄物等の処理済量。
※川俣町、田村市分については、既存の処理施設で処理済(約40,000トン(除染廃棄物含む))。

福島クリーンセンターふたばの埋立状況

その先の環境へ。

概要

- ・ 10万Bq/kg以下の特定廃棄物（帰還困難区域内の特定復興再生拠点区域の被災建物等解体撤去等に伴って生じた特定廃棄物）について、クリーンセンターふたばを活用した埋立処分事業を実施しています。（10万Bq/kgを超えるのは中間貯蔵施設に搬入）
- ・ 2023年6月1日からクリーンセンターふたばにて埋立てを開始しました。

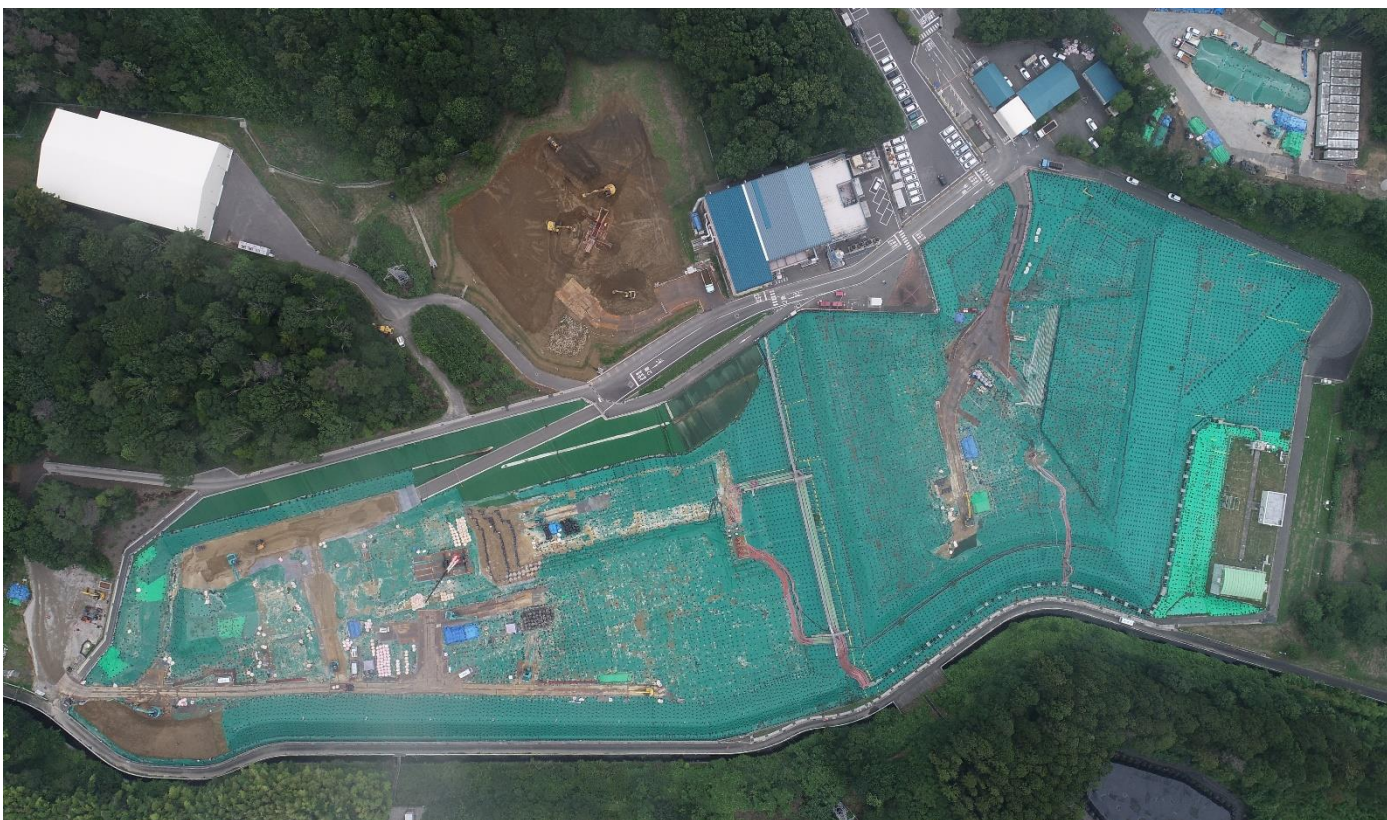


クリーンセンターふたば （2026年7月28日撮影）

クリーンセンターふたばの埋立状況

・7月末時点で、40,049袋をクリーンセンターふたばに埋立てました。

●これまでの進捗状況

埋立袋数		
期間	実績（袋）	累計（袋）
2023年6月～2025年7月	25,133	25,133
2025年8月	1,156	26,289
2025年9月	1,572	27,861
2025年10月	1,614	29,475
2025年11月	1,620	31,095
2025年12月	1,634	32,729
2026年1月	1,664	34,393
2026年2月	1,364	35,757
2026年3月	332	36,089
2026年4月	0	36,089
2026年5月	704	36,793
2026年6月	1,524	38,317
2026年7月	1,732	40,049

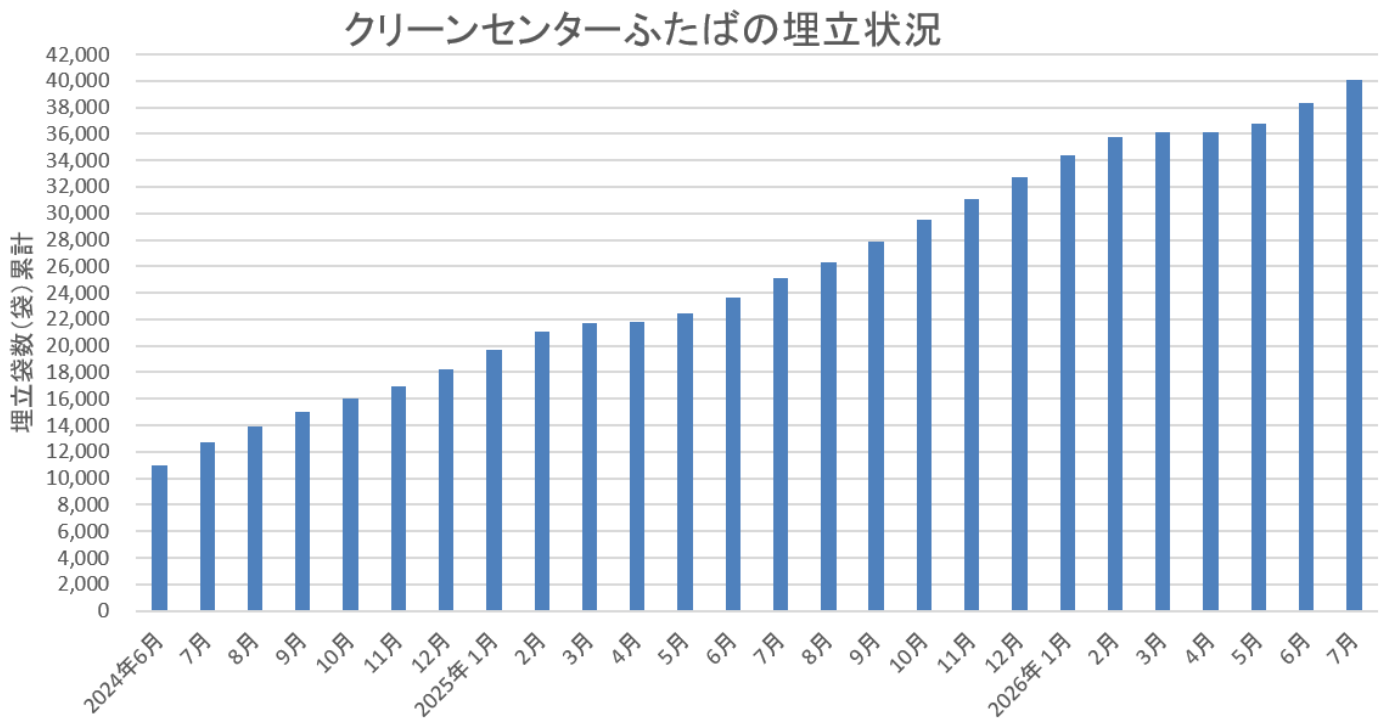

※埋立は平日のみ実施しています。
※埋立袋数（袋）は天候や調整状況により変動します。

福島 特定廃棄物埋立処分施設の埋立状況

その先の環境へ。

概要

- ・福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物（指定廃棄物及び対策地域内廃物）について、既存の管理型処分場（旧フクシマエコテッククリーンセンター）を活用した埋立処分事業を実施しています。（10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入）
- ・2017年11月から特定廃棄物埋立処分施設で埋立てを開始しました。
- ・2023年10月31日が特定廃棄物の最終埋立日となり無事終了しました。双葉郡8町村の生活ごみの埋立ては、現在も継続しています。




特定廃棄物埋立処分施設 （2026年6月1日撮影）

特定廃棄物埋立処分施設の埋立状況

・ 8月末時点で、296,999袋を特定廃棄物埋立処分施設で埋立てました。

●これまでの進捗状況

埋立袋数		
期間	実績（袋）	累計（袋）
2017年11月～2025年8月	296,830	296,830
2025年 9月	20	296,850
2025年 10月	20	296,870
2025年 11月	10	296,880
2025年 12月	10	296,890
2026年 1月	10	296,900
2026年 2月	20	296,920
2026年 3月	22	296,942
2026年 4月	0	296,942
2026年 5月	15	296,957
2026年 6月	15	296,972
2026年 7月	15	296,987
2026年 8月	12	296,999

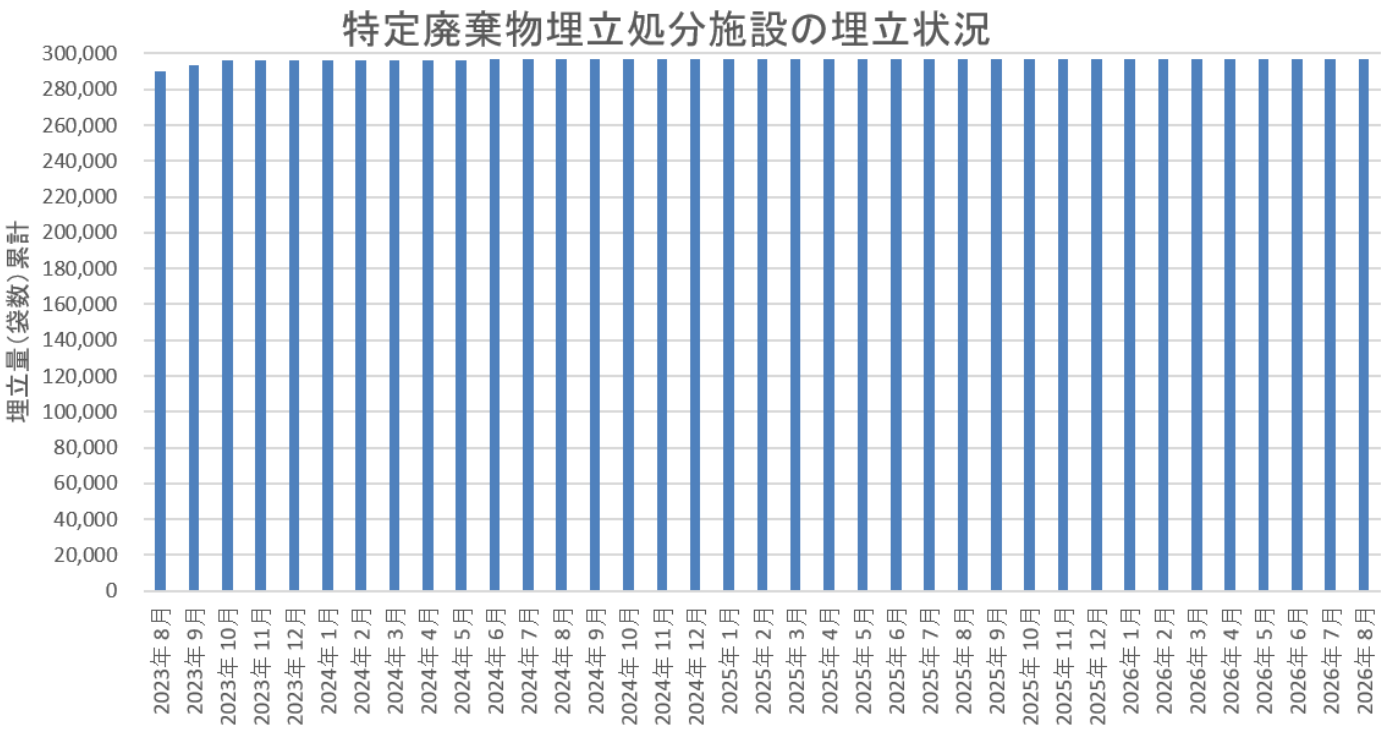

※埋立ては平日のみ実施しています。
※埋立量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

福島

放射線に関わるリスクコミュニケーション活動状況

その先の環境へ。

概要

- ・環境省では、環境中に放出された放射性物質対策を進めると同時に、放射線に関する基礎的な情報の発信や地域の環境再生への取り組み、放射線リスクコミュニケーションの取り組みを実施しています。
- ・放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター、環境再生プラザを主な拠点として活動しています。

これまでの活動状況

8月31日時点

項 目		2026年度 8月分	2026年度 累 計
■放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター (単位：回)			
自治体職員や相談員等の活動の支援	研修会	0	4
	専門家派遣	1	4
住民の放射線に関する理解醸成の支援	住民セミナー	0	1
	車座意見交換会	4	11
	放射線教育の支援	2	48
■環境再生プラザ (単位：回)			
専門家派遣	自治体など	0	3
	小中学校など	1	12
	その他	1	9
移動展示		1 (1日)	10 (11日)
■その他 (WBC単位：日) (ガンマカメラ単位：台日)			
内部被ばく検査 (WBC)		1	14
ガンマカメラを活用した放射線測定		0	0

(放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター)

放射線による健康不安等に関する各種相談対応、専門家派遣、研修会やセミナーの開催、線量測定等の支援を行っています。

◆専門家派遣

8/22 いわき市危機管理課

◆車座意見交換会

8/3 福島県立安達高等学校

8/5 福島県立白河高等学校

8/7 福島県立相馬高等学校

福島県立白河高等学校

8/19 福島県立安積黎明高等学校

◆放射線教育の支援

8/28 川俣町立川俣小学校



廃炉資料館と福島第一原発を見学後、教員がファシリテーターとなり意見交換をしました (8/3 安達高校)



中間貯蔵施設と福島第一原発を見学後、専門家を交え意見交換しました (8/7 相馬高校・白河高校)

(環境再生プラザ)

市町村や学校などに環境再生に関する情報の提供、専門家派遣・移動展示を行っています。これらの取り組みを通して地域とのコミュニケーションを推進しています。

◆専門家派遣

〈小中学校など〉

8/26 福島市教育委員会 教員研修

〈その他〉

8/4 飯舘村長泥地区 環境再生事業見学会

◆移動展示

8/26 福島市教育委員会 教員研修



放射線授業をどう進めたらよいか、専門家の講義からヒントを得ました (8/26 教員研修)



グループで授業づくりを話し合い、放射線の伝え方を模索しました (8/26 教員研修)

帰還困難区域等における鳥獣の捕獲状況

概要


- ・地域住民が避難し、狩猟等を行うことができない帰還困難区域内等において、帰還準備や帰還後の生活、地域経済の再建に大きな支障が生じないように、イノシシ、アライグマ、ハクビシンの捕獲等の対策を実施しています。
- ・事業は5町村（富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村）で実施していましたが、2026年5月より飯舘村でも実施しています。
- ・鳥獣の生息状況調査と捕獲の他、2019年7月からは浪江町の仮設焼却施設内、2025年1月からは中間貯蔵施設区域（大熊町）テント内にて整備した軟化処理設備で、捕獲した個体を減容化した上で焼却処理を実施しています。



捕獲対策



アライグマの捕獲

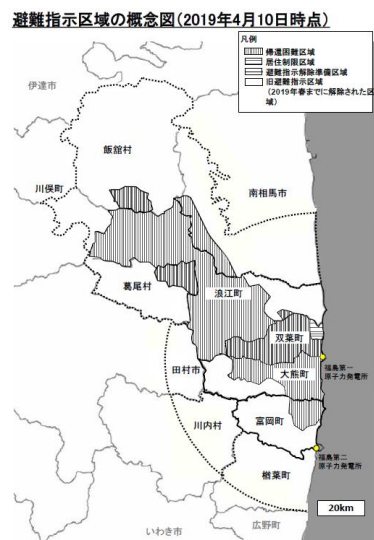中間貯蔵施設区域(大熊町)
テント内の軟化処理設備

イノシシ等の捕獲状況

- ・8月は、イノシシ163頭、アライグマ170頭、ハクビシン29頭を捕獲しました。
- ・2026年度の累計捕獲数(8月末現在)は、イノシシ261頭、アライグマ313頭、ハクビシン55頭です。

	8月の捕獲数			2026年度の捕獲数累計(8月末現在)		
	イノシシ	アライグマ	ハクビシン	イノシシ	アライグマ	ハクビシン
富岡町	3	6	2	5	12	4
大熊町	20	27	4	25	50	8
双葉町	33	34	19	43	61	36
浪江町	78	76	2	135	140	4
葛尾村	7	14	2	13	26	3
飯舘村	22	13	0	40	24	0
計	163	170	29	261	313	55

- ・これまでの各町村別捕獲実績は、下の表のとおりです。また、2026年度の月別のイノシシ捕獲数は下のグラフ（前年同月と対比）のとおりです。

各町村別の捕獲実績 ※2026年度は2026年8月末現在の実績								単位:頭	
			富岡町	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村	飯舘村	合計
イノシシ (2012, 2013年度 はイノブタ 含む)	2012年度～ 2022年度		1,185	3,069	2,835	1,844	238	-	9,171
	2023年度		11	84	118	339	27	-	579
	2024年度		31	42	103	197	20	-	393
	2025年度		15	81	136	348	46	-	626
	2026年度		5	25	43	135	13	40	261
	合 計		1,247	3,301	3,235	2,863	344	40	11,030
アライグマ ハクビシン	2015年度～ 2022年度	アライグマ	548	1,119	1,124	338	59	-	3,188
		ハクビシン	119	129	186	96	32	-	562
		計	667	1,248	1,310	434	91	-	3,750
	2023年度	アライグマ	28	77	118	43	11	-	277
		ハクビシン	1	14	33	4	1	-	53
		計	29	91	151	47	12	-	330
	2024年度	アライグマ	10	36	56	12	18	-	132
		ハクビシン	3	6	30	5	0	-	44
		計	13	42	86	17	18	-	176
	2025年度	アライグマ	18	43	62	59	21	-	203
		ハクビシン	5	4	19	5	0	-	33
		計	23	47	81	64	21	-	236
	2026年度	アライグマ	12	50	27	140	26	24	313
		ハクビシン	24	8	17	4	3	0	55
		計	16	58	44	144	29	24	368
	合 計	アライグマ	616	1,325	1,421	592	135	24	4,113
		ハクビシン	132	161	304	114	36	0	747
		計	748	1,486	1,725	706	171	24	4,860

(頭)

イノシシの月別捕獲数

