

福島地方環境事務所の最近の動き  
(今週の福島)

【最近の動きのポイント】

○ 除染・廃棄物対策関連

- ・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です
- ・廃棄物リサイクル施設整備事業の実施に要する経費に対して、当該経費の一部を補助する事業を公示しました (8/17)
- ・第四回管理型処分場環境安全委員会を開催しました (8/22)
- ・中間貯蔵施設区域内で発生した廃棄物及び搬入した除染廃棄物について、大熊町の仮設焼却施設での処理を開始しました (8/22)

○ 中間貯蔵施設関連

- ・8 月 20 日時点で用地取得の契約をいただいた面積が 1,000ha を超えました

< 除去土壌等の輸送の進捗状況 >

|                          |                          |         |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| 今年度の輸送対象物量               | 搬入済量 (8/21 時点)           | 進捗率     |
| 約 180 万 m <sup>3</sup>   | 約 41.2 万 m <sup>3</sup>  | 約 23.1% |
| 累積の輸送対象物量                | 搬入済量 (8/21 時点)           | 進捗率     |
| 約 1,400 万 m <sup>3</sup> | 約 117.1 万 m <sup>3</sup> | 約 8.4%  |

○ リスクコミュニケーション等関連

- ・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です
- ・富岡町の「麓山の火祭り」を取材し、町の PR 動画の制作を進めています
- ・いわき市において、「第 2 回相談員合同ワークショップ」を開催します (8/28)
- ・特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」が開館しました (8/24)

## I. 除染・廃棄物対策関連

### 1 特定復興再生拠点区域の解体・除染について

帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋解体・除染等を実施しています。

#### ○ 最近の動き

- ・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です。

詳細は別添 1、3 のとおり

### 2 避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について

帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。

各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。

仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。

- 除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）  
別添 1 のとおり

- 特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況  
別添 4 のとおり

#### ○ 最近の動き

- ・第四回管理型処分場環境安全委員会を開催しました。

[http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki\\_umetate\\_fukushima/landfill\\_disposal\\_understand/](http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/landfill_disposal_understand/)

- ・環境省では、帰還困難区域の復興・再生に早期に取り組むため、特定復興再生拠点区域の整備事業を円滑かつ迅速に進めるべく、廃棄物リサイクル施設整備事業の実施に要する経費に対して、当該経費の一部を補助する事業を公示しました（8/17）。詳細については、こちらから御確認ください。

[http://shiteihaiki.env.go.jp/initiatives\\_fukushima/waste\\_disposal/h30\\_koubou.html](http://shiteihaiki.env.go.jp/initiatives_fukushima/waste_disposal/h30_koubou.html)

- ・中間貯蔵施設区域内で発生した廃棄物及び搬入した除染廃棄物について、大熊町の仮設焼却施設での処理を開始しました（8/22）

詳細は別添 5 のとおり

## II. 中間貯蔵施設関連

中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。

(1) 最近の動き

- 8月20日時点で、用地取得の契約をいただいた面積が1,000haを超えました。  
別添6のとおり
- 除去壌等の輸送の進捗状況

|                       |                       |        |
|-----------------------|-----------------------|--------|
| 今年度の輸送対象物量            | 搬入済量(8/21時点)          | 進捗率    |
| 約180万m <sup>3</sup>   | 約41.2万m <sup>3</sup>  | 約23.1% |
| 累積の輸送対象物量             | 搬入済量(8/21時点)          | 進捗率    |
| 約1,400万m <sup>3</sup> | 約117.1万m <sup>3</sup> | 約8.4%  |

(2) 平成30年度の進捗状況

- 除去土壌等の輸送 (8月21日までの搬入実績)

| 搬出市町村 |      | 今年度の<br>搬出可能量<br>(m <sup>3</sup> ) | 今年度の<br>学校等(現場保管)<br>からの輸送予定量<br>(m <sup>3</sup> ) | 今年度の<br>搬入済量(m <sup>3</sup> ) | 累積<br>搬入済量<br>(m <sup>3</sup> ) |
|-------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 浜通り   | いわき市 | 22,200                             | 7,800                                              | 5,157                         | 27,555                          |
|       | 相馬市  | 16,100                             | —                                                  | —                             | 16,851                          |
|       | 南相馬市 | 113,200                            | —                                                  | 11,144                        | 39,206                          |
|       | 広野町  | 31,900                             | —                                                  | —                             | 9,560                           |
|       | 檜葉町  | 72,400                             | —                                                  | 30,879                        | 56,335                          |
|       | 富岡町  | 162,400                            | —                                                  | 35,163                        | 78,612                          |
|       | 川内村  | 42,400                             | —                                                  | 25,067                        | 39,622                          |
|       | 大熊町  | 147,000                            | —                                                  | 36,074                        | 87,438                          |
|       | 双葉町  | 132,700                            | —                                                  | 9,534                         | 56,453                          |
|       | 浪江町  | 130,300                            | —                                                  | 14,110                        | 50,588                          |
|       | 葛尾村  | 71,400                             | —                                                  | 15,595                        | 32,122                          |
|       | 飯館村  | 151,600                            | —                                                  | 23,209                        | 51,500                          |
| 中通り   | 福島市  | 78,700                             | 20,000                                             | 10,364                        | 35,239                          |
|       | 郡山市  | 67,200                             | 20,900                                             | 50,255                        | 113,622                         |
|       | 白河市  | 33,800                             | 100                                                | 14,750                        | 39,211                          |
|       | 須賀川市 | 22,000                             | 3,600                                              | 11,989                        | 26,914                          |
|       | 二本松市 | 50,000                             | —                                                  | 12,542                        | 56,323                          |
|       | 田村市  | 47,800                             | 300                                                | 12,080                        | 38,570                          |
|       | 伊達市  | 62,600                             | 6,000                                              | 12,286                        | 33,204                          |
|       | 本宮市  | 20,600                             | —                                                  | 8,584                         | 31,869                          |
|       | 桑折町  | 19,200                             | —                                                  | 84                            | 16,718                          |
|       | 国見町  | 16,300                             | —                                                  | 6,948                         | 18,292                          |
|       | 川俣町  | 71,600                             | —                                                  | 23,646                        | 45,925                          |
|       | 大玉村  | 13,700                             | —                                                  | 7,073                         | 16,338                          |
|       | 鏡石町  | 0                                  | 300                                                | —                             | 7,530                           |
|       | 天栄村  | 16,100                             | —                                                  | 1,356                         | 11,027                          |

|  |     |           |        |         |            |
|--|-----|-----------|--------|---------|------------|
|  | 西郷村 | 54,900    | -      | 16,303  | 37,387     |
|  | 泉崎村 | 15,200    | -      | 5,324   | 15,755     |
|  | 中島村 | 6,400     | -      | 5,827   | 14,054     |
|  | 矢吹町 | 13,900    | -      | 6,683   | 16,280     |
|  | 三春町 | 24,400    | -      | -       | 14,189     |
|  | 合計  | 1,728,000 | 59,000 | 412,026 | 1,170,691※ |

※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 m<sup>3</sup>と換算しています。

※ 中間貯蔵施設への搬入済量（2018 年 5 月末時点）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018 年 5 月末時点、市町村除染：2018 年 3 月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018 年 5 月末時点、市町村除染：2018 年 3 月末時点））の合計量。

※ 10 万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。

※ 累積搬入済量の合計値には、2018 年 3 月末時点で搬入が完了している市町村の搬入量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬入済量の合計とは数字が一致しません。

○ 中間貯蔵施設区域内の用地取得について

平成 30 年 8 月 20 日時点の用地の状況は、別添 6 のとおり

※別添 6 に関するお問い合わせは、環境省環境再生施設整備担当参事官室 細川、信原  
電話 03-5521-8349 まで

○ 中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等

こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）  
<http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba>

○ 中間貯蔵施設に係る工事等について

工事等の一覧は別添 2 のとおり

### Ⅲ. 放射線健康リスクコミュニケーション等関連

①自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。

（１）最近の動き

○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。

○ 放射線を可視化するガンマカメラを活用した、住民向けリスクコミュニケーション支援事業を実施中です。

○ 環境再生プラザにおいて、夏休み期間中（7/21～8/31）「プラザ夏学習」と題した小中学生向けの放射線教室を実施中です。

- 8月15日に富岡町の麓山神社において8年ぶりに開催された「麓山の火祭り」を取材し、町のPR動画の制作を進めています。  
別添7のとおり
- 富岡町において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しています(8/22～25)。
- いわき市において、「第2回相談員合同ワークショップ」を開催します(8/28)。
- 特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」が開館しました(8/24)。  
別添8のとおり。詳細については、こちらから御確認ください。  
[http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki\\_umetate\\_fukushima/reprun/](http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/reprun/)

(2) これまでの実施状況

(8月24日時点)

| 項 目                      |                                  | 実施回数           |                |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
|                          |                                  | H29 年度         | 今年度            |
| ① 自治体職員や相談員等の活動の支援       | (ア) 職員向け研修会                      | 77 回           | 24 回           |
|                          | (イ) 専門家派遣                        | 47 回           | 6 回            |
| ② 住民の放射線に関する理解醸成の支援      | (ア) 住民セミナー                       | 72 回           | 18 回           |
|                          | (イ) 車座意見交換会                      | 62 回           | 18 回           |
|                          | (ウ) 個人線量測定の支援(WBC)               | 83 日           | 26 日           |
|                          | (エ) リスクコミュニケーション拠点(長崎大、弘前大)による活動 |                |                |
|                          | (オ) ガンマカメラ活用リスクコミュニケーション支援事業     | 184 台・日        | 85 台・日         |
| ③ 環境再生等に関する情報発信(環境再生プラザ) | (ア) 専門家派遣                        | 142 件          | 51 件           |
|                          | (イ) 移動展示                         | 42 件<br>[55 日] | 16 件<br>[25 日] |

除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧  
(除染特別地域、汚染廃棄物対策地域)

| 市町村  | 工事名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南相馬市 | <p>○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事 (H30/2/13～)<br/>※H30. 3 月に着工</p> <p>○平成 29 年度南相馬市建物解体等撤去工事 (H29/4/19～)<br/>※H29. 6 月に着工</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 浪江町  | <p>○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)浪江町フォローアップ除染等工事 (H29/9/25～)<br/>※H29. 10 月に着工</p> <p>○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事 (H30/5/15～)<br/>※H30. 7 月に着工</p> <p><u>○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その 1) (H30/6/20～)</u><br/>※H30. 8 月に着工</p> <p>○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事 (H30/1/25～)<br/>※H30. 3 月に着工</p> <p>○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事 (H30/4/11～)<br/>※H30. 6 月に着工</p> <p>○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付中</p> |
| 双葉町  | <p><u>○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その 1) (H29/12/4～)</u><br/>※H29. 12 月に着工</p> <p><u>○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その 2) (H30/1/10～)</u><br/>※H30. 2 月に着工</p> <p>○平成 29 年度双葉町建物解体等撤去工事(その 2) (H30/2/8～)<br/>※H30. 4 月に着工</p> <p>○被災家屋等の解体撤去申請を受付中</p>                                                                                                             |
| 大熊町  | <p>○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)大熊町仮置場復旧等工事 (H30/7/19～)<br/>※H30. 8 月に着工</p> <p><u>○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その 1) (H30/1/25～)</u><br/>※H30. 3 月に着工</p> <p>○被災家屋等の解体撤去申請を受付中</p>                                                                                                                                                                                                 |

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

| 市町村 | 工事名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 富岡町 | <p>○平成 29 年度(平成 28 年度繰越) 富岡町除染等工事(夜の森地区他)<br/>(H29/5/22～)</p> <p>※H29. 6 月に着工</p> <p>○平成 29 年度(平成 28 年度繰越) 富岡町フォローアップ除染等工<br/>事 (H29/9/26～)</p> <p>※H29. 10 月に着工</p> <p><u>○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等<br/>及び除染等工事(その 1)(H30/8/7～)</u></p> <p>※H30. 8 月に着工</p> <p>○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事(その 2)(H29/12/27～)</p> <p>※H30. 3 月に着工</p> <p>○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付中</p> |
| 檜葉町 | <p>○平成 29 年度檜葉町仮置場復旧等工事(H29/4/19～)</p> <p>※H29. 5 月に着工</p> <p>○平成 30 年度(平成 29 年度繰越) 檜葉町仮置場復旧等工事(H30/7/5<br/>～)</p> <p>※H30. 8 月に着工</p> <p>○平成 30 年度檜葉町建物解体等撤去工事(H30/7/9～)</p> <p>※H30. 7 月に着工</p>                                                                                                                                                                           |
| 飯舘村 | <p>○平成 30 年度(平成 29 年度繰越) 飯舘村仮置場復旧等工事<br/>(H30/4/10～)</p> <p>※H30. 4 月に着工</p> <p>○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事(H30/4/13～)</p> <p>※H30. 6 月に着工</p> <p>○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付中</p>                                                                                                                                                                                               |
| 川俣町 | <p>○平成 29 年度川俣町可燃物処理等整備工事(H29/8/8～)</p> <p>※H29. 8 月に着工</p> <p>○平成 30 年度(平成 29 年度繰越) 川俣町仮置場復旧等工事<br/>(H30/6/29～)</p> <p>※H30. 6 月に着工</p> <p>○平成 30 年度川俣町建物解体等撤去工事(公共特殊建物)<br/>(H30/7/26～)</p> <p>※着工準備中</p>                                                                                                                                                                 |
| 葛尾村 | <p>○平成 30 年度(平成 29 年度繰越) 葛尾村仮置場復旧等工事(その<br/>2)(H30/6/20～)</p> <p>※H30. 7 月に着工</p> <p>○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付中</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

## 中間貯蔵施設に係る工事等の一覧

|         | 工事名                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土壌貯蔵施設等 | ○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(双葉町) (H28/6/14～)<br>※H28. 11 月に着工、H29. 12 月貯蔵開始                       |
|         | ○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(大熊町) (H28/6/14～)<br>※H28. 11 月に着工、H29. 10 月貯蔵開始                       |
|         | ○平成 29 年度中間貯蔵(双葉 1 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/11～)<br>※H29. 10 月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み                     |
|         | ○平成 29 年度中間貯蔵(双葉 2 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/18～)<br>※H30. 1 月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み                      |
|         | ○平成 29 年度中間貯蔵(大熊 1 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/11～)<br>※H29. 11 月に着工、H30. 7 月貯蔵開始                       |
|         | ○平成 29 年度中間貯蔵(大熊 2 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/11～)<br>※H29. 9 月に着工、H30. 7 月貯蔵開始                        |
|         | ○平成 29 年度中間貯蔵(大熊 3 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/18～)<br>※H29. 11 月に着工、H30. 7 月から受入・分別施設の運転開始、9 月に貯蔵開始見込み |
|         | ○平成 30 年度中間貯蔵(双葉 3 工区)土壌貯蔵施設工事 (H30/4/6～)<br>※今年度中に着工予定                                         |
|         | ○平成 30 年度中間貯蔵(大熊 4 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H30/4/5～)<br>※今年度中に着工予定                                        |
|         | ○平成 30 年度中間貯蔵(大熊 5 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H30/4/10～)<br>※今年度中に着工予定                                       |



|             | 工事名                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 廃棄物<br>関連施設 | ○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物<br>処理その 1 業務 （H30/ 3 / 1 ～）<br>※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定 |
|             | ○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物<br>処理その 2 業務 （H30/ 3 / 1 ～）<br>※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定 |
|             | ○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事 （H30/<br>3 / 9 ～）<br>※平成 30 年 6 月に着工、平成 31 年度内に稼働予定          |
|             | ○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事 （H30/<br>3 / 8 ～）<br>※平成 30 年 7 月に着工、平成 31 年度内に稼働予定          |
| その他<br>施設等  | ○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・<br>双葉町）（H29/12/23～）                                      |
|             | ○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町）（H30/ 1 /19～）                                                   |
|             | ○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事 （H30 / 7 /19～）                                                    |
|             | ○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/ 8<br>/24～）                                             |

# 特定復興再生拠点区域整備の状況(2018年8月24日時点)

別添 3

- 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
- 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備（除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から5年を目途に避難指示解除を目指す）。
- これまでに、以下6町村の計画が認定され、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町で解体・除染工事に着工。


双葉町(2017.9.15認定、約560ha)



## 【工事状況】

- ①復興シンボル軸解体・除染工事  
(解体55件、除染約7ha) : 12月25日着工
- ②駅東等解体・除染工事  
(解体640件、除染約90ha) : 実施中


富岡町(2018.3.9認定、約390ha)

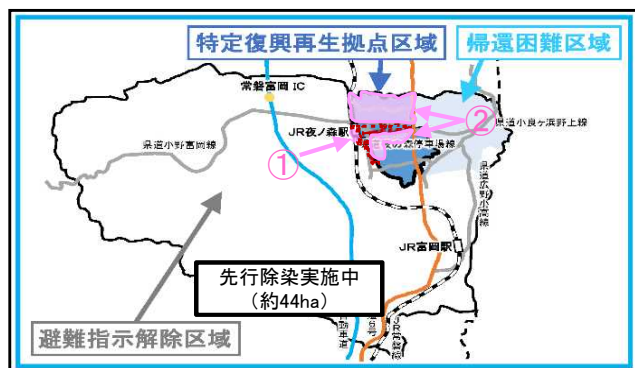

## 【工事状況】

- ①夜ノ森駅周辺の除染工事(除染約0.3ha) : 7月6日着工
- ②拠点北エリアの解体・除染工事  
(解体300件、除染約80ha) : 実施中

大熊町(2017.11.10認定、約860ha)

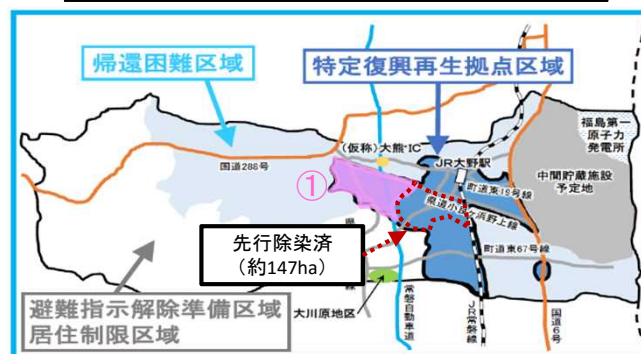

## 【工事状況】

- ①下野上地区の西エリアを中心とした解体・除染工事  
(解体460件、除染約160ha) : 3月9日着工

飯舘村(2018.4.20認定、約186ha)



## 【工事状況】解体・除染工事について調整中

浪江町(2017.12.22認定、約660ha)



## 【工事状況】

- ①一部道路の除染工事(除染約4ha) : 5月30日着工
- ②3地区における解体・除染工事  
(解体60件、除染約30ha) : 実施中

葛尾村(2018.5.11認定、約95ha)



## 【工事状況】解体・除染工事について調整中

## 特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

平成 30 年 8 月 24 日

## 【最新の進捗状況】

| 搬入量（袋数）  |       |        |
|----------|-------|--------|
| 期間       | 実績（袋） | 累計     |
| 8/8～8/21 | 349   | 31,390 |

※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

## 【これまでの進捗状況】

| 搬入量（袋数）             |       |        |
|---------------------|-------|--------|
| 期間                  | 実績（袋） | 累計     |
| 平成 29 年 11 月        | 707   | 707    |
| 平成 29 年 12 月        | 2,746 | 3,453  |
| 平成 30 年 1 月         | 1,866 | 5,319  |
| 平成 30 年 2 月         | 2,523 | 7,842  |
| 平成 30 年 3 月         | 4,060 | 11,902 |
| 平成 30 年 4 月         | 4,965 | 16,867 |
| 平成 30 年 5 月         | 4,287 | 21,154 |
| 平成 30 年 6 月         | 5,615 | 26,769 |
| 平成 30 年 7 月         | 3,445 | 30,214 |
| 平成 30 年 8 月(21 日まで) | 1,176 | 31,390 |

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。

[http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki\\_umetate\\_fukushima/progress/](http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/)

平成30年8月20日

## 中間貯蔵施設区域内で発生した廃棄物及び搬入した除染廃棄物 について大熊町の仮設焼却施設での処理を開始します

大熊町の仮設焼却施設において、中間貯蔵施設区域内で発生した廃棄物及び搬入した除染廃棄物の処理を8月22日（水）より開始することになりましたのでお知らせします。

### 1. 概要

大熊町の仮設焼却施設において、大熊町で発生した除染廃棄物、災害廃棄物等のうち可燃性廃棄物の処理が進捗したことを踏まえ、施設の余力の範囲で、中間貯蔵施設区域内で発生した廃棄物及び搬入した除染廃棄物の中間貯蔵施設区域内（大熊工区）に保管されている可燃性廃棄物の処理を開始します。

### 2. 処理開始日

平成30年8月22日（水）

### 3. 搬入先

大熊町仮設焼却施設

（福島県双葉郡大熊町大字小入野字東平地内）

### 4. 搬出を開始する保管場等（大熊工区）

東工業団地保管場C、古舘保管場Aほか3か所で保管されている廃棄物  
約46,000袋

※以後、仮設焼却施設の処理状況等を踏まえ、順次必要な処理を行っていく  
予定です。

#### ＜問い合わせ先＞

環境省福島地方環境事務所減容化施設整備課

電 話：024-563-6954

課 長：小島 啓之

対策官：山下 実

## (参考情報)

- ・大熊町で発生した廃棄物の処理実績（平成30年7月末現在）

|         | 除染廃棄物  | 災害廃棄物  | 合計      |
|---------|--------|--------|---------|
| 処理量（袋）  | 99,204 | 37,238 | 136,442 |
| 処理量（トン） | 21,705 | 7,543  | 29,248  |

- ・焼却灰等の発生量（平成30年7月末現在）

|         | 焼却灰   | ばいじん  | 合計    |
|---------|-------|-------|-------|
| 発生量（トン） | 6,030 | 1,284 | 7,314 |
| 発生量（袋）  | 4,221 | 1,123 | 5,344 |

- ・焼却灰等の放射性物質濃度（平成30年7月末現在）

|                    | 焼却灰             | ばいじん             |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 放射性物質濃度<br>(Bq/kg) | 19,000 ～ 96,000 | 13,000 ～ 170,000 |

# 中間貯蔵施設用地の状況について

平成30年7月末時点  
赤字は8月20日時点

別添6

| 全体面積<br>約1,600ha                 | 項 目                                                                                                     | 全体面積に対する<br>面積と割合      | 全体登記記録人数<br>(2,360人※1)に対する<br>人数と割合 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                  | 地権者連絡先把握済み                                                                                              | 約1,550ha ※1<br>96.9%   | 約1,910人 ※1<br>80.9%                 |
| <u>民有地</u><br>約1,270ha<br>(約79%) | <u>契約済</u><br>(8月20日時点)                                                                                 | <u>うち民有地</u><br>約971ha | 計                                   |
|                                  |                                                                                                         | <u>うち民有地</u><br>約951ha | 約1,007ha<br>(62.9%)                 |
|                                  | <u>契約済</u><br>(7月末時点)                                                                                   | <u>うち公有地</u><br>約36ha  | 約1,301ha<br>(81.3%)                 |
|                                  |                                                                                                         | <u>うち公有地</u><br>約36ha  | 計                                   |
| <u>公有地</u><br>約330ha<br>(約21%)   | <u>その他の公有地</u>                                                                                          | 約294ha<br>(18.4%)      | 約1,281ha<br>(80.1%)                 |
|                                  | 次を含む。<br>①道路・水路等のように今後も元々の機能を維持する町有地、県有地、国有地等<br>②事業の進展を踏まえつつ、必要に応じて、中間貯蔵施設用地としての提供・契約を調整する町有地、県有地、国有地等 | 約294ha<br>(18.4%)      | <u>1,538人</u> ※2<br>65.2%           |
|                                  |                                                                                                         |                        | <u>1,519人</u><br>64.4%              |
|                                  |                                                                                                         |                        | 連絡先把握済みの1,910人に対する割合は、79.5%         |

※1 国、地方公共団体を含む。  
※2 民有地1,536人、公有地2人。



## 富岡町麓山の火祭りが開催されました

8月15日に富岡町の麓山神社において「麓山の火祭り」が開催され、多くの町民が8年ぶりの祭りの再開を祝いました。

環境省ではこの麓山の火祭りを取材し、町のPR動画の制作を進めています。

※桜まつりを取材して制作したPR動画が富岡町公式チャンネル（YouTube）で公開されています。



見て、触れて、学べる ふくしまの環境再生

# リプルふくしま

特定廃棄物埋立情報館

放射性物質に汚染されたごみの埋立処分について  
わかりやすく学べる体験型の情報館です。



環境省






# 特定廃棄物の埋立処分事業を わかりやすく学べる多彩な展示や 体験・参加型イベント等が盛りだくさん。

## 埋立処分の仕組みや安全性を、デジタルコンテンツで体験



汚染されたごみの種類や処理の流れを最新技術を使って紹介します。



埋立処分施設で行われていることや、様々な安全対策を、模型とデジタル技術を組み合わせた展示で紹介します。



目には見えない放射線の性質について、マルチタッチテーブルを使い、視覚的に楽しく学ぶことができます。



## 実験教室やモニタリング体験、埋立処分施設の見学会を開催

※事前のお申込みが必要なものがございます。




埋立処分に使われている技術を模擬体験できる実験教室や環境体験学習イベントを開催します。

[モニタリングフィールドにて開催]



放射線量などの測定(モニタリング)を体験できます。


[特定廃棄物の埋立処分施設にて開催]



実際の埋立処分作業の様子を見学することができます。

## 特定廃棄物の埋立処分事業とは？

福島県内の既存の管理型処分場を活用して、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、国が責任をもって、放射性物質に汚染された廃棄物(10万Bq/kg以下の特定廃棄物)等の埋立処分を行う事業です。



- お車でのアクセス: 常磐自動車道 広野ICから約15分 国道6号線を相馬方面へ進み、上郡山のT字交差点付近
- 電車でのアクセス: JR常磐線富岡駅よりタクシーで約10分

# リプルンふくしま

特定廃棄物埋立情報館

福島県双葉郡富岡町  
大字上郡山字太田526-7

〈開館時間〉9:00~17:00 〈入館料〉無料

〈休館日〉月曜日・年末年始 ※月曜日が祝日の場合は翌平日

リプルンふくしまへのお問い合わせや

埋立処分施設見学のお申込み窓口

TEL:0240-23-7781(9:00~17:00)

リプルンふくしま

検索

