

福島地方環境事務所の最近の動き
(今週の福島)

【最近の動きのポイント】

○ 除染・廃棄物対策関連

- ・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です

○ 中間貯蔵施設関連

- ・双葉工区 4 カ所目となる、本年度発注した土壌貯蔵施設工事（双葉③工区）が着工しました（9/12）

＜除去土壌等の輸送の進捗状況＞

今年度の輸送対象物量	搬入済量（9/11 時点）	進捗率
約 180 万 m ³	約 51.9 万 m ³	約 29.1%
累積の輸送対象物量	搬入済量（9/11 時点）	進捗率
約 1,400 万 m ³	約 127.8 万 m ³	約 9.2%

○ リスクコミュニケーション等関連

- ・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です
- ・大熊町の八幡神社で震災以降初めての「交流イベント」が開催されました（9/8）
- ・環境再生プラザが「ふくしまフェスタ in 有楽町」で移動展示を行います（9/14、15）

I. 除染・廃棄物対策関連

1 特定復興再生拠点区域の解体・除染について

帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋解体・除染等を実施しています。

○ 最近の動き

- ・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です。

詳細は別添 1、3 のとおり

2 避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について

帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。

各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。

仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。

- 除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1 のとおり

- 特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 4 のとおり

II. 中間貯蔵施設関連

中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。

（1）最近の動き

- 双葉工区 4 カ所目となる、本年度発注した土壌貯蔵施設工事（双葉③工区）が着工しました。これは、本年度発注した第 3 期工事の中で最初に着工した工区となります。

- 除去土壌等の輸送の進捗状況

今年度の輸送対象物量	搬入済量（9/11 時点）	進捗率
約 180 万 m ³	約 51.9 万 m ³	約 29.1%
累積の輸送対象物量	搬入済量（9/11 時点）	進捗率
約 1,400 万 m ³	約 127.8 万 m ³	約 9.2%

(2) 平成 30 年度の進捗状況

○ 除去土壌等の輸送

(9 月 11 日までの搬入実績)

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 (m ³)	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定量 (m ³)	今年度の 搬入済量(m ³)	累積 搬入済量 (m ³)
浜通り	いわき市	22,200	7,800	7,765	30,163
	相馬市	16,100	－	－	16,851
	南相馬市	113,200	－	17,864	45,926
	広野町	31,900	－	743	10,303
	檜葉町	72,400	－	31,486	56,942
	富岡町	162,400	－	43,382	86,831
	川内村	42,400	－	30,454	45,009
	大熊町	147,000	－	42,885	94,249
	双葉町	132,700	－	12,216	59,135
	浪江町	130,300	－	17,932	54,410
	葛尾村	71,400	－	25,769	42,296
	飯舘村	151,600	－	41,042	69,333
中通り	福島市	78,700	20,000	14,831	39,706
	郡山市	67,200	20,900	57,901	121,268
	白河市	33,800	100	17,826	42,287
	須賀川市	22,000	3,600	13,633	28,558
	二本松市	50,000	－	16,216	59,997
	田村市	47,800	300	15,910	42,400
	伊達市	62,600	6,000	16,712	37,630
	本宮市	20,600	－	10,297	33,582
	桑折町	19,200	－	801	17,435
	国見町	16,300	－	6,948	18,292
	川俣町	71,600	－	26,506	48,785
	大玉村	13,700	－	7,073	16,338
	鏡石町	0	300	323	7,853
	天栄村	16,100	－	2,212	11,883
	西郷村	54,900	－	22,125	43,209
	泉崎村	15,200	－	5,324	15,755
	中島村	6,400	－	5,827	14,054
	矢吹町	13,900	－	7,279	16,876
	三春町	24,400	－	－	14,189
合計		1,728,000	59,000	519,282	1,277,947※

※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 m³と換算しています。

※ 中間貯蔵施設への搬入済量(2018 年 5 月末時点)及び輸送待機量(焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量(国直轄除染:2018 年 5 月末時点、市町村

- 除染：2018年3月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018年5月末時点、市町村除染：2018年3月末時点）の合計量。
- ※ 10万Bq/kg超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
- ※ 累積搬入済量の合計値には、2018年3月末時点で搬入が完了している市町村の搬入量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬入済量の合計とは数字が一致しません。

- 中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
<http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba>
- 中間貯蔵施設に係る工事等について
工事等の一覧は別添2のとおり

Ⅲ. 放射線健康リスクコミュニケーション等関連

①自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。

（1）最近の動き

- 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。
- 放射線を可視化するガンマカメラを活用した、住民向けリスクコミュニケーション支援事業を実施中です。
- 川内村（9/3～9/6）と檜葉町（9/3～9/9）において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しました。
- 富岡町（9/19・白河会場）において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施します。
- 9月8日、大熊町の八幡神社において、震災以降初めての「交流イベント」が開催されました。
別添5のとおり
- 9月14日（金）、15日（土）に開催される「ふくしまフェスタ in 有楽町」において、環境再生プラザが移動展示を行います。
本イベントに関する詳細（福島県チラシ）は別添6のとおり

（2）これまでの実施状況

（9月14日時点）

項 目		実施回数	
		H29 年度	今年度
① 自治体職員や相談員等の活動の支援	（ア）職員向け研修会	77 回	26 回
	（イ）専門家派遣	47 回	7 回

②住民の放射線に関する理解醸成の支援	(ア) 住民セミナー	72 回	18 回
	(イ) 車座意見交換会	62 回	22 回
	(ウ) 個人線量測定の支援(WBC)	83 日	38 日
	(エ) リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）による活動		
	(オ) ガンマカメラ活用リスクコミュニケーション支援事業	184 台・日	96 台・日
③環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）	(ア) 専門家派遣	142 件	57 件
	(イ) 移動展示	42 件 [55 日]	19 件 [29 日]

除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧
(除染特別地域、汚染廃棄物対策地域)

市町村	工事名
南相馬市	○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事 (H30/2/13～) ※H30.3 月に着工 ○平成 29 年度南相馬市建物解体等撤去工事 (H29/4/19～) ※H30.8 月に完了 ○平成 30 年度南相馬市建物解体等撤去工事 (H30/8/8～) ※着工準備中
浪江町	○平成 29 年度 (平成 28 年度繰越) 浪江町フォローアップ除染等工事 (H29/9/25～) ※H29.10 月に着工 ○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事 (H30/5/15～) ※H30.7 月に着工 <u>○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 1) (H30/6/20～)</u> ※H30.8 月に着工 ○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事 (H30/1/25～) ※H30.3 月に着工 ○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事 (H30/4/11～) ※H30.6 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請 (特定復興再生拠点区域) を受付中
双葉町	<u>○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 1) (H29/12/4～)</u> ※H29.12 月に着工 <u>○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 2) (H30/1/10～)</u> ※H30.2 月に着工 ○平成 29 年度双葉町建物解体等撤去工事 (その 2) (H30/2/8～) ※H30.4 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請を受付中
大熊町	○平成 30 年度 (平成 29 年度繰越) 大熊町仮置場復旧等工事 (H30/7/19～) ※H30.8 月に着工 <u>○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その 1) (H30/1/25～)</u> ※H30.3 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事


市町村	工事名
富岡町	○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他) (H29/5/22～) ※H29.6 月に着工 ○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町フォローアップ除染等工事 (H29/9/26～) ※H29.10 月に着工 <u>○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染 等工事(その 1)(H30/8/7～)</u> ※H30.8 月に着工 ○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事(その 2)(H29/12/27～) ※H30.3 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付中
檜葉町	○平成 29 年度檜葉町仮置場復旧等工事(H29/4/19～) ※H29.5 月に着工 ○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)檜葉町仮置場復旧等工事(H30/7/5～) ※H30.8 月に着工 ○平成 30 年度檜葉町建物解体等撤去工事(H30/7/9～) ※H30.7 月に着工
飯舘村	○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)飯舘村仮置場復旧等工事(H30/4/10～) ※H30.4 月に着工 <u>○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染 等工事(H30/9/4～)</u> ※着工準備中 ○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事(H30/4/13～) ※H30.6 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付終了
川俣町	○平成 29 年度川俣町可燃物処理等整備工事(H29/8/8～) ※H30.8 月に完了 ○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29～) ※H30.6 月に着工 ○平成 30 年度川俣町建物解体等撤去工事(公共特殊建物)(H30/7/26～) ※着工準備中
葛尾村	○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事(その 2)(H30/6/20 ～) ※H30.7 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付中
田村市 川内村	○平成 30 年度田村市・川内村仮置場復旧等工事(H30.8.21～) ※着工準備中

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

中間貯蔵施設に係る工事等の一覧

	工事名
土壌貯蔵施設等	○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(双葉町) (H28/6/14～) ※H28. 11 月に着工、H29. 12 月貯蔵開始
	○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(大熊町) (H28/6/14～) ※H28. 11 月に着工、H29. 10 月貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵(双葉 1 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/11～) ※H29. 10 月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み
	○平成 29 年度中間貯蔵(双葉 2 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/18～) ※H30. 1 月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み
	○平成 29 年度中間貯蔵(大熊 1 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/11～) ※H29. 11 月に着工、H30. 7 月貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵(大熊 2 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/11～) ※H29. 9 月に着工、H30. 7 月貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵(大熊 3 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/18～) ※H29. 11 月に着工、H30. 7 月から受入・分別施設の運転開始、9 月に貯蔵開始見込み
	○平成 30 年度中間貯蔵(双葉 3 工区)土壌貯蔵施設工事 (H30/4/6～) ※H30. 9 月 12 日に着工
	○平成 30 年度中間貯蔵(大熊 4 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H30/4/5～) ※今年度中に着工予定
	○平成 30 年度中間貯蔵(大熊 5 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H30/4/10～) ※今年度中に着工予定

	工事名
廃棄物 関連施設	○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物 処理その 1 業務 （H30/ 3 / 1 ～） ※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定
	○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物 処理その 2 業務 （H30/ 3 / 1 ～） ※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定
	○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事 （H30/ 3 / 9 ～） ※H30. 6 月に着工、平成 31 年度内に稼働予定
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事 （H30/ 3 / 8 ～） ※H30. 7 月に着工、平成 31 年度内に稼働予定
その他 施設等	○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・ 双葉町）（H29/12/23～）
	○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町）（H30/ 1 /19～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事 （H30 / 7 /19～）
	○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/ 8 /24～）

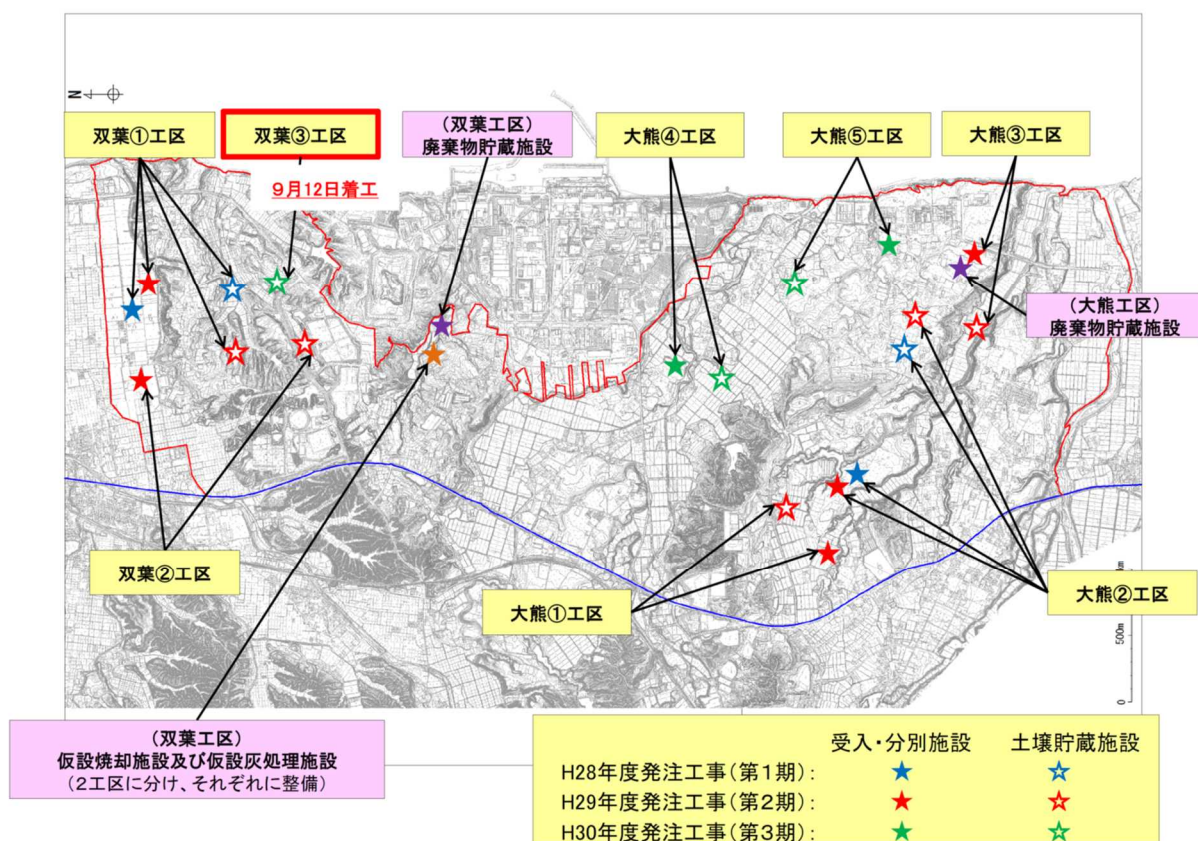


特定復興再生拠点区域整備の状況 (2018年9月14日時点)

別添 3

- 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
- 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備（除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から5年を目途に避難指示解除を目指す）。
- これまでに、以下6町村の計画が認定され、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町で解体・除染工事に着工。


双葉町(2017.9.15認定、約560ha)

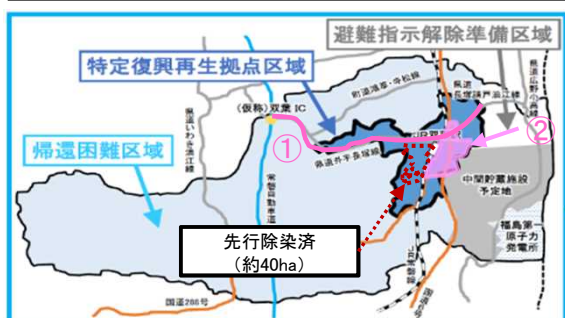

【工事状況】

- ①復興シンボル軸解体・除染工事
(解体55件、除染約7ha) : 12月25日着工
- ②駅東等解体・除染工事
(解体640件、除染約90ha) : 実施中

大熊町(2017.11.10認定、約860ha)

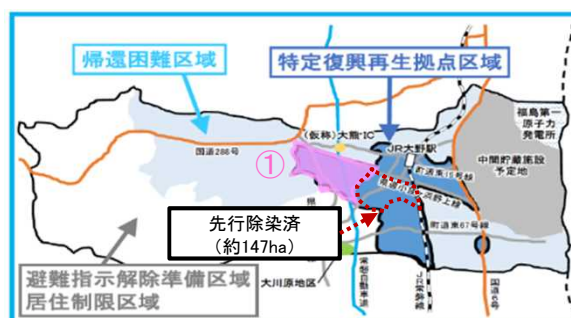

【工事状況】

- ①下野上地区の西エリアを中心とした解体・除染工事
(解体460件、除染約160ha) : 3月9日着工

浪江町(2017.12.22認定、約660ha)



【工事状況】

- ①一部道路の除染工事(除染約4ha) : 完了
- ②3地区における解体・除染工事
(解体60件、除染約30ha) : 実施中

富岡町(2018.3.9認定、約390ha)



【工事状況】

- ①夜ノ森駅周辺の除染工事(除染約0.3ha) : 完了
- ②拠点北エリアの解体・除染工事
(解体300件、除染約80ha) : 実施中

飯舘村(2018.4.20認定、約186ha)



【工事状況】解体・除染工事について調整中

葛尾村(2018.5.11認定、約95ha)



【工事状況】解体・除染工事について調整中

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

平成 30 年 9 月 14 日

【最新の進捗状況】

搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
9/5～9/11	1,228	34,446

※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】

搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
平成 29 年 11 月	707	707
平成 29 年 12 月	2,746	3,453
平成 30 年 1 月	1,866	5,319
平成 30 年 2 月	2,523	7,842
平成 30 年 3 月	4,060	11,902
平成 30 年 4 月	4,965	16,867
平成 30 年 5 月	4,287	21,154
平成 30 年 6 月	5,615	26,769
平成 30 年 7 月	3,445	30,214
平成 30 年 8 月	2,504	32,718
平成 30 年 9 月（11 日まで）	1,728	34,446

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。

http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/

大熊町町民交流イベントが開催されました

別添 5

9月8日に大熊町の八幡神社において震災以降初めての交流イベントが開催されました。当日は約80人の参加者がバーベキューや盆踊りを楽しみました。

環境省では参加者へのインタビューを実施し、復興に向けて邁進する町の姿を紹介するパネルを作製しており、作製したパネルは9月29日、30日に新宿御苑で開催されるGTFグリーンチャレンジデーなど各種イベントにおいて紹介される予定です。



渡辺町長の開会挨拶



バーベキュー大会



町の方々の語らい



盆踊り大会



参加された方への取材



参加者集合写真

ふくしまフェスタ



ふくしまからはじめよう。
キビタン



知るほどたのしい、ふくしま

福島県の魅力が都内に大集合！特産品の販売、ふくしまの復興の今や観光の魅力を
お伝えするイベントを開催します！この機会にぜひご家族そろってご来場ください！

各会場では！

**ふくしまの
おいしい特産品の
販売を行います！**



会場によって写真の
商品の販売がない
場合もございます。
※商品写真はイメージです

300円以上のお買いもの、
又は、SNSフォローなどで
参加できる抽選会を実施します。

**ガラポン抽選会も
開催！**



ららぽーと豊洲

開催日 2018. 8/3(金)・4(土)・5(日)
10:00-18:00(予定)
場所 アーバンドック
ららぽーと豊洲
SOUTH PORT 1F



有楽町

開催日 2018. 9/14(金)・15(土)
11:00-18:00(予定)
場所 JR有楽町駅前広場



上野公園

開催日 2018. 10/18(木)・19(金)
11:00-18:00(予定)
場所 上野公園「噴水広場」



「ふくしまフェスタ」の最新情報は
SNSをチェック！

「ふくしまフェスタ」は11月以降も開催！
追加のイベントもSNSから告知いたします！



ふくしまフェスタ公式
facebookはコチラから▶
facebook



ふくしまフェスタ公式
Instagramはコチラから▶
Instagram
@fukushimafesta

