

福島地方環境事務所の最近の動き (今週の福島)

【最近の動きのポイント】

- ・ 福島復興・再生に向けた環境省の取組等をお伝えする広報誌「ふくしま環境再生」を発行しました（4/26）

○ 除染・廃棄物対策関連

- ・ 双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です
- ・ 除染特別地域（直轄除染）の仮置場等における保管物数は、平成 31 年 3 月の 1 ヶ月間に約 13 万袋減少しました

<直轄除染の仮置場等の進捗状況（3/31 時点）>

保管中	搬出完了	うち原状回復完了
194 箇所	128 箇所（約 40%※）	89 箇所（約 28%※）

※ 仮置場等の総数 322 箇所に対する比率

○ 中間貯蔵施設関連

- ・ 輸送開始（平成 27 年 3 月）からの累積輸送量が、4 月 23 日時点で現時点の輸送対象物量の 2 割（280 万 m³）を超えました
- ・ 第 3 期施設のうち、大熊⑤工区の土壌貯蔵施設について 4 月 22 日から運転を開始しました

<除去土壌等の輸送の進捗状況（4/23 時点）>

今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約 400 万 m ³	約 18.0 万 m ³	約 4.5%
累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約 1,400 万 m ³	約 280.5 万 m ³	約 20.0%

○ リスクコミュニケーション等関連

- ・ 自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です

0. 福島地方環境事務所

- 福島の復興・再生に向けた環境省の取組等を広く知っていただくため、広報誌「ふくしま環境再生」を発行しました（4/26）。
毎月1回発行し、福島県内の自治体庁舎等で配布するほか、環境省ホームページ「除染情報サイト」(<http://josen.env.go.jp/>)で公開します。
別添7のとおり

I. 除染・廃棄物対策関連

1 特定復興再生拠点区域の解体・除染について

帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋等の解体・除染を実施しています。

- 最近の動き
 - ・ 双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です。
詳細は別添1、3のとおり

2 避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について

帰還困難区域を除き、8県100市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。

各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。

仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。

- 除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添1のとおり
- 除染仮置場等の状況について
 - ・ 除染特別地域（直轄除染）における除染仮置場等の状況について（平成31年3月31日時点）
前月（2月28日時点）と比較して、除染特別地域（直轄除染）の仮置場等における保管物数が約13万袋減少し、約565万袋となりました。なお、4箇所の仮置場（川俣町1箇所、南相馬市1箇所、浪江町2箇所）で搬出が、また22箇所の仮置場（楢葉町4箇所、大熊町2箇所、葛尾村6箇所、飯舘村9箇所、富岡町1箇所）で原状回復がそれぞれ完了しました。これにより、除染特別地域の総仮置場数322箇所のうち、搬出完了したものが128箇所（約40%）、さらにそのうち原状回復完了したものが89箇所（約28%）となりました。

詳細は別添4のとおり

※仮置場等からの搬出先は、中間貯蔵施設の他に減容化施設もあること等から、仮置場からの搬出量と中間貯蔵施設への搬入量とは一致しない。

- 特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 5 のとおり

Ⅱ. 中間貯蔵施設関連

中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。

(1) 最近の動き

- 輸送開始（平成 27 年 3 月）からの累積輸送量が、4 月 23 日時点で現時点の輸送対象物量の 2 割（280 万 m³）を超えました。
- 第 3 期施設のうち、大熊⑤工区の土壌貯蔵施設について 4 月 22 日から運転を開始しました。
別添 6 のとおり

- 除去土壌等の輸送の進捗状況（4/23 時点）


今年度の輸送対象物量	今年度搬出済量	今年度進捗率
約 400 万 m ³	約 18.0 万 m ³	約 4.5%
累積の輸送対象物量	累積搬出済量	累積進捗率
約 1,400 万 m ³	約 280.5 万 m ³	約 20.0%

(2) 平成 31 年度の進捗状況

- 除去土壌等の輸送 (4 月 23 日までの搬出実績)

搬出市町村		今年度の 搬出可能量 (m ³)	今年度の 学校等(現場保管) からの輸送予定量 (m ³)	今年度の 搬出済量(m ³)	累積 搬出済量 (m ³)
浜通り	いわき市	50,000	10,000	4,073	60,012
	相馬市	39,000		6,428	39,689
	南相馬市	274,000	8,000	7,773	153,474
	広野町	67,000		4,109	49,563
	楡葉町	149,000		10,600	130,670
	富岡町	406,000		13,479	224,753
	川内村	96,000		3,361	62,052
	大熊町	342,000		12,749	196,854
	双葉町	312,000		0	152,573
	浪江町	353,000		10,255	175,986

	葛尾村	168,000		9,451	108,277
	飯舘村	395,000		11,119	190,144
中通り	福島市	198,000	78,000	19,613	136,573
	郡山市	153,000		12,075	210,487
	白河市	63,000		3,931	72,066
	須賀川市	53,000		5,770	54,775
	二本松市	113,000		7,439	105,703
	田村市	101,000		4,367	82,984
	伊達市	85,000	4,000	4,957	88,310
	本宮市	58,000		1,692	47,645
	桑折町	43,000		5,209	43,482
	国見町	39,000		4,216	32,731
	川俣町	163,000		10,561	94,153
	大玉村	26,000		1,645	26,906
	天栄村	34,000		665	26,993
	西郷村	125,000		2,920	83,103
	泉崎村	18,000		930	28,203
	矢吹町	10,000		748	22,449
	三春町	47,000		0	44,674
合計		3,980,000	100,000	180,135	2,804,564※

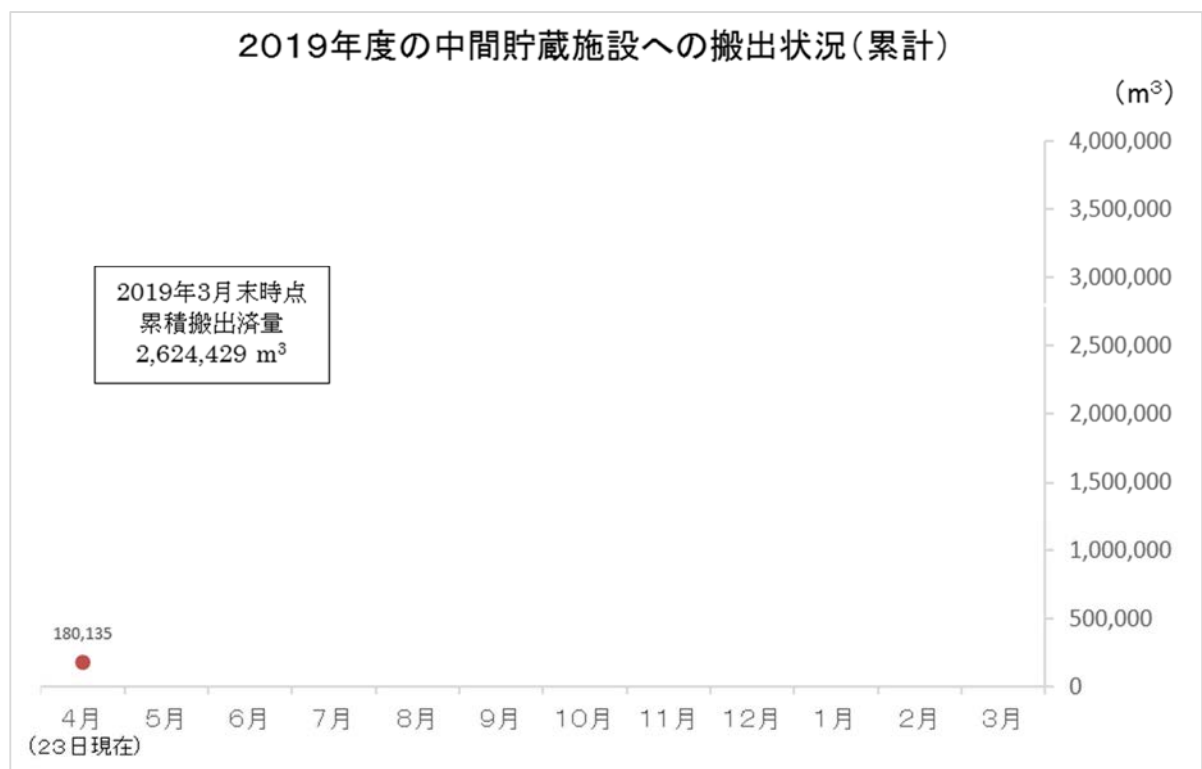

- ※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 m³と換算しています。
 - ※ 輸送対象物量 1,400 万 m³は、中間貯蔵施設への搬出済量（国直轄除染市町村：2018 年 11 月末、市町村除染市町村：2018 年 9 月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2018 年 11 月末）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018 年 11 月末時点、市町村除染：2018 年 9 月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018 年 11 月末時点、市町村除染：2018 年 9 月末時点））の合計量。
 - ※ 輸送対象物量 1,400 万 m³には、10 万 Bq/kg 超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
 - ※ 累積搬出済量の合計値には、2019 年 3 月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
- 中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
<http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba>
 - 中間貯蔵施設に係る工事等について
工事等の一覧は別添 2 のとおり

Ⅲ. 放射線健康リスクコミュニケーション等関連

- ① 自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。
- （１）最近の動き
- 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）等を実施中です。
 - 楢葉町において職員を対象に「放射線の基礎等を学ぶ研修会」を開催しました（4/23）。

(2) これまでの実施状況

(4月26日時点)

項 目		実施回数	
		H30 年度	今年度
① 自治体職員や相談員等の活動の支援	(ア) 職員向け研修会	36 回	2 回
	(イ) 専門家派遣	20 回	1 回
② 住民の放射線に関する理解醸成の支援	(ア) 住民セミナー	38 回	0 回
	(イ) 車座意見交換会	57 回	4 回
	(ウ) 個人線量測定の実施(WBC)	87 日	2 日
	(エ) リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）による活動		
	(オ) ガンマカメラ活用リスクコミュニケーション支援事業	180 台・日	公示準備中
③ 環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）	(ア) 専門家派遣	152 件	5 件
	(イ) 移動展示	45 件 [62 日]	3 件 [3 日]

除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧
(除染特別地域、汚染廃棄物対策地域)

市町村	工事名
南相馬市	○平成 30 年度南相馬市仮置場復旧等工事 (H31/1/23～) ※H31. 2 月に着工
浪江町	○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び 除染等工事 (その 1) (H30/6/20～) ※H30. 8 月に着工 ○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び 除染等工事 (その 2) (H31/1/29～) ※H31. 2 月に着工 ○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事 (H30/4/11～) ※H30. 6 月に着工 ○平成 31 年度浪江町仮置場復旧等工事 (H31/4/11～) ※着工準備中 ○被災家屋等の解体撤去申請 (特定復興再生拠点区域) を受付中
双葉町	○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び 除染等工事 (その 2) (H30/1/10～) ※H30. 2 月に着工 ○平成 31 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び 除染等工事 (その 3) (H31/4/11～) ※着工準備中 ○被災家屋等の解体撤去申請を受付中
大熊町	○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び 除染等工事 (その 1) (H30/1/25～) ※H30. 3 月に着工 ○平成 30 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び 除染等工事 (その 2) (H31/1/24～) ※H31. 2 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請を受付中
富岡町	○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び 除染等工事 (その 1) (H30/8/7～) ※H30. 8 月に着工 ○被災家屋等の解体撤去申請 (特定復興再生拠点区域) を受付中
楡葉町	○平成 30 年度 (平成 29 年度繰越) 楡葉町仮置場復旧等工事 (H30/7/5～) ※H30. 8 月に着工

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事


市町村	工事名
飯舘村	<u>○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/9/5～）</u> ※H30. 9 月に着工 <u>○平成 31 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H31/4/8～）</u> ※着工準備中 ○平成 31 年度飯舘村仮置場復旧等工事（H31/4/8～） ※着工準備中 ○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付終了
川俣町	○平成 30 年度川俣町仮置場復旧等工事（その 2）（H31/3/1～） ※H31. 3 月に着工
葛尾村	<u>○平成 30 年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/10/9～）</u> ※H30. 11 月に着工 <u>○平成 31 年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H31/4/8～）</u> ※着工準備中 ○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

中間貯蔵施設に係る工事等の一覧

	工事名
土壌貯蔵施設等	○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（2017/5/11～） ※2018.9 月分別処理、貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（2017/5/18～） ※2019.2 月分別処理開始、今年度春に貯蔵開始見込み
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（2017/5/11～） ※2018.7 月分別処理、貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（2017/5/11～） ※2018.7 月分別処理、貯蔵開始
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 3 工区）土壌貯蔵施設等工事（2017/5/18～） ※2018.7 月分別処理開始、10 月貯蔵開始
	○平成 30 年度中間貯蔵（双葉 3 工区）土壌貯蔵施設工事（2018/4/6～） ※2018.9 月に着工
	○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 4 工区）土壌貯蔵施設等工事（2018/4/5～） ※2018.12 月に着工
	○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 5 工区）土壌貯蔵施設等工事（2018/4/10～） ※2019.4 月に貯蔵開始、今年度夏以降に分別処理開始見込み
	○平成 30 年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事（双葉町）（2019/1/10～） ※2019.3 月分別処理開始（双葉①工区）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事（大熊町）（2019/1/10～） ※2019.3 月分別処理開始（大熊①工区）
廃棄物関連施設	○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 1 業務（2018/3/1～） ※2019.1 月に着工、2019 年度内に稼働予定
	○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 2 業務（2018/3/1～） ※2019.1 月に着工、2019 年度内に稼働予定

	工事名
	○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事（2018/3/9～） ※2018.6 月に着工、2019 年度内に稼働予定
	○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事（2018/3/8～） ※2018.7 月に着工、2019 年度内に稼働予定
	○平成 30 年度中間貯蔵（双葉 2 工区）廃棄物貯蔵施設工事（2019/3/11～）
その他 施設等	○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町） （2017/12/23～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事（2018/7/19～）
	○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（2018/8/24～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町） （2018/10/25～）
	○平成 30 年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊町・双葉町） （2018/12/22～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事（双葉町）（2019/1/17～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事（大熊町）（2019/1/17～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（双葉町） （2019/1/19～）
	○平成 30 年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（大熊町） （2019/1/19～）

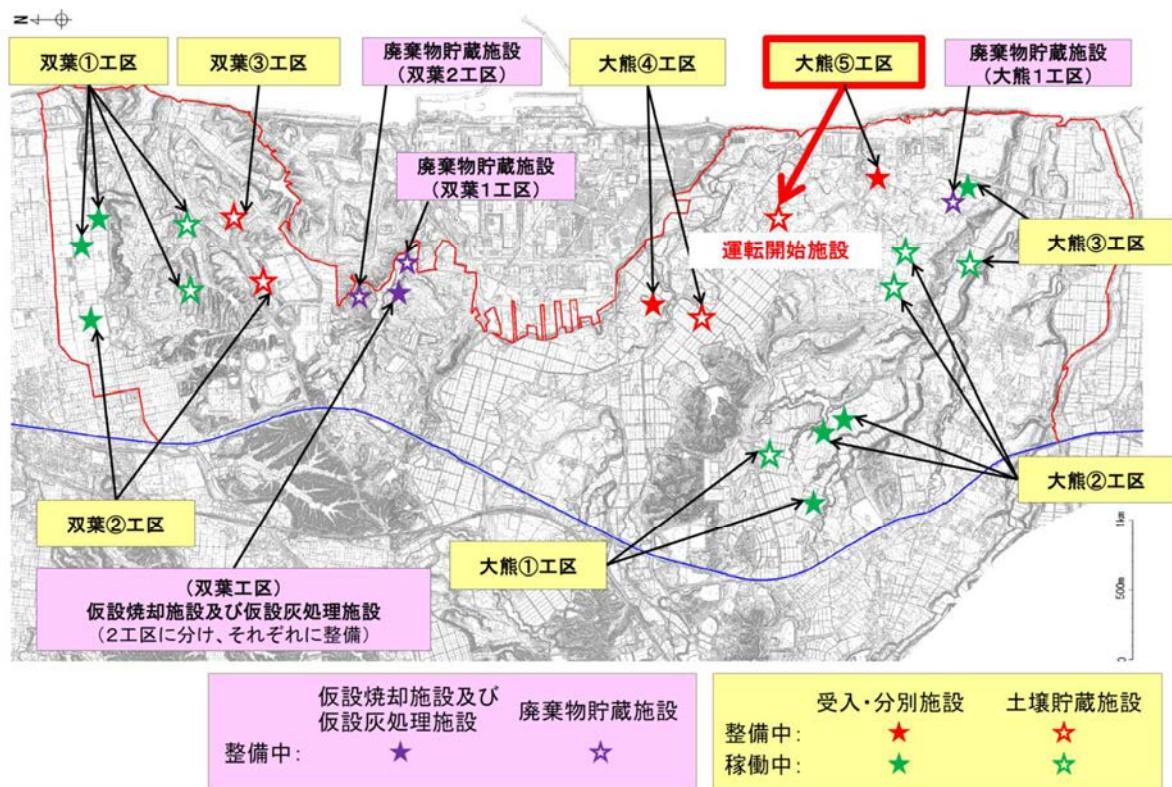


特定復興再生拠点区域整備の状況 (2019年4月26日時点)

別添 3

- 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
- 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備（除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から5年を目途に避難指示解除を目指す）。
- これまでに、以下6町村の計画が認定され、全ての町村において解体・除染等工事を実施中。


双葉町(2017.9.15認定、約560ha)

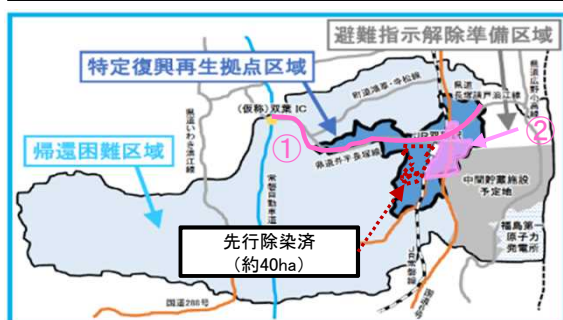

【工事状況】:2017.12.25着工

- ①復興シンボル軸(解体55件、除染約7ha): 実施中
- ②駅東地区(解体640件、除染約90ha): 実施中

大熊町(2017.11.10認定、約860ha)

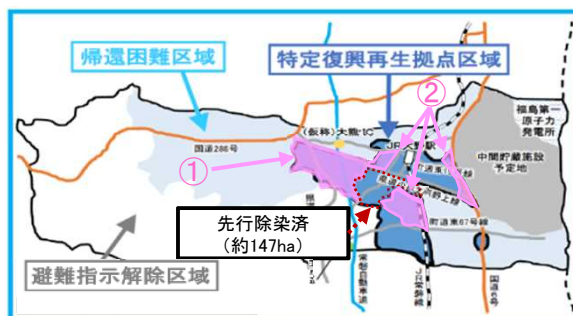

【工事状況】:2018.3.9着工

- ①下野上西地区(解体460件、除染約160ha): 実施中
- ②駅周辺西地区、国道6号線沿線、下野上南地区(解体300件、除染約140ha): 実施中

浪江町(2017.12.22認定、約660ha)



【工事状況】:2018.5.30着工

- ①一部道路の除染等工事(除染約4ha): 完了
- ②室原、末森、津島地区(解体160件、除染約290ha): 実施中


富岡町(2018.3.9認定、約390ha)



【工事状況】:2018.7.6着工

- ①夜ノ森駅周辺(除染約0.3ha): 完了
- ②拠点北地区(解体300件、除染約80ha): 実施中


飯舘村(2018.4.20認定、約190ha)

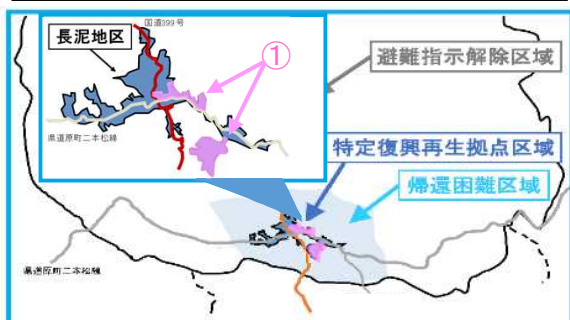

【工事状況】:2018.9.28着工

- ①長泥地区の居住促進ゾーン(解体20件、除染約30ha): 実施中

葛尾村(2018.5.11認定、約95ha)

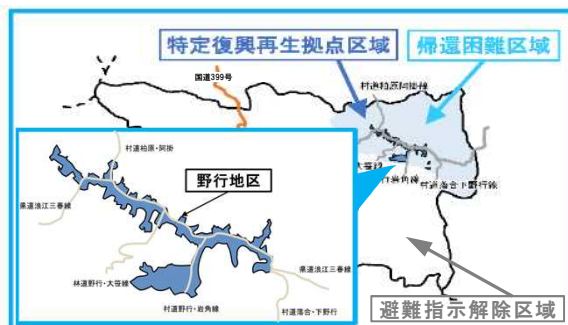

【工事状況】:2018.11.20着工

- ①野行地区(解体10件、除染約0.5ha): 実施中

※ 一部周辺地区においても解体・除染工事等を実施中

除染仮置場等の状況について

■福島県全体

2019年4月26日

仮置場等の状況

直轄除染 2019年 3月31日時点
市町村除染 2018年12月31日時点

	仮置場等の総数	うち 保管中	うち 搬出完了	うち 原状回復完了 (返地済み)
除染特別地域 (直轄除染)	322	194	128 (40%)	89 (28%)
汚染状況重点 調査地域等 (市町村除染)	996	727	269 (27%)	203 (20%)
合計	1,318	921	397 (30%)	292 (22%)

(出典) 汚染状況重点調査地域等(市町村除染)は、「市町村が設置する仮置場の整備状況等について(平成31年2月25日福島県生活環境部除染対策課 公表資料)」より環境省作成。

注1) 仮置場等 : 仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含む。

注2) 保管中 : 除去土壌等が保管されている仮置場等を示す。



注3) 搬出完了 : 除去土壌等の搬出が完了し、原状回復等の作業中の仮置場等を示す。

注4) 原状回復完了(返地済み) : 原状回復等が完了、または、地権者へ返地した仮置場等を示す。

注5) 搬出完了及び原状回復完了の欄に記載の(%)は、仮置場等の総数に対する割合を示す。

【除去土壌等の保管量の推移】

【仮置場等の箇所数の推移】

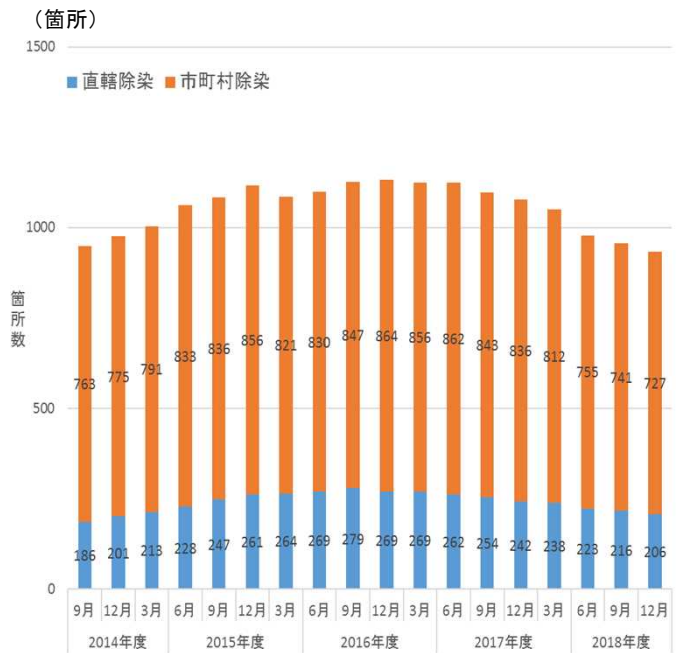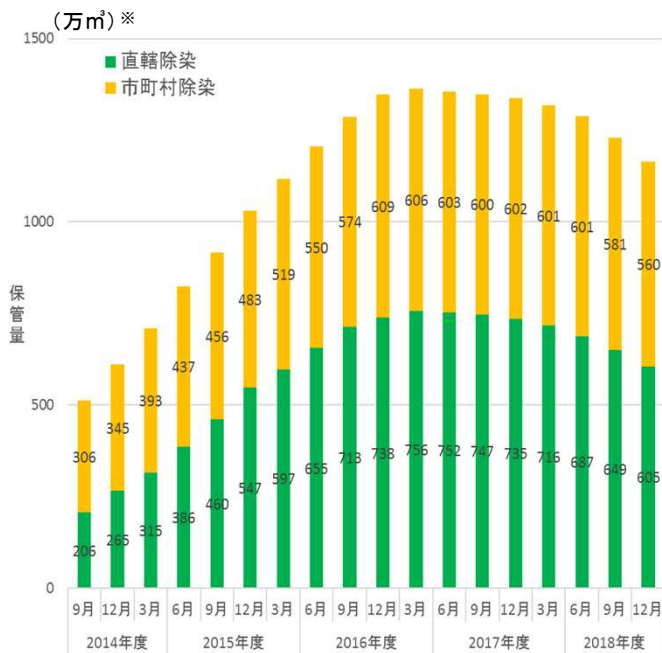

注1) 保管量 : 仮置場等で保管している数(保管物数)。1袋当たりの保管物の体積は、おおむね1 m^3 (ただし、保管物の体積減少により、1袋が1 m^3 より小さくなる場合もある)。

なお、市町村除染分には、現場保管分を含む。

注2) 箇所数 : 保管中の仮置場等の箇所数。

ただし、市町村除染の2018年3月時点以前については、返地前の仮置場等数(「その他の仮置場」は除く)である。

■ 除染特別地域（直轄除染）


仮置場等の状況

（2019年3月31日時点）

市町村	仮置場等の総数	うち		
		保管中	搬出完了	原状回復完了
田村市	6	3	1	2
川内村	2	2	0	0
檜葉町	25	14	4	7
大熊町	18	5	5	8
川俣町	43	37	6	0
葛尾村	33	21	3	9
飯舘村	103	71	12	20
南相馬市	18	12	1	5
浪江町	41	17	5	19
富岡町	22	8	1	13
双葉町	11	4	1	6
合計	322	194	39	89

- 注1) 仮置場等 : 仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含む。
 注2) 保管中 : 除去土壌等が保管されている仮置場等を示す。
 注3) 搬出完了 : 除去土壌等の搬出が完了し、原状回復等の作業中の仮置場等を示す。
 注4) 原状回復完了(返地済み) : 原状回復等が完了、または、地権者へ返地した仮置場等を示す。

仮置場等箇所数と保管物数の推移

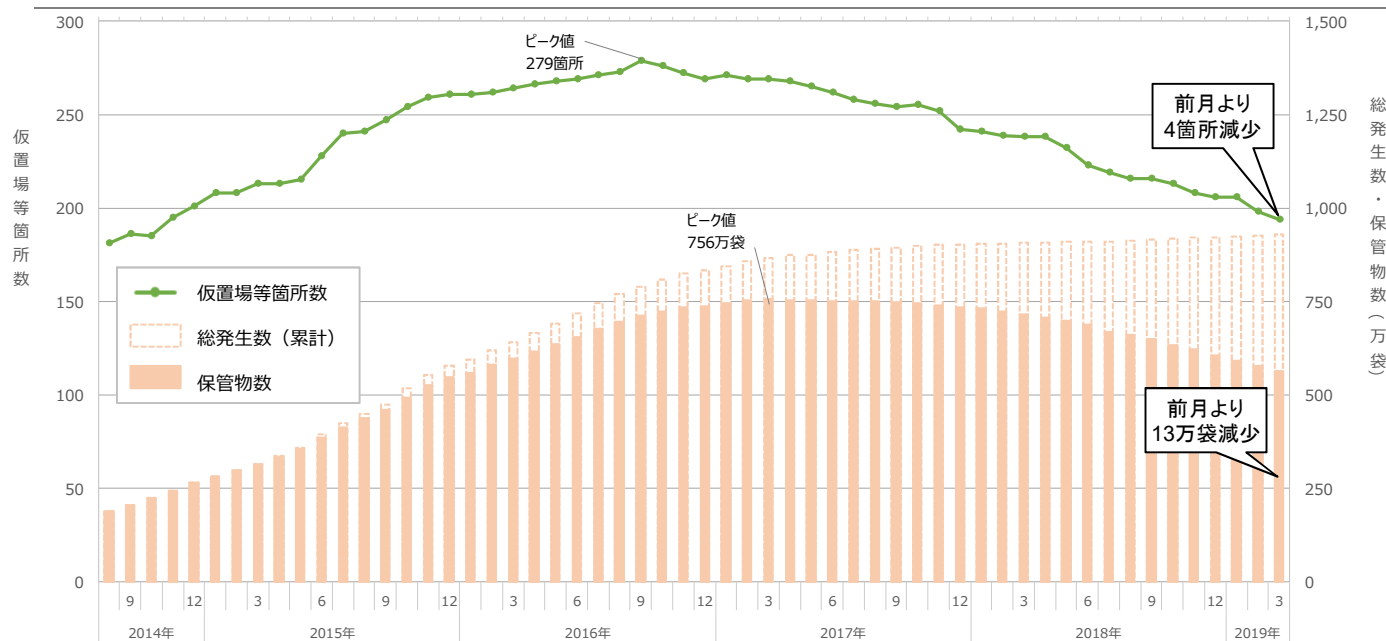

直近1年間の推移

	2018年									2019年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
仮置場等箇所数（箇所）	238	232	223	219	216	216	213	208	206	206	198	194
発生数（累計）（万袋）	908	909	910	911	913	916	917	920	922	924	927	928
保管物数（万袋）	708	698	687	669	659	649	634	622	605	593	578	565

- 注1) 仮置場等箇所数 : 除去土壌等を保管している仮置場等の箇所数を示す。
 注2) 保管物数 : 仮置場等で保管している数で、単位は「袋」。1袋当たりの保管物の体積は、おおむね1m³（ただし、保管物の体積減少により、1袋が1m³より小さくなる場合もある）。
 注3) 除去土壌等の総発生数約928万袋の内訳は、保管物数約565万袋、搬出済み数 約364万袋（うち仮設焼却炉への搬出は約237万袋、中間貯蔵施設等への搬出は約127万袋）
 ※数値は四捨五入して表記しているため、合計値は表示上の数字の合計と一致するとは限らない。

■汚染状況重点調査地域等（市町村除染）

※3月29日公表「今週の福島」より再掲。
(2018年12月31日時点)

仮置場等の状況

方部	市町村	仮置場等の 総数	うち 保管中	うち 搬出完了	うち 返地済み
県北	福島市	39	39	0	0
	二本松市	353	227	2	124
	伊達市	121	93	21	7
	本宮市	26	24	1	1
	桑折町	38	26	6	6
	国見町	11	10	1	0
	川俣町	22	18	4	0
	大玉村	13	10	1	2
県中	郡山市	23	23	0	0
	須賀川市	77	68	0	9
	田村市	97	95	0	2
	鏡石町	4	0	3	1
	天栄村	14	8	5	1
	石川町	1	0	0	1
	玉川村	1	0	0	1
	平田村	1	0	0	1
	浅川町	0	0	0	0
	古殿町	1	0	1	0
	三春町	6	6	0	0
	小野町	3	0	0	3
県南	白河市	11	2	2	7
	西郷村	3	3	0	0
	泉崎村	6	4	2	0
	中島村	1	0	1	0
	矢吹町	4	3	1	0
	棚倉町	12	0	8	4
	矢祭町	0	0	0	0
	塙町	1	0	0	1
	鮫川村	1	0	0	1
会津	会津若松市	1	0	0	1
	猪苗代町	6	0	0	6
	会津坂下町	1	0	0	1
	湯川村	1	0	0	1
	柳津町	0	0	0	0
	三島町	0	0	0	0
	昭和村	1	0	0	1
	会津美里町	1	0	1	0
南会津	下郷町	1	0	0	1
相双	新地町	1	0	0	1
	相馬市	5	5	0	0
	南相馬市	37	35	1	1
	広野町	1	1	0	0
	川内村	9	9	0	0
いわき	いわき市	41	18	5	18
合計		996	727	66	203

注1) 「市町村が設置する仮置場の整備状況等について（平成31年2月25日 福島県生活環境部除染対策課 公表資料）」より環境省作成。

注2) 放射性物質汚染対処特別措置法施行前に設置された仮置場等を含む。網掛けは、汚染状況重点調査地域に指定されていない市町村（指定解除された市町村を含む）。

注3) 保管中 : 除去土壌等が保管されている仮置場等を示す。

注4) 搬出完了 : 除去土壌等の搬出が完了し、原状回復等の作業中の仮置場等を示す。

注5) 返地済み : 原状回復等が完了し、地権者へ返地した仮置場等を示す。

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

平成 31 年 4 月 26 日

【最新の進捗状況】


搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
4/17～4/23	1,326	68,165

※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。


【これまでの進捗状況】

搬入量（袋数）		
期間	実績（袋）	累計
平成 29 年 11 月～平成 30 年 2 月	7,842	7,842
平成 30 年 3 月	4,060	11,902
平成 30 年 4 月	4,965	16,867
平成 30 年 5 月	4,287	21,154
平成 30 年 6 月	5,615	26,769
平成 30 年 7 月	3,445	30,214
平成 30 年 8 月	2,504	32,718
平成 30 年 9 月	4,410	37,128
平成 30 年 10 月	5,804	42,932
平成 30 年 11 月	5,557	48,489
平成 30 年 12 月	4,723	53,212
平成 31 年 1 月	4,467	57,679
平成 31 年 2 月	3,051	60,730
平成 31 年 3 月	3,611	64,341
平成 31 年 4 月(23 日まで)	3,824	68,165

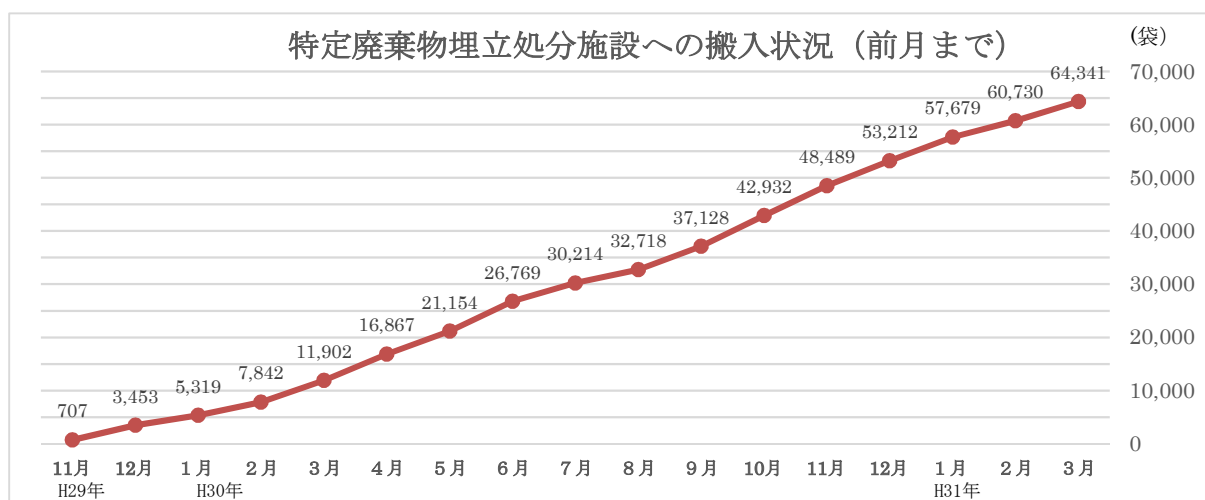

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。

http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/



	受入・分別施設	土壌貯蔵施設
整備中:	★	★
稼働中:	★	★

運転開始の施設（第3期・大熊⑤工区）について

- 2016年11月に施設の工事に着手。
- 土壌貯蔵施設が、4月22日から運転開始。




貯蔵区画の全景



貯蔵の様子

中間貯蔵施設への輸送の進捗状況

環境省では、一日も早い福島復興に向け、仮置場の早期解消に取り組んでいます。除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送は、安全運転を最優先に、制限速度を守って行っています。昨年度は、184万㎡を輸送しました。今年度は400万㎡程度を輸送し、2021年度中に概ね運び終える予定です。

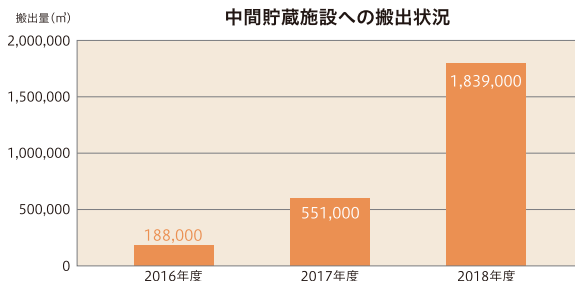

エコライフ・フェア 2019 に出展します



環境再生プラザとリプルンふくしまが合同で出展し、環境省が進める事業を分かりやすくご紹介します。実験教室など体験型のワークショップも行います。是非ご来場ください。

- 開催日：2019年6月1日(土)10:30-17:00
2019年6月2日(日)10:00-16:30
- 開催場所：代々木公園ケヤキ並木・イベント広場(入場無料)
- 公式web：<http://ecolifefair.env.go.jp/>



任期付職員募集中

福島地方環境事務所では、任期付職員を定期的に募集しています。現在は、8月1日付け採用の設計・積算・工事監督・施設管理等の経験者が対象で、5月22日(水)が締め切りとなります。詳細は、福島地方環境事務所ホームページ(<http://fukushima.env.go.jp/>)をご覧ください。

環境省の情報発信拠点

●中間貯蔵工事情報センター



- 所在地 福島県双葉郡大熊町 大字小入野字向畑 256
- 開館時間 10:00～16:00
- 休館日 日曜日・月曜日、年末年始(月曜日が祝日の場合は翌平日)


中間貯蔵施設工事について紹介しています。毎月バスによる中間貯蔵施設見学会(事前申込制)を開催しています。

●リプルンふくしま



- 所在地 福島県双葉郡富岡町 大字上郡山字太田 526-7
 - 開館時間 9:00～17:00
 - 休館日 月曜日、年末年始(月曜日が祝日の場合は翌平日)
- 特定廃棄物の埋立処分事業について紹介しています。毎週末には参加型イベントや実験教室なども開催しています。

●環境再生プラザ



- 所在地 福島県福島市栄町 1-311 階
- 開館時間 10:00～17:00
- 休館日 月曜日、年末年始(月曜日が祝日の場合は翌平日)

福島の環境再生への取り組みなどの情報を紹介しています。常駐している専門家による解説や相談などを行っています。

ふくしま環境再生 Vol.1



「ふくしま環境再生」では、環境省が進める環境再生事業や地域活性化事業などの情報を定期的にお知らせします。



みんなで咲かそう！ とみおか千枚桜

2019年4月、富岡町夜の森地区で開催された「富岡桜まつり2019」と東京の新宿御苑で開催された「八重桜ライトアップ」の会場で、多くの方から富岡町の復興へのメッセージを桜の花びらカードにいただきました。とみおか千枚桜は、想いの詰まった花びらで満開となり、5月7日から富岡町学びの森で展示されます。是非ご覧ください。



メッセージを書く子どもたち



想いが詰まった桜の花びらカード




とみおか千枚桜


富岡町夜の森地区 桜並木周辺の除染について

富岡町で避難指示が出されている帰還困難区域のうち、特定復興再生拠点として整備が進められている夜の森地区において、桜並木周辺等の除染が概ね完了しました。この桜並木は約2.5kmにもおよび、富岡町のシンボルとして人々に愛されています。「富岡桜まつり2019」ではバスによる帰還困難区域の桜並木の観覧も行われました。環境省では、桜並木周辺等を含む特定復興再生拠点区域の除染と建物解体に取り組んでいます。

<夜の森地区桜並木周辺の除染>



除染前



除染後

除染等の状況

環境省が除染を実施する除染特別地域(帰還困難区域を除く)では2017年3月末までに、市町村が除染を実施する汚染状況重点調査地域では2018年3月末までに面的除染が完了しています。現在、仮置場にある除去土壌等の中間貯蔵施設への搬出、帰還困難区域内に設けられた特定復興再生拠点区域の除染等に取り組んでいます。

汚染状況重点調査地域



除染特別地域



2017年3月に面的除染完了

面的除染完了市町村

	市町村数	除染特別地域 (11)	汚染状況重点調査地域 (93)
福島県内	43※	11	36
福島県外(7県)	57	—	57
合計	100	2017年3月に完了	2018年3月に完了

※南相馬市、田村市、川俣町、川内村は、域内に除染特別地域と汚染状況重点調査地域双方がある。

大熊町の避難指示一部解除、大熊町役場新庁舎開庁

東京電力福島第一原子力発電所の事故により大熊町内全域に出されていた避難指示のうち、居住制限区域の大川原地区、避難指示解除準備区域の中屋敷地区の避難指示が4月10日午前0時に解除されました。また、大熊町役場の新庁舎が大川原地区に完成し、4月14日に新庁舎開庁式が行われ、5月7日から本格的に業務が開始されます。新庁舎を町の復興拠点として、仮設商業施設などの整備が進められ、6月には復興公営住宅への入居が始まります。



4月14日に新庁舎開庁式が行われました




建設が進む公営復興住宅

大熊町除染検証委員会による検証結果について

大熊町除染検証委員会は、2018年11月8日以降、大川原地区と中屋敷地区における除染効果等について検証を行いました。大熊町除染検証委員会の河津賢澄委員長は、渡辺利綱大熊町長に報告書を渡し、大川原・中屋敷地区の除染効果について「総合的には生活するうえにおいて、環境放射能は十分に低減化していると判断される」との最終的な評価を伝えられました。事後モニタリングの結果から、面的な除染の効果が維持されていることが確認できます。詳しくは除染情報サイトをご覧ください。

■空間線量率1mメッシュマップ

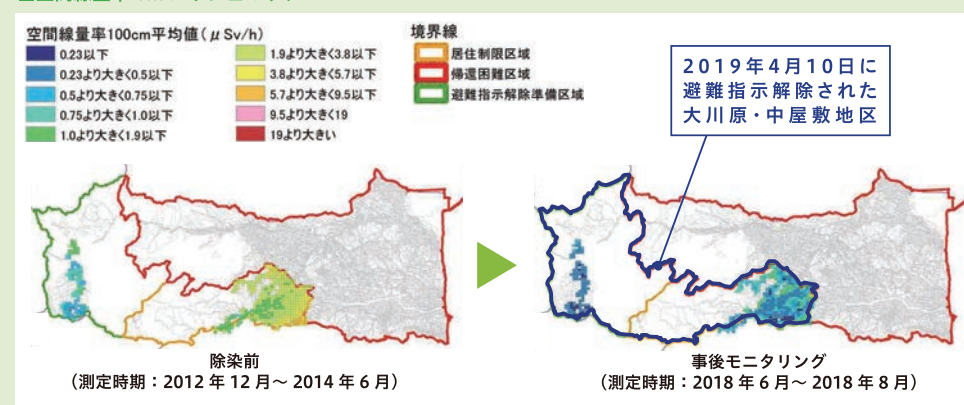

除染情報サイトでは、特定復興再生拠点の除染の状況など様々な情報をお伝えしています。是非ご覧ください。



除染情報サイト

検索

