




国直轄による対策地域内における仮設焼却施設の設置状況

概要

- 9市町村（11施設）において仮設焼却施設を設置しています。

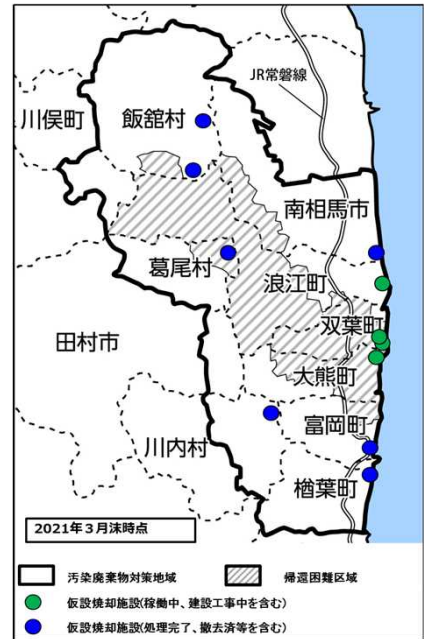

仮設焼却施設の進捗状況等

- 3月末時点で、約**127**万トン（除染廃棄物を含む）を各仮設焼却施設で処理しました。
- 各仮設焼却施設それぞれの進捗状況は下表のとおりです。

立地地区	進捗状況	処理能力	処理済量 (2021年3月末時点)
浪江町	稼働中(2015年5月より)	300t/日	約280,000トン(約184,000トン)
大熊町	稼働中(2017年12月より)	200t/日	約80,000トン(約37,000トン)
双葉町	稼働中(2020年3月より)	350t/日	約 34,000 トン(約 13,000 トン)
葛尾村	災害廃棄物等の処理完了	200t/日	約131,000トン(約37,000トン)
楢葉町		200t/日	約77,000トン(約32,000トン)
川内村		7t/日	約2,000トン(約2,000トン)
飯舘村 (小宮地区)		5t/日	約2,900トン(約2,900トン)
飯舘村 (蕨平地区)		240t/日	約257,000トン(約54,000トン)
富岡町		500t/日	約155,000トン(約55,000トン)
南相馬市		400t/日	約214,000トン(約91,000トン)
川俣町	既存の処理施設で処理 (処理完了)	—	—
田村市		—	—

※処理済量については、除染廃棄物も含み、()内はうち災害廃棄物等の処理済量です。
