

平成24年度葛尾村除染等工事

1) 除染工事の概要

工事名称:平成24年度葛尾村除染等工事

工 期:平成25年3月19日～平成26年3月28日

事業者名:奥村・西松・大豊特定建設工事共同企業体
福島葛尾総合事務所

工事数量

- ・住宅 470世帯
- ・道路 舗装面:79.6ha、未舗装面:33ha、法面:26ha
- ・農地 水田:173ha、畑:147ha、牧草地:24.6ha
- ・牧草地 灌木(密):165ha、灌木(粗):141ha
- ・森林 常緑樹:219ha、落葉樹:388ha、雑木林:41ha
- ・仮置場 2箇所(造成44ha)、フレコン71.7万袋

作業員:1,467人/日(H25.7.1現在)

最大:2,300~3,000人/日(見込み)

延べ人工:33~66万人(見込み)

2) 作業員の教育

①送り出し教育→②新規入場者教育→③特別教育→④作業指揮者教育
→⑤月例等安全教育

④作業内容に応じた教育

①～③従事前の確実な除染等業務従事者特別教育の実施

- ・新規入場教育等で本人確認ができた作業員だけに現場入場許可
- ・ゼッケン付のベストを着用し、顔写真＋QRコードで作業員を識別

④作業内容に応じた教育

- ・作業指揮者教育、刈払作業従事者教育
不整地運搬車・解体機械技能講習等
- ・教育終了後、理解度テストの実施
による習得度合を確認



刈払教育実施状況

⑤月例安全教育、日常教育の実施

- ・全作業員対象；安全センターにて順次
- ・6月度安全講話：熱中症対策、蛇・蜂対策、救急措置等

3) 施工手順遵守の仕組み

① 施工手順周知会の実施

- ・ 入場時に施工手順を周知
- ・ 品質確保のための図示仕様作成、配布



周知会実施状況

② 作業指揮者による現場での品質管理

- ・ GMサーベイによる作業品質の確認
- ・ 元請職員、職長(指揮者副)を交えたミーティングによる日々の是正

③ 習熟度の定期的確認

- ・ 3カ月ごとの再教育時に「理解度確認テスト」を実施

工事名:平成24年度 葛尾村除染工事・作業日報 奥村・西松・大豊JV
平成25年 6月14日(金)曜日 天候:晴れ

表面汚染密度管理	班名	RISE	RISE	作業時間
日線研測定点を基本とする。	着手前	1200	820 cpm	1700 cpm
	施工時	890	740 cpm	600 cpm
	完了	640	600 cpm	390 cpm

作業日報の例

4) 地元とのコミュニケーション

① 地元雇用による地域との密着施工

- ・復興組合(かつらお復興組合)との連携
- ・地元事情に精通した行政区長をJV職員として雇用

② 情報連携による地元要望の吸い上げ

- ・葛尾村商工会との連携
- ・葛尾村役場、葛尾村議会との情報交換会の定期開催
- ・地元広報誌(広報かつらお)に工事情報を掲載


③ 周辺自治体との関係強化

- ・市役所、警察、学校関係との情報交換の実施
- ・美化活動展開等による地域貢献の実践



5) その他


① 通報があった場合の対応体制

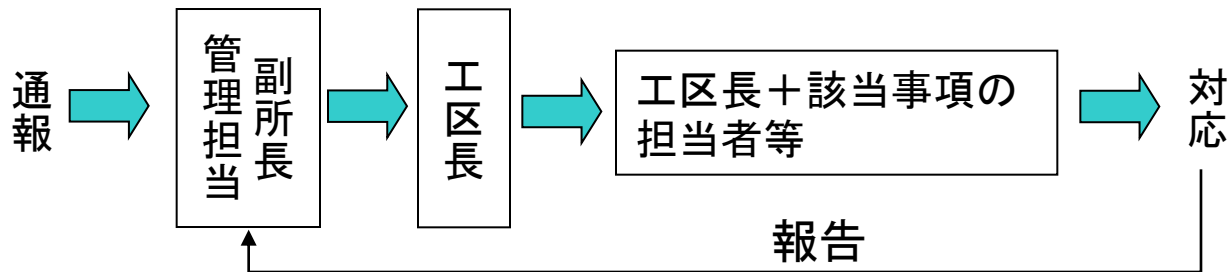

- ・現場対応案件：上記
- ・全社対応案件：上記 + 母店広報部署

② 除染作業モチベーションの向上

- ・優秀作業員の表彰

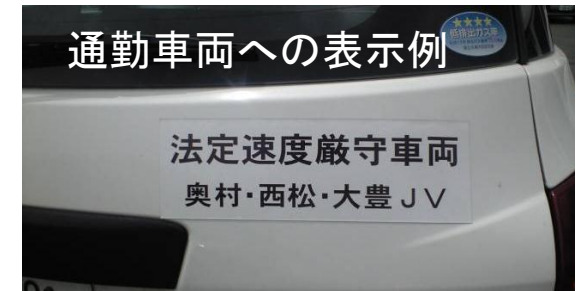

③ ステッカー等によるコンプライアンス意識の付与

- ・通勤車両への「法定速度厳守車」表示等による意識高揚
- ・JVによる道路立番、交通安全看板等の設置
