

国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

概要

- ・特定帰還居住区域の解体申請を受付中（4町）です。
- ・被災家屋等の解体関連の受付・調査を行い、順次解体を実施中です。
- ・片付けごみの処理についてステーション回収や戸別回収訪問を実施しています。




大熊町の仮設焼却施設



被災家屋等の解体の様子

対策地域内廃棄物等の仮置場への搬入済量等

- ・災害廃棄物等の仮置場への搬入については、4月末時点で、約345万トンの搬入を完了しました（うち、約59万トンが焼却処理済、約237万トンが再生利用済）。

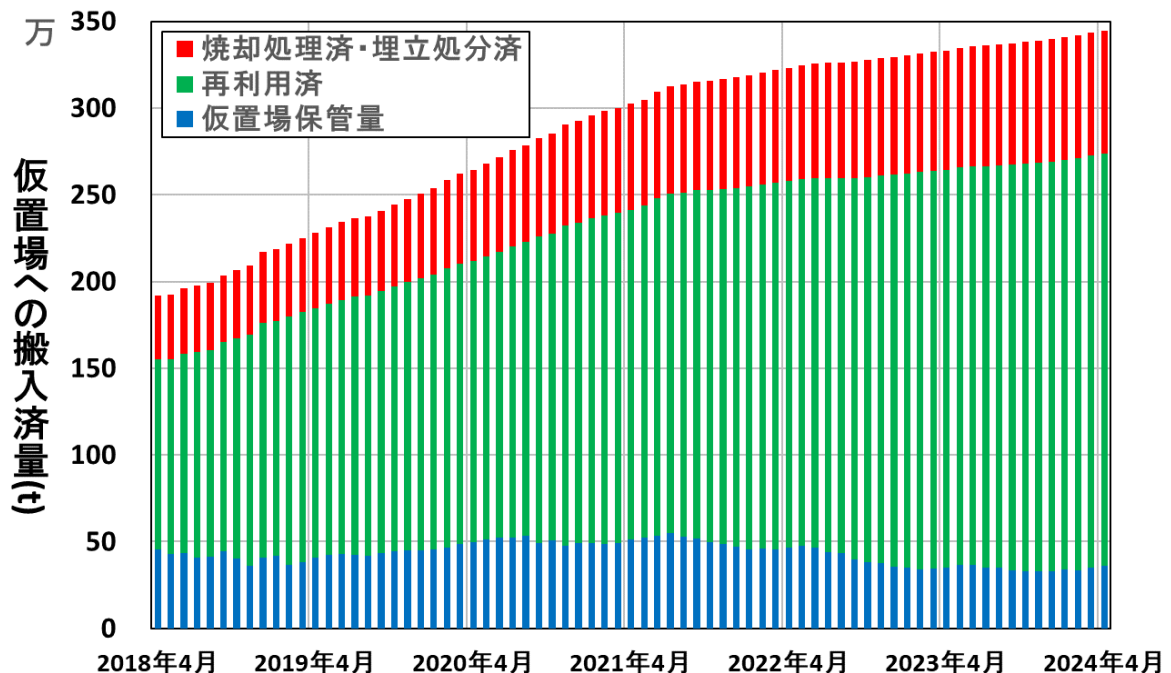

注) 仮置場へ搬入せずに処理する量も含む。

- 被災家屋について、4月末時点で、約18,800件の解体撤去申請を受付済であり、約18,000件を解体撤去済です。

市町村		解体申請 受付件数 ※	解体済件数	解体申請 受付状況
南相馬市		2,634	2,634	完了
浪江町	特定復興再生拠点区域	704	561	特定復興再生拠点区域： 受付終了 特定帰還居住区域： 受付中
	特定帰還居住区域	0	0	
双葉町	特定復興再生拠点区域	1,298	1,135	特定復興再生拠点区域： 受付終了 特定帰還居住区域： 受付中
	特定帰還居住区域	16	2	
大熊町	特定復興再生拠点区域	1,914	1,626	特定復興再生拠点区域： 受付終了 特定帰還居住区域： 受付中
	特定帰還居住区域	12	0	
富岡町	特定復興再生拠点区域	1,118	985	特定復興再生拠点区域： 受付終了 (点・線拠点を除く) 特定帰還居住区域： 受付中
	特定帰還居住区域	1	0	
檜葉町		1,557	1,557	完了
飯舘村		1,550	1,550	完了
	特定復興再生拠点区域	90	90	
川俣町		329	329	完了
葛尾村		484	484	完了
	特定復興再生拠点区域	47	47	
田村市		19	19	完了
川内村		102	102	完了
合計		18,791	18,036	
		特定復興再生拠点区域	5,171	4,444
		特定帰還居住区域	29	2

注：1) ※当初申請数から取下げ件数を除いた件数です。

2) 特定復興再生拠点区域、特定帰還居住区域の件数は総数の内数です。
