2020年（令和2年）7月7日

国直轄による対策地域内における仮設焼却施設の設置状況

概要

・９市町村（11施設）において仮設焼却施設を設置しています。

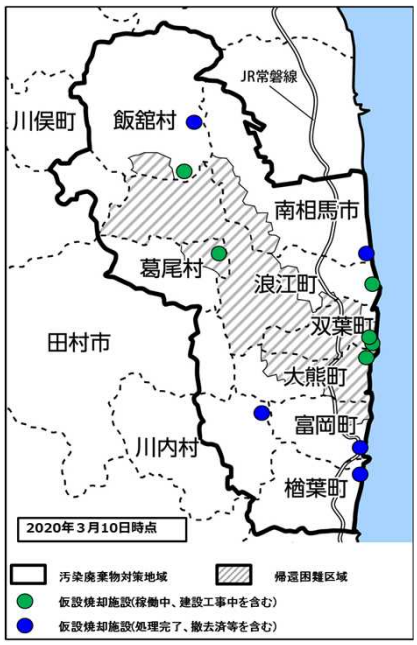

仮設焼却施設の進捗状況等

・５月末時点で、約115万トン（除染廃棄物を含む）を各仮設焼却施設で処理しました。
・各仮設焼却施設それぞれの進捗状況は下表のとおりです。

立地地区	進捗状況	処理能力	処理済量（2020年５月末時点）
葛尾村	稼働中(2015年4月より)	200t/日	約120,000トン(約36,000トン)
浪江町	稼働中(2015年5月より)	300t/日	約247,000トン(約161,000トン)
飯舘村（蕨平地区）	稼働中(2016年1月より)	240t/日	約222,000トン(約48,000トン)
大熊町	稼働中(2017年12月より)	200t/日	約60,000トン(約27,000トン)
双葉町	稼働中（2020年３月より）	350t/日	約11,000トン(約4,300トン)
楢葉町	災害廃棄物等の処理完了	200t/日	約77,000トン(約32,000トン)
川内村		7t/日	約2,000トン(約2,000トン)
飯舘村（小宮地区）		5t/日	約2,900トン(約2,900トン)
富岡町		500t/日	約155,000トン(約55,000トン)
南相馬市		400t/日	約214,000トン(約91,000トン)
川俣町	既存の処理施設で処理（処理完了）	―	―
田村市		―	―

※処理済量については、除染廃棄物も含み、()内はうち災害廃棄物等の処理済量です。
