

# 除染適正化に関する報告

2013年7月8日

大成建設株式会社

# ① 事業の概要

- 工事名** : 平成24年度川俣町除染等工事
- 対象区域** : 川俣町山木屋地区
- 工期** : 平成24年3月12日～平成25年3月28日
- 施工者** : 大成・鉄建・西武特定建設工事共同企業体
- 作業員数** : 予想最大 1,400人/日 延べ人工260,000人
- 数量** : 住宅等 3,052千m<sup>2</sup> 農地等 2,996千m<sup>2</sup>  
森林等 1,886千m<sup>2</sup> 法面 507千m<sup>2</sup>  
道路 755千m<sup>2</sup> 仮置場 1式
- 

## ② 作業員の教育

- 1) 事業者による除染電離則・ガイドラインに沿った特別教育
- 2) 事業者による送り出し教育
- 3) 新規入場者教育（作業所ルール等の説明と周知）
- 4) 適切な除染作業についての教育  
（DVD等による映像を利用した視覚的に判りやすい教育）
- 5) 日々の現地での教育・KY活動（作業の説明、手順の確認）



DVDによる教育



現地での教育

### ③ 施工手順の順守の仕組み

- 1) 当社職員が作成した施工要領書に基づく、作業手順書の作成
- 2) 作業指揮者に対する教育の実施
- 3) 判りやすい図面、写真、イラストを用いた作業手順等の説明
- 4) 作業中、担当者が、チェックリスト等で作業手順を確認する。  
打ち合わせた作業手順と異なっていた場合、正しい手順を  
その場で、速やかに指導をする。
- 5) 生じた不具合については、その日の終了時打ち合わせで、  
水平展開し、今後同様なことが起こらないようにする。



作業指揮者教育状況



作業員への周知状況



## ④ 地元とのコミュニケーション

- ・ 関係者への的確な情報提供
  - ・ 郵送による事前連絡（対象地で除染を進めることのお知らせ）
  - ・ 電話による着手前連絡
    - 除染作業予定日の通知、同意書に基づいた作業内容の確認、立会希望等の要望の確認
  - ・ 除染作業中
    - 立会希望の地権者による除染作業状況及び要望の確認
  - ・ 除染完了後：地権者への除染結果報告
- ・ 行政区長と緊密な連携
- ・ 山木屋在住者への除染作業参加希望者の採用
- ・ 地元優先の交通誘導（交通誘導員指導）
- ・ 地元警察から委嘱を受けている青色灯装備防犯パトロール活動の実施

地域の皆様  
の気持ちで  
除染します。



## ⑤ 適正除染実施のための取組


### 1) 様々な視点による除染現場の確認

- ・ 地区所長（山木屋地区を4地区に分割）による現場巡視と監理技術者・現場代理人によるパトロールの実施
- ・ 施工と独立した品質管理チームによる適切な除染実施の確認
- ・ 当社支店、総合事務所による定期的な品質・安全パトロール

### 2) 事業者への適正除染に対する取り組みの指導

- ・ 事業者自身による定期的なパトロールの実施
- ・ 環境省競争参加資格（全省庁統一資格）の認定取得の指導

適正除染実施のための施工体制

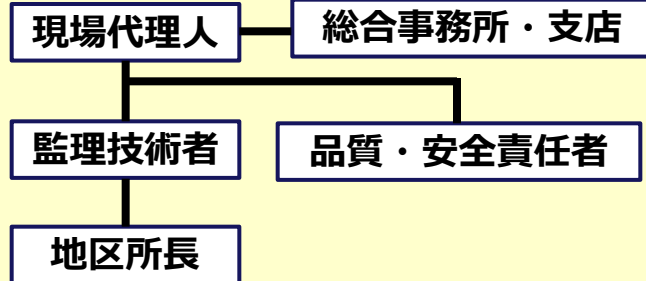

万が一の事態を、適切に対応するための連絡体制

